

COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Se presenta la metodología para elaborar presupuestos de obra mediante precios unitarios con el estudio detallado de los insumos que conforman el costo directo, los costos indirectos el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Se hace una breve introducción al ajuste de costos.

2021

Contenido

Prologo	3
Capítulo 1	4
Introducción al análisis de precios unitarios.....	4
1.1 Aspectos generales sobre precios unitarios.....	4
1.2 Elementos que integran el precio unitario.....	6
Capítulo 2	8
Materiales	8
2.1 Generalidades	8
2.2 Costo de adquisición	8
2.3 Abundancia y escasez.....	9
2.4 Fluctuaciones.....	9
2.5 Transporte, carga y descarga de materiales	10
2.6 Derechos y regalías	11
2.7 Almacenamiento	11
2.8 Seguros	12
2.9 El impuesto al valor agregado en los materiales.....	12
2.10 Mercadeo	13
2.11 Consumo	13
2.12 Costo directo por concepto de materiales.....	13
2.13 Ejemplos	14
Capítulo 3	20
Mano de obra.....	20
3.1 Generalidades	20
3.2 Oficios en la construcción	20
3.3 El concepto de cuadrilla	23
3.4 El costo directo por mano de obra.....	24
3.4.1 Primer mando.....	25
3.4.2 Salario.....	25
3.4.3 Factor de salario real.....	30
3.4.4 Cálculo del salario real y tabulador de salarios.....	45
3.4.5 Jornada de trabajo	45
3.4.6 Rendimiento de la mano de obra.....	49

3.4.7 El IVA en los costos de mano de obra	50
3.5 Ejemplos	52
Capítulo 4	55
Maquinaria	55
4.1 Generalidades	55
4.2 Clasificación de la maquinaria	55
4.3 Costo horario.....	57
4.3.1 Costos fijos	58
4.3.2 Costos por consumos	66
4.3.3 Costos por operación	73
4.3.4 Cargo por transporte.....	74
<i>Tabla 4.7 Resumen de costos horarios calculados.</i>	91
4.3.5 El I.V.A. en los costos de la maquinaria.....	91
4.4 El costo directo por maquinaria	91
4.5 Rendimientos de los equipos de construcción	93
Capítulo 5	97
Costos indirectos	97
5.1 Generalidades	97
5.2 Administración central	97
5.3 Administración de obra	101
5.4 Costo de financiamiento	104
5.4.1 Cálculo del costo de financiamiento	105
5.5 Utilidad	110
5.6 Cargos adicionales.....	111
5.7 Sugerencia para el cálculo del costo directo.....	113
5.8 Ejemplos	114
5.9 Elaboración de presupuestos	131
5.10 Introducción al ajuste de costos	133
5.11 Ejemplo.....	136
Comentario final.....	137
Bibliografía	138

Prologo

Los presentes apuntes, cubren uno de los temas básicos en las asignaturas del área de construcción del plan de estudios de la carrera de ingeniería civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM: la presupuestación de obras.

El procedimiento de presupuestación que se presenta es con base en el sistema de precios unitarios; se describe con detalle cada uno de los elementos o factores que lo integran: costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento, utilidad y, en su caso, cargos adicionales.

Se han tomado como base los lineamientos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la propia Ley para la integración de los elementos que conforman los costos, esto es, entre otros, el cálculo del factor de salario real, los cargos por herramienta y equipo de seguridad, la integración de los costos horarios del equipo de construcción, los criterios para el cálculo del costo directo por concepto de materiales, los costos correspondientes a la administración central y de campo, los criterios para el cálculo del costo de financiamiento, la determinación de la utilidad y el tratamiento de los cargos adicionales.

En los ejemplos que se incluyen, se han considerado costos de mercado en la fecha que se prepararon estos apuntes, sin embargo, dada la variación permanente en el costo de los insumos, es preferible que el lector se enfoque en el estudio de la metodología para la presupuestación de obras y lleve a cabo las cotizaciones pertinentes cuando tenga la necesidad de calcular el importe esperado de una obra en particular.

Con respecto a la versión presentada en noviembre del 2020, en esta versión 2021 únicamente se han actualizado los costos correspondientes a la mano de obra, dado que los salarios mínimos cambiaron. Los costos de los materiales y la maquinaria se han dejado sin cambios puesto que no se consideran relevantes las variaciones que se hubieren presentado en estos insumos de noviembre del año pasado a la fecha.

Se agradecen de antemano las sugerencias y comentarios sobre estos apuntes, para la mejora de futuras ediciones. Favor de dirigirlos a erene@unam.mx

Atentamente

Ing. Ernesto René Mendoza Sánchez
Enero de 2021.

Capítulo 1

Introducción al análisis de precios unitarios

1.1 Aspectos generales sobre precios unitarios

La determinación del costo aproximado de construcción de una obra es un dato que regularmente se requiere previamente a la ejecución de esta.

La determinación del costo de las obras antes de que se construyan, constituye lo que se denomina *Presupuesto*. Los procedimientos o métodos para estimarlo son múltiples; sin embargo, uno de los más utilizados es con base en el cálculo de los precios unitarios de todos y cada uno de los trabajos por ejecutar, llamados para el efecto “*conceptos de obra*”, en que convencionalmente se ha dividido la obra por ejecutar.

Se puede observar que la palabra *presupuesto*, está formada por el prefijo *pre*, que significa antes de, y la palabra *supuesto* que involucra una suposición o hipótesis. Por esto, no es raro encontrar obras terminadas en las cuales el costo real se ha alejado enormemente del presupuestado al no cumplirse los considerandos iniciales. Esto indica la importancia que tiene el estudiar con mucho cuidado las variables que inciden en los cálculos relativos a un presupuesto, entre otros: contar con un proyecto ejecutivo de buena calidad, llevar a cabo la cuantificación cuidadosa de los volúmenes de obra, estudiar a fondo el entorno donde se construirá la obra y, posteriormente, durante la ejecución de los trabajos, pugnar porque se cumplan las condiciones supuestas en la etapa de presupuestación.

El estudio de los precios unitarios involucra tres etapas consecutivas: Análisis, cálculo e integración. La primera etapa: el análisis, es la más importante. En ella es necesario definir con claridad, entre otros aspectos, el alcance de los trabajos a realizar, la manera en que se llevarán a cabo estos trabajos, es decir el procedimiento constructivo, la cantidad y tipo de los recursos o insumos: mano de obra, materiales y maquinaria que se van a requerir, las condiciones contractuales, etc., todo ello sin perder de vista el tipo, magnitud y complejidad de la obra.

La segunda etapa: el cálculo de los precios unitarios, definida la información que se requiere, es una operación mecanizada y repetitiva que en la actualidad se lleva a cabo con el apoyo de las computadoras por lo cual se puede llevar a cabo de manera rápida y confiable.

Finalmente, la manera en que se integrarán los elementos que conforman los precios unitarios y el propio presupuesto, dependerá básicamente de los lineamientos normativos que se sigan para tal efecto, o de los requerimientos que el cliente exija del constructor sobre la manera en que deberán ser presentados.

Es obvio que un concepto de obra puede ejecutarse siguiendo dos o más procedimientos constructivos distintos, que a su vez involucran diferentes tipos y cantidad de insumos; en estos casos, el procedimiento más económico o rápido de realizar, según el objetivo deseado, será el adecuado, esto nos lleva a incrementar el análisis del mayor número de alternativas, para determinar qué métodos y qué recursos conviene emplear.

Afortunadamente, como ya se mencionó, se han desarrollado programas de cómputo que permiten reducir sustancialmente el tiempo destinado a los cálculos numéricos y, por tanto, disponer de mayor oportunidad para el estudio cuidadoso de los resultados obtenidos.

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, no es el único factor que incide en el cómputo de un buen presupuesto. Otros factores, igualmente importantes, son la descripción clara y adecuada organización de los conceptos de obra, y su cuantificación.

Dependiendo del tipo, magnitud y complejidad de la obra, puede ser que un presupuesto esté integrado por una cantidad considerable de conceptos, tal es el caso, por ejemplo, de un hospital. De ser así, es conveniente clasificar y agrupar los conceptos en diferentes “partidas presupuestales”, las cuales a su vez estarán desglosadas en las “subpartidas” que sean necesarias para facilitar los cálculos y la revisión del presupuesto, mediante parámetros conocidos previamente

Al aplicar los precios unitarios a las cantidades determinadas para todos y cada uno de los conceptos de obra definidos se obtiene el importe de dichos conceptos.

La suma de los importes de todos los conceptos dará el importe del presupuesto de la obra que se está analizando.

La Tabla 1.1 muestra la forma típica de un presupuesto por precios unitarios.

Tabla 1.1 Forma típica de un presupuesto por precios unitarios.

Clave	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
PARTIDA I: Preliminares					
001	I.1.-	m	10.00	\$300.00	\$ 3,000.00
002	I.2.-	m ²	100.50	\$130.00	13,065.00
008	I.8.-	m ³	50.00	\$1,640.00	82,000.00
009	I.9.-	ton	23.85	\$9,000.00	214,650.00
SUBTOTAL Preliminares					\$750,123.00
PARTIDA II: Cimentación					
010	II.1.-	pieza	32.00	\$250.00	8,000.00
016	II.6.-	m ³	15.00	\$320.00	4,800.00
017	II.7.-	m ³ -km	15,000.00	\$6.50	97,500
SUBTOTAL Cimentación					\$976,545.00
PARTIDA XX: Acabados					
095	XX.1.-	Jgo.	64.00	\$100.00	6,400.00
096	XX.2.-	P.T.	121.20	\$14.50	1,757.40
097	XX.3.-	kg	789.50	\$20.00	15,790.00
100	XX.6.-	Salida	30.00	\$250.00	7,500.00
SUBTOTAL Acabados					\$508,453.75
TOTAL					\$14,075,210.55

Dentro del ramo de la construcción, el establecimiento de los precios unitarios equitativos a que debe pagarse un trabajo ha sido tradicionalmente un punto de interés entre las empresas contratistas y los órganos oficiales o particulares encargados de la realización de obras, lo que ha constituido motivo de adecuaciones frecuentes en la estructura del precio unitario.

Cuando con anticipación se establecen claramente las normas, especificaciones y criterios generales que servirán de base para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los puntos de divergencia pueden reducirse al mínimo.

La elaboración de los precios unitarios no es más que una etapa dentro del proceso para la realización de un proyecto, que se inicia con la investigación o estudio de la factibilidad para realizar una obra, y termina con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de esta.

No es posible calcular precios unitarios sin el apoyo de las especificaciones, ya que éstas son precisamente las que definen los trabajos que se requieren y la manera en que deben ejecutarse para alcanzar los estándares de calidad estipulados.

Previo al análisis de los precios unitarios, es absolutamente indispensable, conocer a fondo la naturaleza y disponibilidad de los recursos, tanto humanos, como de maquinaria y materiales, así como los procedimientos constructivos a seguir en cada caso.

1.2 Elementos que integran el precio unitario

Antes de exponer los elementos que integran un precio unitario, es conveniente conocer las siguientes definiciones:

Precio unitario:

De acuerdo con el artículo 154 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para los efectos de dicha Ley y su Reglamento, se considerará como precio unitario: *“el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad”*.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Unidad de obra:

Es la unidad de medición señalada en el catálogo de conceptos, para cuantificar el concepto de trabajo con fines de medición y pago.

Concepto de trabajo:

Es la descripción detallada del trabajo por realizar, incluye el conjunto de operaciones manuales y mecánicas que el contratista deberá realizar durante la ejecución de cada una de las partes que conforman la obra, de acuerdo con planos y especificaciones, divididas convencionalmente para fines de medición y pago, incluyendo el suministro de los materiales correspondientes cuando éstos sean necesarios.

Normas y especificaciones:

Son el conjunto de requerimientos exigidos en los proyectos y presupuesto para definir con precisión y claridad el alcance de los conceptos de trabajo. Las especificaciones de un concepto particular deben contener la descripción del concepto, materiales que intervienen y su calidad, alcance de la ejecución del concepto, mediciones para fines de pago, cargos que incluyen los precios unitarios y los controles que deben realizarse para garantizar una calidad adecuada de la obra.

Los elementos que componen un precio unitario son: costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento, utilidad y cargos adicionales. La estructura completa se muestra en la figura 1.

Observamos en la figura que los costos directos de un concepto de trabajo son todas aquellas erogaciones efectuadas exclusiva y directamente para realizar dicho concepto de trabajo, esto es: materiales, mano de obra y maquinaria.

Todos aquellos gastos generales necesarios para la construcción del proyecto, que no han sido considerados dentro de los costos directos, se clasifican como costos indirectos.

Adicionalmente, dependiendo de la relación egresos–ingresos que el contratista tenga durante la ejecución de la obra, podrá generarse un costo de financiamiento. La suma de los tres componentes integra el costo unitario de un concepto.

La utilidad que considera toda empresa constructora, como resultado a sus esfuerzos técnicos, administrativos y económicos, para cumplir con la realización de un proyecto, de acuerdo con el artículo 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

La suma del costo unitario más la utilidad es lo que se conoce como precio unitario de un concepto de obra.

Cuando se trata de obras públicas se establecen cargos adicionales a los descritos, estos deberán formar parte del precio unitario, se describirá con detalle más adelante.

La Figura 1.1 muestra los componentes del precio unitario. En los capítulos que siguen, se analiza cada uno de los elementos que conforman el precio unitario.

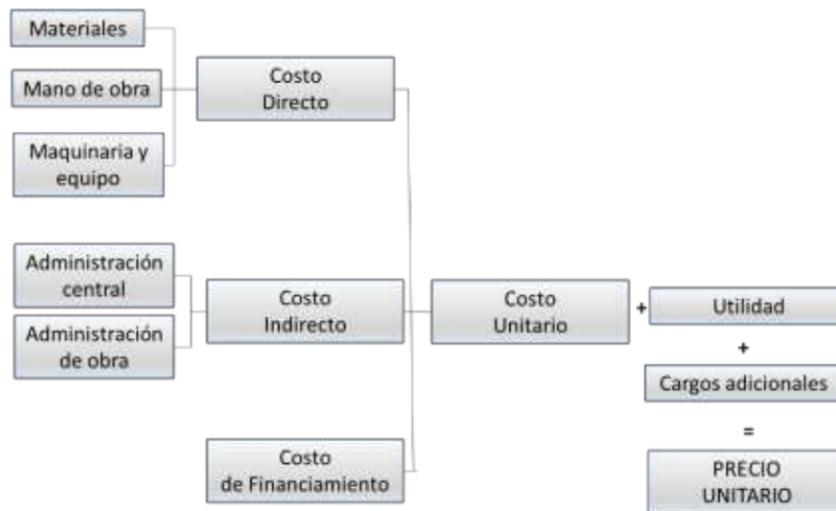


Figura 1.1. Componentes del precio unitario.

Capítulo 2

Materiales

2.1 Generalidades

Los materiales de construcción son el elemento tangible que compone las obras. La tecnología ha permitido que hoy en día se cuente con materiales cuyas características estéticas, de resistencia y durabilidad, exceden con mucho a los naturales primitivos con que el hombre construyó sus primeras obras.

Aunque la tarea de definir el tipo, especificaciones y calidad de los materiales a emplearse en una obra recae sobre los profesionales encargados del diseño, siempre será requisito indispensable para el ingeniero dedicado a la construcción, conocer ampliamente los materiales en todos sus aspectos. Este conocimiento, le será de enorme utilidad para seleccionar o elaborar los materiales especificados, adecuados a las condiciones de trabajo, con la mayor economía.

Existe en el mercado una gran variedad de materiales de diferente calidad y precio. Frecuentemente aparecen en el mercado nuevos materiales. El diseñador de obras civiles debe estar actualizado en esta área para poder recomendar en su caso la utilización de estos si con ello logra mayor eficiencia, esto es, un mejor balance entre calidad y precio.

El costo de las obras de edificación está constituido en un alto porcentaje por los materiales, puede fácilmente rebasar el 70 por ciento.

Por otra parte, es importante conocer los procedimientos adecuados para la utilización de los materiales: no basta que el material utilizado sea de excelente calidad, es necesario que la mano de obra y el equipo que se utilicen también lo sean, por ejemplo, un concreto perfectamente elaborado, pero mal colocado, dará como resultado un deficiente trabajo.

Se revisan a continuación, algunos aspectos relacionados con el costo de los materiales.

2.2 Costo de adquisición

El costo del material que se toma como base para integrar el costo directo de un concepto, es el “costo del material puesto en obra”, el cual está integrado por el precio de adquisición en fábrica o lugar de compra (lugar de origen), más el costo del transporte incluyendo carga y descarga (flete), más las mermas, en su caso, así como la transportación y maniobras horizontales y verticales hasta su utilización.

La diversidad en los precios de adquisición de un mismo tipo de material se debe a diferentes factores entre los que se pueden mencionar:

- a) La calidad, por ejemplo: loseta cerámica con distintas calidades, debido a su diferente composición, proceso de fabricación y acabado.
- b) Lejanía del consumidor con respecto a la fuente de origen del material: Puede resultar elevado el costo del flete si la fuente de abastecimiento es lejana. En estas condiciones, conviene analizar la alternativa de fabricarlo en obra.

- c) Volumen de compras: A mayores volúmenes de compra se obtiene mejores precios y condiciones de pago.
- d) Condiciones de pago: Al pagar de contado se obtienen descuentos importantes, mientras que comprar a crédito significa perder los descuentos y pagar un sobreprecio por el financiamiento otorgado.

De lo anterior, se deduce la necesidad de estar al tanto de los precios de adquisición de los distintos materiales, de los diversos fabricantes y de los nuevos productos que aparecen continuamente en el mercado, con el fin de aprovechar al máximo las mejores condiciones en cada momento, adquiriendo el material más adecuado y económico dentro de la calidad especificada, realizando además dicha adquisición en el momento oportuno, lo cual se resume en: qué, cómo y cuándo comprar. Estas preguntas se contestan mediante una adecuada planeación y programación de la obra.

En algunos casos, el diseño especifica alguna marca específica para cierto material y establece que se podrá utilizar algún material similar en calidad y precio. Lo mismo ocurre para equipos de instalación permanente. Se podrá entonces sustituir el material especificado siempre y cuando se cumpla con las condiciones de calidad estipuladas.

2.3 Abundancia y escasez

La abundancia y escasez de los materiales dependen directamente de las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado.

Un material puede ser escaso porque la demanda sea muy elevada u ocasional (no conviene en general emplear materiales raros, descontinuados o de fabricación artesanal).

Un material puede ser muy abundante o escaso en un determinado lugar, dependiendo de la abundancia o escasez de la materia prima que lo componga (de aquí la conveniencia de utilizar en el proyecto materiales de la localidad).

La abundancia o escasez de materiales básicos en la localidad es determinante para la selección de procedimientos y tipos de construcción, por ejemplo: la selección del tipo de cortina en una presa (de concreto o de materiales graduados), con base en los materiales disponibles en las cercanías, sin detrimento de considerar factores como los geológicos, topográficos, resistencia, permeabilidad, sísmicos, etc.

En periodos inflacionarios, los materiales de construcción suelen escasear previamente al registro de un alza en su costo de adquisición, lo cual, desde luego, constituye una práctica dolosa de los fabricantes y distribuidores.

2.4 Fluctuaciones

Existen en el mercado fluctuaciones, tanto del precio de adquisición, como en la disponibilidad misma de un material.

El precio fluctúa generalmente con las variaciones de la oferta y la demanda, ocasionadas por diversas causas: condiciones climáticas, problemas laborales que afectan a la producción, escasez periódica de la

materia prima, inicio y desarrollo de una obra muy grande que demande altos consumos del material, entre otras.

Podemos citar como ejemplo de lo anterior, los siguientes casos:

- a) Debido a la época de lluvias, el mercado del tabique recocido presenta la siguiente secuencia: por dificultades de secado de la materia prima se alarga el proceso productivo y se incrementa al costo unitario de producción. Simultáneamente, al disminuir la oferta de tabique en el mercado, mientras continúa la demanda por parte de los consumidores, se incrementa el precio de adquisición, tanto por el incremento en el costo de producción, como por el desequilibrio entre la oferta y la demanda.
- b) Debido a un incremento inusual en el volumen de construcciones en un período determinado, se produce un aumento en el consumo de cemento, lo que origina un incremento en la demanda y en el precio de adquisición.

Es importante conocer el estado en que se encuentran materiales de uso frecuente como por ejemplo el acero. El cuadro 1, transcribe una nota relativa a la producción de acero publicada por Bardhal industria. Fuente: <https://www.bardhalindustria.com/la-produccion-de-acero-en-mexico-estimacion-2020/>.

<p>La producción de acero en México: estimación 2020 La producción mundial de acero alcanzó mil 869 millones de toneladas durante 2019, lo que significó un incremento de 3.4 %, respecto a 2018, lo que catapultó a México como el décimo quinto productor a nivel mundial, de acuerdo con la World Steel Association.</p> <p>La importancia de la producción de acero en México En términos económicos, la industria del acero representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), el 6.9% del PIB industrial y el 12.9% del PIB manufacturero del país. De ahí la importancia de que no exista una disminución en la producción de este metal, ya que, indudablemente afecta el crecimiento económico del país, al existir una contracción del PIB nacional.</p> <p>México es en la actualidad, el país número 15 en el mundo en producción de acero, al generar 19.9 millones de toneladas de acero crudo al año</p> <p>La situación actual del acero en México En México, esta actividad económica reportó un total de 18.6 millones de toneladas en 2019, lo que significó una baja de 8%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Según estimaciones, la producción de esta aleación tendrá un repunte en 2020 de un 1.7%.</p> <p>Nuevo León, destaca entre los demás estados, por ser la tercera localidad con mayor producción de acero en México, al ser sede de los corporativos productores de acero en el país como Ternium, Deacero, ArcelorMittal, Villacero, entre otros.</p> <p>La esperanza del acero mexicano Steel Dynamics, realizó una proyección de la producción de acero en México y los resultados indican que esta industria tendrá un repunte en 2020, ya que nuestro país será un catalizador importante al estimular el consumo de acero Norteamérica, por los nuevos requerimientos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el crecimiento de la industria manufacturera, principalmente la automotriz.</p>
--

Cuadro 2.1.- La producción de acero en México: estimación 2020.

2.5 Transporte, carga y descarga de materiales

El costo de las operaciones de carga, descarga y transportación denominado “flete”, depende primordialmente de la distancia de la fuente productora a la fuente de consumo del material, y de los procedimientos que se sigan para la carga y descarga del mismo.

Este costo debe integrarse al precio de adquisición para obtener el costo del material puesto en obra.

El costo del flete puede estar incluido dentro del precio de venta del fabricante o distribuidor cuando éste es “precio del material puesto en obra”, o puede ser cargado al consumidor por separado mediante ciertas tarifas basadas en volumen, peso o número de piezas por kilómetro, o bien, por “flete cerrado”, como es

el caso de materiales de naturaleza delicada o de difícil transportación, tales como elementos de concreto presforzado, transformadores, y otros.

Para definir el costo de los materiales puestos a pie de obra, se deben tomar en consideración los diferentes movimientos a que pueden estar sujetos:

- Transportación externa, de la fuente de producción al sitio de la obra. El suministro de materiales a la obra puede hacerse por medio de ferrocarril, barco, camiones, etc. y;
- Transportación interna o local, comúnmente llamada “acarreos”, que pueden ser horizontales o verticales. Los acarreos horizontales pueden llevarse a cabo con vagonetas, bandas transportadoras, vogues, carretillas, camiones, camionetas y, las maniobras verticales, con malacates, grúas, torres elevadoras, bandas transportadoras, bachas y cangilones.

Debe tenerse en cuenta para efectos de determinar el costo del material puesto en obra, que posteriormente formará parte del precio unitario, el efecto que pueden tener las mermas en todas las etapas de transportación.

Las mermas se expresan como un porcentaje del costo del material, se determinan por experiencias anteriores o análisis directo de las condiciones particulares de transportación, y dependen fundamentalmente del tipo de material, del tipo de transporte y de las condiciones en que deban realizarse las operaciones de carga, descarga y transportación propiamente dichas.

Este costo es adicional al desperdicio de material que se tenga durante su utilización.

2.6 Derechos y regalías

Ocasionalmente, el costo de un material puede verse afectado por el pago de ciertos derechos y regalías, como pueden ser derechos de importación, derechos de paso y regalías de explotación.

Así, por ejemplo, habrá que pagar los derechos de importación correspondientes por la utilización de materiales traídos del extranjero, como es el caso de mármol de importación, vidrios y acrílicos especiales o de grandes dimensiones, cierto tipo de aceros, etc.

En caso de querer explotar y extraer material pétreo localizado en un banco de propiedad privada, habrá que pagar “regalías de explotación” y, en su caso derecho de paso al propietario o propietarios de los predios afectados.

El monto de los derechos y regalías está regido por la legislación vigente, con base en los acuerdos específicos que se celebren entre las partes.

2.7 Almacenamiento

El costo que origina el almacenamiento de los materiales debe aplicarse al rubro de indirectos y, dentro de ellos, específicamente a la “administración de obra”, y no ser aplicado al costo del material, ya que el costo de almacenes o bodegas, tanto en el caso que alberguen varios materiales o solamente uno, tendría que prorratearse entre todos éstos, o afectar a todos los conceptos en que el o los materiales fuesen utilizados, lo cual además de laborioso, sería impráctico e inexacto.

Sin embargo, cabe mencionar, que puede darse el caso en que, por circunstancias especiales, sea conveniente considerar el costo del almacenamiento incluido dentro del costo directo del material.

Ejemplo de lo anterior es el almacenamiento transitorio e intermedio entre dos etapas de transportación en ferrocarril, o por vía marítima, en que el material debe ser almacenado en patios o bodegas mientras es transportado en camión al sitio de la obra.

Otro ejemplo es el de una fosa o tanque para almacenamiento de asfalto, cuyo costo debe afectar al costo directo del asfalto.

No debemos olvidar que hay ciertos materiales que, para su correcta conservación y utilización requieren condiciones especiales de almacenamiento. Ejemplos típicos de estos materiales son el cemento y los explosivos, estos últimos sujetos a regulaciones extremas de seguridad.

2.8 Seguros

Los materiales que se emplean en obra están sujetos a distintos riesgos desde su transportación hasta su utilización. Dependiendo del monto de la inversión y del tipo de material que se trate, puede tomarse la decisión de cubrir el riesgo, lo cual se traduce en un sobre costo equivalente al pago de la prima para asegurar el material cuyo monto dependerá de la cobertura deseada

Uno de los ejemplos más comunes de este tipo de seguros lo constituye el seguro de transportación, que cubre cualquier percance al material durante esta etapa o el robo de este. En caso de que suceda un siniestro y el material no esté cubierto por un seguro, el costo de reposición afectará la utilidad considerada por el constructor.

2.9 El impuesto al valor agregado en los materiales

En la integración del costo directo por concepto de materiales no se incluyen los importes acumulados por pago del Impuesto al Valor Agregado, IVA en las diferentes etapas de dicha integración, (adquisición, fletes, manejos, almacenamientos, etc.).

Los importes de IVA pagados por el constructor a sus prestadores de servicios se manejan contablemente en cuentas especiales que registran: IVA pagado (por acreditar), IVA trasladado al cliente (adicional al precio unitario, pero no integrado a él), e IVA enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Artículo 32 de la Ley del IVA).

Cabe precisar que la construcción tiene dos tipos de tasa:

- a) Tasa gravada para cualquier tipo de construcción,
- b) Tasa exenta únicamente para las obras de vivienda.

Por tanto, en cualquier obra pública que no sea habitacional, ninguno de los integrantes del costo deberá reflejar el actual 16% de I.V.A., no así en el caso de vivienda, donde el I.V.A. tendrá que ser aplicado a materiales y maquinaria.

En el proceso de construcción de vivienda, el I.V.A. debe ser reflejado en la urbanización y no así en la vivienda, por tanto, el I.V.A. de la maquinaria será reflejado en función de los montos de obra gravada y obra exenta que ejecute la empresa constructora.

Finalmente, la tasa cero, no es aplicable a la industria de la construcción.

2.10 Mercadeo

Es conveniente llevar a cabo la investigación del costo de los materiales por utilizar en la obra, operación denominada “cotización” o “mercadeo”, cuando menos con tres proveedores.

Esta actividad, debe ser hecha por una persona con experiencia, ya que la gran cantidad de tipos y calidades de materiales en el mercado puede ocasionar confusión y errores en la adquisición de los insumos.

También, es recomendable agrupar previamente los materiales por especialidad del proveedor para facilitar la cotización ya sea personalmente, por teléfono, por fax o por correo electrónico.

Existen varias maneras de clasificar los materiales, pero para efectos de cotización, lo más recomendable es hacerlo por especialidad: material eléctrico, para instalaciones hidrosanitarias, maderas, aglomerantes, aluminio, pinturas y barnices, etc.

En la actualidad, existe gran cantidad de información con respecto al costo de los materiales: catálogos impresos, discos compactos o memorias USB proporcionados por los propios proveedores, a través de empresas especializadas en costos y, desde luego, la red por internet.

En la preparación de presupuestos, no siempre se dispone del tiempo suficiente para hacer un mercadeo de todos los materiales requeridos, se recomienda utilizar entonces el “principio de Pareto” que establece que el 80% del costo estará representado por el 20% de los materiales. El 80% restante representará tan solo el 20% del costo.

2.11 Consumo

Tan importante como la determinación del costo de los materiales, es el cálculo de la cantidad que se requiere de cada uno de ellos en los diferentes conceptos que integran el presupuesto de una obra. Esta cuantificación, deberá hacerse con base en los alcances que establece el concepto de obra, las especificaciones de construcción y en el procedimiento constructivo.

Para determinar los rendimientos de ciertos productos, se puede recurrir a la información proporcionada por el fabricante o a la experiencia en el uso del material, sin olvidar los desperdicios propios de su utilización.

2.12 Costo directo por concepto de materiales

Conocido el precio de adquisición del material y su consumo correspondiente dentro del concepto de obra que se analiza, el costo directo por concepto de materiales se calcula conforme la siguiente expresión

(Ver artículo 193 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, RLOPSRM):

$$M = P_m \times C_m$$

En la cual:

- M, Representa el costo directo por concepto de materiales.
- P_m, Representa el precio de mercado más económico por unidad del material que se trate, puesto en el sitio de su utilización. El costo del material se integrará sumando, a los precios de adquisición en el mercado, los acarreos, maniobras y mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del cargo unitario será motivo del análisis respectivo.
- C_m, Representa el consumo de materiales por unidad de concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, C_m se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas y especificaciones de construcción aplicables, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine. Cuando se trata de materiales temporales, C_m se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de obra, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de obra, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia.

Ejemplo de lo anterior es el caso de la cimbra para las estructuras de concreto ya que ésta puede tener varios usos, dependiendo del tipo de cimbra, por ejemplo, la cimbra aparente de triplay puede tener de 3 a 4 usos, mientras que una cimbra común de pino de 3^a, de 6 a 8 usos, o en el caso de uso de cimbra metálica para elementos prefabricados se puede considerar hasta 200 usos. También son materiales temporales los elementos de señalamiento en una obra como pueden ser trafitambos, “caramelos”, conos, etc., así como materiales que se usan para la delimitación de espacios en la obra, denominados tapiales. En todos estos casos el número de veces que se usa el material corresponde a la vida útil del mismo.

2.13 Ejemplos

2.13.1 Concepto: *Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, incluye alambre recocido para amarres, traslapes, ganchos, bayonetas, columpios, desperdicios, retiro del material sobrante, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.*

Unidad: ton

Datos:

Costo del acero de refuerzo puesto en obra: \$14,000.00/ ton

Costo del alambre recocido # 18: \$ 19.80/ kg

Nota:

La cantidad de alambre recocido que se emplea para habilitar 1 tonelada de acero son 30 kilos (cantidad aproximada que varía según el calibre que se emplee: #16, #18, #20 y según el acero que se habilite: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", etc., oscila entre 20 y 35 kilos por tonelada de acero habilitado).

Obtención del costo directo, aplicando $M = P_m \times C_m$

Acero:

$P_m = \$14,000.00$

$C = 1.0 \text{ ton} \times 1.10 \text{ ton/ton}$ (Considerando un 10% de desperdicio)

Alambre recocido:

$P_m = \$19.80$

$C = 30 \text{ kg} / \text{ton}$ (incluye desperdicio)

Con estos datos, se puede calcular el costo directo del material en el concepto especificado:

Es práctica común presentar los análisis de precios unitarios en formatos que, a la fecha, están prácticamente estandarizados; dichos formatos se llaman “matrices” o “tarjetas”. En el caso del ejemplo anterior, la presentación en dicho formato, en la parte correspondiente a materiales, queda de la siguiente manera:

Descripción	Unidad	Cantidad (Cm)	Costo Unitario (Pm)	Importe
Acero de refuerzo $f_y = 4,100 \text{ kg/cm}^2$, 3/8" de diámetro	ton	1.10	\$ 14,000.00	\$ 15,400.00
Alambre recocido #18	kg	30.00	\$ 19.80	\$ 594.00
SUMA MATERIALES				\$ 15,994.00

Lo más frecuente, es calcular un precio unitario para cada uno de los diámetros de varilla considerados en el proyecto. En tal caso, los porcentajes de desperdicio serán particulares y diferentes para cada diámetro y el cálculo semejante al ejemplo presentado.

Si eventualmente se presenta la necesidad de integrar un solo precio unitario para acero de refuerzo de diferentes diámetros, el costo directo del material se calcula con el costo de adquisición del acero de refuerzo puesto en obra, y un consumo donde se incluya un porcentaje por ganchos, traslapes y desperdicios, obtenido a través de un “promedio pesado”, considerando los porcentajes por utilización de los diferentes diámetros involucrados en el análisis. En el ejemplo que sigue se considera este caso.

La Tabla 2.1, indica el porcentaje ponderado total de las varillas utilizadas en el proyecto. No se debe olvidar que la variación de los porcentajes depende fundamentalmente del elemento o elementos constructivos en que se va a utilizar la varilla de acero. La tabla que se muestra es para losas de concreto reforzado y es aproximada.

Tabla 2.1 Porcentaje de utilización y desperdicio de varillas.

DIÁMETRO	INCREMENTOS			SUMA	% DE PARTICIPACIÓN	% TOTAL
	GANCHOS	TRASLAPES	DESPERDICIOS			
5/16" (7.9 mm)	4.3	1.16	3.3	8.76	0	0.0
3/8" (9.5 mm)	4.3	1.9	3.3	9.50	40	3.8
1/2" (12.7 mm)	5.0	2.5	3.3	10.80	30	3.2
5/8" (15.9 mm)	6.0	3.2	3.3	12.50	15	1.9
3/4" (19.1 mm)	6.7	3.8	3.3	13.80	10	1.4
7/8" (22.2 mm)	8.7	4.4	3.3	16.40	0	0.0
1" (25.4 mm)	11.0	5.1	3.3	19.40	5	1.0
1 1/8" (28.6 mm)	12.7	5.7	3.3	21.70	0	0.0
1 1/4" (31.8 mm)	14.3	6.4	3.3	24.00	0	0.0
1 1/2" (38.1 mm)	17.7	7.6	3.3	28.60	0	0.0
SUMA					100%	11.3

Los porcentajes de utilización por ganchos, del tipo 180°, se obtuvieron con base en una longitud a emplearse de 6.00 m y los ganchos extremos necesarios para cada varilla de la Tabla 2.2, tomada del manual Monterrey. Así, para un diámetro de 1" (25.4 mm) se tiene:

$$\frac{33}{600} \times 100 = 0.11 \times 100 = 100\%$$

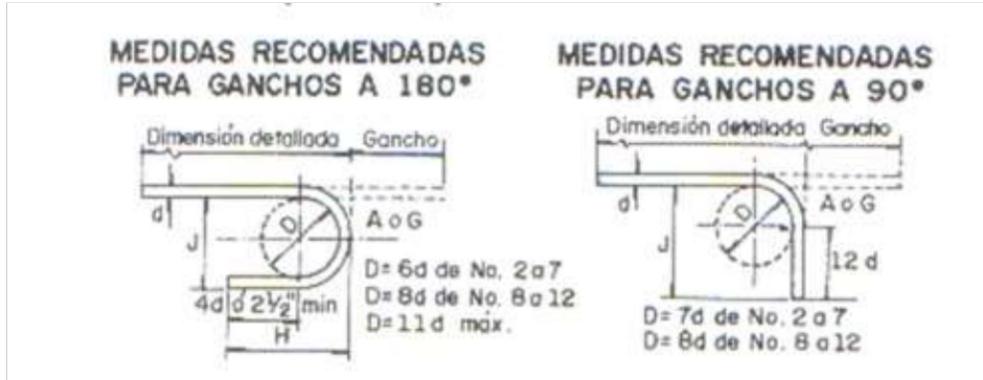


Tabla 2.2 Longitud del gancho en función del diámetro de la varilla.

DIÁMETRO DE VARILLA	LONGITUD DEL GANCHO
<i>5/16"</i>	13
<i>3/8"</i>	13
<i>1/2"</i>	15
<i>5/8"</i>	18
<i>3/4"</i>	20
<i>7/8"</i>	26
<i>1"</i>	33
<i>1 1/8"</i>	38
<i>1 1/4"</i>	43
<i>1 1/2"</i>	53

Para el cálculo del porcentaje de utilización por traslape que aparece en la Tabla 2.1, se ha hecho la suposición que el 60% de la varilla total a emplearse tendrá que ser traslapada, siendo la longitud del traslape de 40 diámetros.

Ejemplo: para la varilla de 3/8" (9.5 mm), la longitud de traslape es igual a $9.5 \times 40 = 38$ cm, por lo cual el porcentaje de utilización por traslape es de $38 \text{ cm} \times 0.60/12 \text{ m} = 1.9 \%$

Por otra parte, el porcentaje de desperdicio por cortes se ha obtenido al considerar un desperdicio por este concepto de 40 cm por cada 12 metros de varilla utilizada, o sea un 3.3% de desperdicio de utilización para cualquier diámetro.

Considerando un costo ponderado de \$15,829.55 por tonelada de varilla y 30 kg de alambre recocado por tonelada, el costo del concepto resulta:

Descripción	Unidad	Cantidad (Cm)	Costo Unitario (Pm)	Importe
Acero de refuerzo $f_y = 4,100 \text{ kg/cm}^2$, 3/8" de diámetro	ton	1.13	\$ 15,829.55	\$ 17,887.39
Alambre recocado #18	kg	30.00	\$ 19.80	\$ 594.00
SUMA MATERIALES				\$ 18,481.39

2.13.2 Concepto: “Concreto premezclado $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$, cemento resistencia rápida, agregado grueso 3/4" (19.1 mm) y revenimiento de 10 cm”.

Unidad: m^3

Obtención del costo por metro cúbico en obra

Precio de lista del concreto por $\text{m}^3 = \$ 1,790.00$

Descuento sobre material: 6% (varía de 0 a 12%, dependiendo del volumen de compras del consumidor, principalmente) = \$107.40

Costo aplicando el descuento = $\$1,790.00 - \$107.40 = \$1,682.60$

Merma (adicional al desperdicio durante su utilización) 4% = $0.04 \times \$1,682.60 = \67.30

Costo tomando en cuenta la merma = $\$1,682.60 + \$67.30 = \$1,749.90$

Es responsabilidad de la empresa fabricante del concreto, tomar cilindros de prueba por cada 25 m^3 suministrados, pero, por seguridad del constructor, es conveniente que tome sus propios cilindros de prueba y revenimiento del concreto solicitado. Supongamos 2 cilindros por cada 5.00 m^3 . Si consideramos que \$60.00 es el costo promedio de un cilindro de prueba.

Costo de los cilindros = $2 \times \$60.00 / 5.00 \text{ m}^3 = \$ 24.00$

Generalmente el concreto premezclado se descarga en artesas, perfectamente limpias y seguras. Estas artesas se deben considerar dentro del costo directo.

Para el presente caso se considera como costo de las artesas, \$ 8.00 por m^3 de concreto.

Haciendo la suma se tiene:

Descripción	Unidad	Cantidad (Cm)	Costo Unitario (Pm)	Importe
Concreto premezclado $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$	m3	1.13	\$1,749.90	\$ 1,977.39
Cilindros de concreto	pza	0.40	\$ 60.00	\$ 24.00
Artesa de madera	pza	1.00	\$ 8.00	\$ 8.00
SUMA MATERIALES				\$ 2,009.39

NOTA: Si la obra se ubica fuera del área metropolitana, será necesario hacer un cargo por flete.

2.13.3 Concepto: *Cemento portland puzolánico (tipo CPP30R), por tonelada, en sacos de 50 kilos cada uno.*

Unidad: ton

Obtención del costo:

Costo del material, puesto en obra= \$2,845.00 / ton

Merma (1% sobre costo del material) = \$28.45/ton

Al hacer la suma, se tiene:

Costo material puesto en obra por tonelada en sacos de 50 kg = \$2,873.45

Resultado que, presentado en la manera convencional resulta:

Descripción	Unidad	Cantidad (Cm)	Costo Unitario (Pm)	Importe
Cemento portland puzolánico (tipo CPP30R)	ton	1.01	\$2,845.00	\$ 2,873.45
SUMA MATERIALES				\$ 2,873.45

2.13.4 Concepto: *Cimbra y descimbra en losas, acabado aparente.*

Unidad: m²

Supongamos que la cimbra va a ser de madera; en este caso por ser una estructura temporal, el consumo que se toma en el análisis del costo directo es la cantidad necesaria de cada elemento de madera entre el número de usos considerados, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Descripción	Cantidad necesaria por m ²	Número de usos	Cantidad que se tomará en el análisis de costos
<i>Triplay de pino de 16 mm</i>	1 m ²	4	0.25 m ²
<i>Polín 3 1/2" x 3 1/2"</i>	2 piezas	10	0.20 pieza
<i>Barrote 1 1/2" x 4"</i>	2 piezas	8	0.25 pieza

El análisis, dentro de la matriz del precio unitario, queda presentado de la siguiente manera:

Descripción	Unidad	Cantidad (Cm)	Costo Unitario (Pm)	Importe
Triplay de pino de 2a. de 16 mm de espesor	m2	1.13	\$152.60	\$ 172.44
Polín de 3 1/2" x 3 1/2"	pza	0.40	\$ 125.00	\$ 50.00
Barrote 1 1/2" x 4"	pza	1.00	\$ 72.00	\$ 72.00
Clavo de 2-3"	kg	0.10	\$ 26.00	\$ 2.60
Alambre recocado	kg	0.05	\$ 19.00	\$ 0.95
Desmoldante	l	0.50	\$ 30.00	\$ 15.00
SUMA MATERIALES				\$ 312.99

Capítulo 3

Mano de obra

3.1 Generalidades

La mano de obra es el recurso más valioso con que se cuenta en la construcción. La destreza de quienes ejecutan los trabajos en obra es ampliamente reconocida en el ramo. La correcta utilización de los materiales y la operación adecuada de la maquinaria y equipo requieren del elemento humano sin el cual sería imposible lograr las grandes construcciones orgullo de la ingeniería mexicana.

La construcción está catalogada como una actividad de alto riesgo, los trabajadores laboran muchas veces en condiciones difíciles, en alturas considerables o bajo la superficie en excavaciones profundas, trasladan cargas pesadas y en general, requieren de la fuerza física para desempeñar adecuadamente su trabajo.

Debido a lo anterior, se han implementado campañas de seguridad e higiene, así como de capacitación, cuyo propósito es prevenir la ocurrencia de accidentes y salvaguardar la integridad de los trabajadores de la construcción.

Otro logro importante en este aspecto es la aplicación de la ergonomía para diseñar mejores herramientas.

3.2 Oficios en la construcción

El personal que labora en la industria de la construcción está organizado en diversos niveles jerárquicos, cuyas principales categorías son las de maestro, oficial, ayudante y peón, las que, a su vez, dependiendo del tipo, magnitud y complejidad de la obra, se dividen en otras tantas subcategorías, como pueden ser: oficial de primera, oficial de segunda, etc.

Se ilustran a continuación algunos de los oficios de la construcción.

Carpintero de banco, es el trabajador que fabrica o repara muebles y otros artículos similares, determina la cantidad y tipo de madera requerida, la prepara, desplanta, marca corta y labra las partes del artículo que se va a fabricar o reparar; arma y pega las piezas con partes prefabricadas. Instala muebles, herrajes y recubre los artículos ya armados. Se auxilia de herramientas propias del oficio, ocasionalmente hace presupuestos; se vale de planos y diseños.

Carpintero de obra negra, es el trabajador que construye estructuras de madera como tarimas, cimbras, andamios y otras para ser utilizadas en la construcción, hace cajones para el colado de cimentaciones, castillos, dalas, trabes, coloca puntales y refuerza las estructuras de madera para que resistan el peso y la presión del concreto durante su fraguado, si el caso lo requiere puede utilizar otro tipo de materiales, además, también realiza el descimbrado.



Oficial colocador de mosaicos, losetas y azulejos, es el trabajador que coloca mosaico, azulejo, loseta y materiales similares, usados en la construcción y decoración de casas y edificios, selecciona, prepara

y corta los materiales que va a colocar, combina las piezas y las dispone según los diseños a lograr; prepara la superficie con los materiales requeridos y coloca las piezas, retoca, rellena juntas, limpia, pule las superficies, se auxilia de herramientas propias del oficio, respetando siempre los requerimientos del proyecto.

Oficial herrero, es el trabajador que corta, dobla, da forma, coloca y amarra varillas, alambres y alambres en una construcción, de acuerdo con dibujos, planos o indicaciones al respecto, se auxilia de herramientas propias del oficio.



Oficial albañil, es el trabajador que realiza labores de construcción y reparación de cimientos,



levantamiento de muros, techos, losas, dalas y otras obras de albañilería, cuida de la preparación de la mezcla, pega tabiques, hace amarres y castillos, arma varillas para trabes, cimbras y colado de concreto en losas, contratraves y columnas; coloca tubos de albañal, empotra herrería, realiza aplanados y recubre pisos.

Oficial electricista, es el trabajador que instala, repara o modifica instalaciones eléctricas, reemplaza fusibles e interruptores monofásicos y trifásicos, sustituye cables de la instalación, conecta o cambia tableros de distribución de cargas o sus elementos, ranura muros y entuba; distribuye conforme a planos salidas de centros, apagadores y contactos; sustituye e instala lámparas, equipos de ventilación y calefacción, se auxilia de herramientas propias del oficio.



Oficial herrero, es el trabajador que fabrica o repara puertas, ventanas, cancelos, barandales, escaleras y otras piezas utilizadas en la construcción, según especificaciones de planos, dibujos o diseños, elige el material adecuado, toma las medidas requeridas, lo corta en frío o en caliente y le da la forma deseada, taladra, une las partes, coloca herrería, pule y aplica anticorrosivo, se auxilia de herramientas propias del oficio.

Oficial pintor, es el trabajador que aplica capas de pintura, barniz, laca o productos similares en interiores y exteriores de casas, edificios y otro tipo de construcciones, acondiciona previamente la superficie que va a pintar, lijándola, resanándola o aplicando sellador o plaste, luego prepara la pintura, iguala tonos y pinta, repitiendo esta operación las veces que sea necesario hasta que la aplicación sea uniforme, se auxilia de herramientas propias del oficio.



Oficial plomero, es el trabajador que instala o repara tuberías, tinacos, enseres o accesorios hidrosanitarios para servicio de agua y drenaje, sondea, destapa, corta, dobla, tarraja, suelda, conecta tubos y partes relacionadas con las instalaciones hidrosanitarias, hace cambios de las partes que lo requieran, se auxilia de herramientas propias del oficio.

Oficial vidriero, es el trabajador que mide, corta, coloca y sella todo tipo de vidrios, cristales y lunas en cancelos de cualquier tipo, se auxilia de las herramientas propias de su oficio.

Oficial yesero, es el trabajador que realiza el acabado de muros, techos y columnas, aplicando a estos una capa de yeso y recubriendo también con el mismo material, plafones, divisiones y entrepaños, prepara el yeso y la superficie y lo aplica hasta lograr el acabado requerido. Puede utilizar andamios y estructuras semipermanentes de madera o de otros materiales para llevar a cabo su trabajo.



Hay algunos trabajadores, que no ejecutan una actividad directa en algún frente de trabajo, sino que participan en la obra desempeñando funciones administrativas de control, de supervisión o de vigilancia, su costo, que es de carácter indirecto, queda contemplado en el costo de administración de obra, ejemplo de ellos son:

Velador, es el trabajador que realiza labores de vigilancia durante la noche, recorre las diferentes áreas del establecimiento anotando su paso en el reloj checador cuando lo hay, vigila al personal que entra y sale del establecimiento después de las horas de trabajo normal, cierra puertas y contesta llamadas telefónicas, al terminar su jornada rinde un informe de las irregularidades observadas; en el desempeño de su trabajo puede usar armas de fuego.

Encargado de bodega y/o almacén, es el trabajador que controla las entradas y salidas de materiales, productos, mercancías u otros artículos que se manejen en la bodega o almacén del que es responsable, vigila el orden de las mercancías en los casilleros, supervisa o hace las entregas de estas mediante la documentación establecida, lleva registros, listas y archivos de movimientos ejecutados diariamente, hace reportes y relaciones de materiales faltantes, puede formular pedidos.

Finalmente, existe el caso particular de la mano de obra de operación de equipo, la cual, como se verá más adelante, se involucra dentro del costo hora-máquina, ya que el costo de operación depende directamente del número de horas que trabaja la máquina.

Chofer de camión de carga en general, es el trabajador que opera un camión para el transporte de carga en general, verifica el funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera el camión hasta su destino, donde vigila la entrega correcta de la carga, presenta la documentación que la ampara y en su caso cobra el importe del flete y/o de la mercancía.

Este trabajador deberá tener el tipo de licencia que requieran las disposiciones legales vigentes en la zona correspondiente, que lo acrediten como calificado para conducir esta clase de vehículo, puede realizar pequeñas reparaciones al vehículo, reportarlo y/o conducir al taller mecánico para su reparación por lo que debe llevar un registro detallado que indique kilometraje, fechas y destinos.

Chofer de camioneta de carga en general, es el trabajador que opera una camioneta para el transporte de carga en general, verifica el funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera la camioneta hasta su destino, donde vigila la entrega correcta de la carga, presenta la documentación que la ampara y en su caso cobra el importe del flete y/o de la mercancía. Este trabajador deberá tener el tipo de licencia que requieran las disposiciones legales vigentes en la zona correspondiente, que lo acrediten como calificado para conducir esta clase de vehículo, puede realizar pequeñas reparaciones al vehículo, reportarlo y/o conducir al taller mecánico para su reparación, por lo que debe llevar un registro detallado que indique kilometraje, fechas y destinos.

Operador de bulldozer, es el trabajador que previa capacitación, opera una máquina provista de una hoja con cuchilla para mover tierra, rocas y otros materiales a distancias cortas. Revisa el funcionamiento del tractor y, operando los controles, procede a mover tierra, desmontar y excavar canales, nivelar terrenos y otras obras semejantes en la construcción de aeropuertos, caminos, sistemas de riego, urbanizaciones, construcción de bordos, demolición de edificios y trabajos similares, puede realizar pequeñas reparaciones a la máquina o reportarla para mantenimiento y operación.



Operador de draga, es el trabajador que previa capacitación, opera una draga para realizar excavaciones en la construcción de colectores pluviales, canales en sistemas de riego, obras portuarias y otras labores similares, revisa el funcionamiento de la draga, acciona controles y procede a excavar, carga material pesado, demuele edificios, coloca estructuras metálicas según el trabajo por realizar, puede efectuar pequeñas reparaciones a los motores o a la grúa de que está provista la draga o bien reportarla para mantenimiento y reparación.

Operador de cargador frontal, es el trabajador que previa capacitación, opera un cargador frontal sobre neumáticos o sobre orugas, provisto de un bote para excavar, mover tierra, cargar materiales, nivelar terrenos en la industria de la construcción y actividades conexas, revisa el funcionamiento de la máquina, la pone en marcha y procede a operarla moviendo los controles para cargar materiales, remover tierra, realizar excavaciones en materiales suaves, para la construcción de caminos, presas, obras portuarias, minas de arena y de carbón, aeropuertos y alimentación de materiales en plantas de agregados y fábricas de cemento. Puede realizar pequeñas reparaciones a la máquina y reportarla para mantenimiento.

Operador de vehículos con grúa, es el trabajador que previa capacitación, maneja y opera grúas móviles, camión o grúa sobre orugas, para auxilio de vehículos o para tareas que requieran su intervención, como es el caso de trabajos de erecciones y montajes de todo tipo de estructuras. Coloca el vehículo y objeto a levantar en la posición adecuada y valiéndose de la grúa de operación manual o impulsada, engancha el objeto o vehículo como más convenga colocando el material de amortiguamiento necesario, hace el transporte hasta el lugar indicado; repite la operación cuantas veces sea necesario.

3.3 El concepto de cuadrilla

Es difícil imaginar la ejecución de un trabajo de construcción de manera individual. La mayoría de los procedimientos constructivos manuales consisten en una serie de actividades secuenciales que requieren la participación de dos o más personas. Basten algunos casos para ejemplificar lo anterior:

- Al cimbrar con madera, mientras una persona presenta una pieza para clavarla, otra le ayuda a sostenerla y aún otra más puede estar cortando a la medida las piezas faltantes de colocar.
- En la construcción de un muro de tabique, una persona se encarga de elaborar la mezcla para juntar las piezas, de acarrear el material al pie del frente de trabajo y otra coloca los tabiques de manera adecuada.
- Al llevar a cabo el colado de una losa, un grupo de personas se encarga de la fabricación del concreto en obra, otro grupo se ocupa del acarreo de la mezcla y otro grupo más de su colocación.

Este grupo de personas que trabajan de manera coordinada con un propósito común recibe en el campo de la construcción, el nombre de *cuadrilla*.

De acuerdo con la naturaleza y complejidad del trabajo por ejecutar, será el número y especialidad de las personas que integran una cuadrilla.

En un concepto de obra pueden estar trabajando simultáneamente varias cuadrillas de la misma o de diferente especialidad; para calcular el costo directo de la mano de obra, en el primer caso, es suficiente tomar en consideración una sola cuadrilla; en el segundo caso, es necesario tomar cada una de las cuadrillas con su correspondiente rendimiento en la actividad específica que están ejecutando.

Particularmente en el campo de la edificación, se tienen tantos tipos de cuadrillas como oficios o trabajos específicos se puedan definir en esta rama de la construcción. La tabla 3.1, muestra algunos ejemplos de integración de cuadrillas.

Tabla 3.1 Ejemplo de integración de cuadrillas.

Cuadrilla	Cuadrilla
1 Cabo + x número de peones	1 Oficial impermeabilizador + 1 ayudante
1 Oficial albañil + 1 ayudante	1 Oficial jardinero + 1 ayudante
1 Oficial aluminero + 1 ayudante	1 Oficial pastero + 1 ayudante
1 Oficial carpintero + 1 ayudante	1 Oficial pintor + 1 ayudante
1 Oficial cerrajero + 1 ayudante	1 Oficial plomero + 1 ayudante
1 Oficial colocador de alfombra + 1 ayudante	1 Oficial soldador + 1 ayudante
1 Oficial colocador de loseta + 1 ayudante	1 Oficial tablarroquero + 1 ayudante
1 Oficial colocador de tubería + 1 ayudante	1 Oficial tubero + 2 ayudantes + 4 peones
1 Oficial electricista + 1 ayudante	1 Oficial vidriero + 1 ayudante
1 Oficial ebanista + 1 ayudante	1 Oficial yesero + 1 ayudante
1 Oficial herrero + 1 ayudante	1 Poblador + 1 ayudante + 1 cargador
1 Oficial herrero + 1 ayudante	1 Topógrafo + 2 cadeneros
1 Oficial herrero + 1 soldador + 1 ayudante + 1 peón	

3.4 El costo directo por mano de obra

Para calcular el costo directo por mano de obra, se seguirá lo indicado por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, RLOPSRM, que en el artículo 159 establece lo siguiente:

Artículo 159.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión:

$$Mo = \frac{Sr}{R}$$

Donde:

“Mo” Representa el costo por mano de obra.

“Sr” *Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.*

Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” (Salario Base) de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos, el que deberá afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Sr = Sn * Fsr$$

“R” *Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.*

3.4.1 Primer mando

En el artículo 159 del RLOPSRM, se menciona el primer mando. En la integración del costo de las cuadrillas, es necesario incorporar el costo del cabo o jefe de cuadrilla, que funciona como enlace entre el maestro de obras o sobrestante y los encargados directamente de la ejecución de los trabajos. El costo del cabo será proporcional al número de personas que pueda dirigir y supervisar. Así, por ejemplo, en el caso particular de una cuadrilla integrada por peones, quienes no tienen un oficio determinado pero se integran para llevar a cabo tareas específicas, como pueden ser excavaciones manuales en zanja o a cielo abierto, la cuadrilla puede estar integrada por 1 Cabo + 10 peones, por 1 Cabo + 15 peones e incluso por 1 Cabo + 20 peones. Al calcular el costo directo de la cuadrilla, es común referir las cuadrillas anteriores como 0.10 Cabo + 1 peón, 0.07 Cabo + 1 peón y 0.05 Cabo + 1 peón respectivamente.

Si bien el costo directo se calcula con base en el costo y rendimiento de una sola cuadrilla, la cantidad de ellas que se asigne a determinada tarea dependerá del volumen de obra por ejecutar y del tiempo especificado para llevarlo a cabo.

La expresión anterior involucra varios elementos que se explican a continuación.

3.4.2 Salario

La Ley Federal del Trabajo, LFT, contiene las siguientes definiciones relacionadas con el salario:

Artículo 82.- Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.

Artículo 83.- El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso,

proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo.

Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Artículo 85.- El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley, para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo.

En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal, que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, de por resultado el monto del salario mínimo, por lo menos.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, entre otras cosas que:

El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda.

3.4.2.1 Salario Mínimo

La propia LFT contempla la definición de salario mínimo:

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

Artículo 91.- Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas.

Artículo 92.- Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales.

Artículo 93.- Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.

Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 95.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las Comisiones Consultivas se integrarán en forma tripartita, de acuerdo a lo establecido por el capítulo II del título trece de esta ley.

Artículo 96.- La Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios.

Artículo 97.- Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes:

- I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las personas mencionadas en el artículo 110, fracción V; y*
- II. Pago de rentas a que se refiere el artículo 151, este descuento no podrá exceder del diez por ciento del salario.*
- III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta ley, que se destinara a cubrir los gastos que se erogan por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder el 20% del salario.*
- IV. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el fondo a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios, estos descuentos estarán precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% del salario.*

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, elabora un listado que contiene los salarios mínimos generales y profesionales para todo tipo de actividades, mismos que se publican en el Diario Oficial de la Federación y que generalmente empiezan a regir el día 1 de enero de cada año. La Tabla 3.1 muestra esta relación para el año 2020, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2019. Se muestran únicamente los oficios relacionados con la construcción.

Tabla 3.1 Salario mínimos vigentes a partir del 1 de enero del 2021.

No.	Profesionales	Zona libre de la frontera	Resto del país	No.
	Mínimo	\$ 213.39	\$ 141.70	
1	Albañilería, oficial de	213.39	163.46	1
3	Bulldozer y/o traxcavo, operador(a) de	213.39	171.24	3
6	Carpintero(a) de obra negra	213.39	163.46	6
7	Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial	213.39	160.77	7
10	Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial	213.39	160.20	10
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	213.39	152.56	11
16	Chofer de camión de carga en general	213.39	166.82	16
17	Chofer de camioneta de carga en general	213.39	162.09	17
18	Chofer operador(a) de vehículos con grúa	213.39	155.92	18
19	Draga, operador(a) de	213.39	172.82	19
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	213.39	163.09	20
21	Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	213.39	160.20	21
25	Encargado(a) de bodega y/o almacén	213.39	149.21	25
29	Herrería, oficial de	213.39	213.39	29
39	Pintor(a) de casas, edificios y construcción en general, oficial	213.39	157.06	39
42	Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	213.39	157.34	42
52	Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	213.39	161.75	52
59	Velador(a)	213.39	146.79	59

Con relación a los salarios mínimos propuestos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es importante hacer dos observaciones:

1. Lo salarios mínimos propuestos, están por debajo de los salarios que se pagan en el mercado, por lo cual, es recomendable que se lleve a cabo una investigación de salarios en la localidad donde habrá de efectuarse la obra, para elaborar un presupuesto con datos reales (investigación denominada mercadeo).
2. La lista de referencia no contiene la totalidad de los oficios empleados en la construcción por lo cual en muchos casos es necesario investigar los salarios de los oficios requeridos.

3.4.2.2 Salario Base

El salario base, salario diario o salario nominal es el que se paga en efectivo al trabajador por día transcurrido (incluyendo domingos, vacaciones y días festivos) mientras dura la relación laboral, y por el cual fue contratado. En los casos en que procede, al trabajador se le deberá descontar lo que le corresponde por concepto de seguro social y por impuesto sobre producto del trabajo. Es este salario base el que deberá multiplicarse por el factor de salario real para obtener el salario real con el que se calculará a su vez el costo directo de mano de obra.

La determinación de los salarios base se hace a través de un mercadeo o estudio de los salarios que se pagan en una localidad determinada, en lo cual influyen factores tales como las políticas de la empresa

constructora, la existencia de sindicatos, la ubicación geográfica y el volumen de obra que eventualmente se esté realizando en la zona, ya que por ejemplo la ejecución de un proyecto de gran envergadura tenderá, por efecto de la oferta y la demanda, a incrementar los salarios que se paguen.

Es fácil comprender que, si se pretende pagar salarios bajos, no se conseguirá personal suficientemente capacitado y, si, por el contrario, se ofrecen salarios por arriba del mercado, se encarecerá el presupuesto con el riesgo de no resultar competitivo.

3.4.2.3 Salario base de cotización

Como se verá más adelante en el cálculo del factor de salario real, las cuotas que el patrón paga la Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se aplican al salario base de cotización el cual la ley del IMSS define de la siguiente manera:

Artículo 27.- El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;

II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanal, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la empresa;

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal;

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón.

En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización.

3.4.3 Factor de salario real

El artículo 160 del RLOPSRM, establece el procedimiento para calcular el factor de salario real; a la letra dice:

Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real “Fsr”, como la relación de los días realmente pagados en un período anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo período, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Fsr = ps \frac{Tp}{Tl} + \frac{Tp}{Tl}$$

Donde:

“F_{sr}” Representa el factor de salario real.

“ps” Representa en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“Tp” Representa los días realmente pagados durante un período anual.

“Tl” Representa los días realmente laborados durante el mismo período anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del período anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios.

3.4.3.1 Cálculo de Tp (Días realmente pagados al año)

Se hará este cálculo con base en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Adicionalmente a los 365 días que se pagan al año, la LFT señala que:

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Con base a lo que señala el artículo anterior, se puede elaborar la siguiente tabla:

Tabla 3.2. Días de vacaciones con base en los años de servicio.

Años de servicio	Días de vacaciones
1	6
2	8
3	10
4	12
5 a 9	14
10 a 14	16
15 a 19	18

Artículo 78.- Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de vacaciones, por lo menos.

Artículo 80.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima, no menor del veinticinco por ciento, sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.

Con base en los artículos anteriores, el cálculo de Tp resulta:

Concepto	Número de días
Por cuota diaria (Art. 83 y 84)*	365
Por aguinaldo (Art. 87)	15
Por prima vacacional (Art. 76 y 80), 25% x 6 días de vacaciones mínimas	1.5
Días realmente pagados en el año (Tp)	381.5

* Debido a los años bisiestos, algunos analistas de precios consideran este número de días pagados por cuota diaria igual a 365.25. El autor no comparte este criterio ya que, en obras de corta duración, que son la mayoría, se sabe de antemano si el año es bisiesto o no.

3.4.3.2 Cálculo de TI (Días realmente trabajados en el año)

Con relación a este tema, la LFT señala:

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.

Artículo 71.- En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo.

Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

Artículo 73.- Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso, si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.

Artículo 74.- Son días de descanso obligatorio:

I. El 1o. de enero;

II El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV El 1o. de mayo;

V El 16 de septiembre;

VI El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y

VIII El 25 de diciembre, y

IX El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Artículo 75.- En los casos del artículo anterior los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios; si no se llega a un convenio, resolverá la junta de conciliación permanente o en su defecto la de conciliación y arbitraje.

Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.

Nota aclaratoria:

Si por la naturaleza del trabajo que se desarrolla en una empresa se requiere de una labor continua, los trabajadores deben convenir con su patrón quiénes de ellos deberá prestar sus servicios en los días de descanso obligatorio, y en caso de no llegar a un acuerdo, se planteará el conflicto ante las autoridades del trabajo, conforme a los procedimientos ordinarios señalados en la propia Ley.

Adicionalmente a los días que establece la LFT, es necesario considerar también como inactivos algunos días del año, durante los cuales el trabajador goza de su salario íntegro. El número de estos días lo determinarán las políticas de la empresa, el entorno de la obra sobre todo en lo relacionado con su

localización, la época del año cuando se realicen los trabajos, etc. Para fines de ejemplo, se consideran 3 días para cada uno de los rubros considerados.

Conforme a lo anterior, los días no laborados suman:

Concepto	Número de días
Por séptimo día (Art. 69).	52
Por días festivos (Art. 74) (Se considera el 0.17 que corresponde a un 1/6 de día, debido a que cada 6 años no se trabaja el día de la toma de posesión del presidente de la República Mexicana.	7.17
Por vacaciones (Art. 76).	6
Por fiestas de costumbre (3 de mayo, día de muertos, 12 de diciembre).	3
Por enfermedad no profesional.	3
Por mal tiempo y otros.	3
SUMA	74.17

Con base en lo anterior, el cálculo de Tl resulta:

Concepto	Número de días
Días calendario.	365
Días no laborados.	74.17
Días realmente laborados en el año (Tl)	290.83

Se puede ahora determinar el valor del cociente de incremento, debido a las prestaciones que otorga la Ley Federal del Trabajo:

$$\frac{T_p}{T_l} = \frac{381.5 \text{ días pagados}}{290.83 \text{ días laborados}} = 1.3118$$

Lo cual significa un incremento de 31.18% sobre el salario base, por concepto de prestaciones de la Ley Federal del Trabajo.

3.4.3.3 Cálculo del factor ps

El factor ps, comprende las prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, LSS y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, LINFONAVIT.

3.4.3.3.1 Seguro social

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes que nos rigen, todos los empresarios tienen la obligación ineludible de inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual, a cambio del pago de las primas de seguro correspondientes, se encarga de velar por la seguridad de los trabajadores y de impartirles la asistencia, servicios sociales y prestaciones señaladas por la nueva Ley del Seguro Social, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2020.

Se transcriben a continuación algunos artículos relevantes de la LSS, sobre todo aquellos que se inciden directamente en el cálculo del factor de salario real de la mano de obra.

Artículo 6.- El Seguro Social comprende:

I. El régimen obligatorio, y

II. El régimen voluntario.

Artículo 11.- El régimen obligatorio de la Ley comprende los seguros de:

I. Riesgos de trabajo;

II. Enfermedades y maternidad;

III. Invalidez y vida;

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

V. Guarderías y prestaciones sociales.

- Riesgos de trabajo

Artículo 41.- Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Artículo 71.- Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones, se determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización, y con los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate, en los términos que establezca el reglamento relativo.

Artículo 72.- Para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas, multiplicando la siniestralidad de la empresa, por un factor de prima y al producto se le sumará el 0.005. El resultado será la prima que se aplicará sobre los salarios de cotización, conforme a la fórmula siguiente:

$$\text{Prima} = [(S/365) + V * (I + D)] * (F/N) + M$$

En donde:

- V, 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total.*
- F, 2.3, que es el factor de prima*
- N, Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.*
- S, Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal.*
- I, Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre 100.*
- D, Número de defunciones*
- M, 0.005, que es la prima mínima de riesgo.*

Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán, en la clase que les corresponda conforme al reglamento, la prima media. Una vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones de la misma se harán conforme al párrafo primero de este artículo.

No se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas, los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa.

Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aplicarán una F de 2.2 como factor de prima.

Las empresas de menos de 10 trabajadores, podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al reglamento, de acuerdo al artículo 73 de esta Ley.

Artículo 73.- Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar la actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les corresponda, de acuerdo con la tabla siguiente:

Prima media	En por cientos
Clase I	0.54355
Clase II	1.13065
Clase III	2.59840
Clase IV	4.65325
Clase V	7.58875

Se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el cambio de actividad de la empresa se origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta Ley o de un reglamento.

Artículo 74.- Las empresas tendrán la obligación de renovar anualmente su siniestralidad, conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, si disminuye o aumenta.

La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al uno por ciento con respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo determinados durante el lapso que fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima y máxima, que será de cero punto cinco por ciento y quince por ciento de los salarios base de cotización respectivamente. La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia. La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia.

Artículo 75.- La determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista, una clase determinada. Este supuesto sólo se aplicará a las empresas que se inscriben por primera vez en el Instituto o cambien de actividad...

El Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en el Capítulo II: “De la Clasificación de las Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo” establece:

Artículo 18.- Las empresas al registrarse por primera vez o al cambiar de actividad deberán auto clasificarse para efectos de la determinación y pago de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, conforme al Catálogo de Actividades establecido en el Título Octavo de este Reglamento, en la división económica, grupo económico, fracción y clase que en cada caso les corresponda de acuerdo a su actividad.

Asimismo, las empresas deberán clasificarse para los efectos del párrafo anterior en los casos de cualquier cambio de fracción, actividad o clase por disposición de la Ley, de este Reglamento o por sentencia definitiva.

Por su parte, el Título Octavo; “Del Catálogo de Actividades para la Clasificación de las Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo Capítulo Único” señala:

Artículo 196.- Para los efectos del Capítulo II, del Título Segundo del presente Reglamento, las empresas y el Instituto se sujetarán al Catálogo de Actividades que establece este artículo.

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
(Se enlistan solo algunas relacionadas con la construcción)

GRUPO 41	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	
FRACCIÓN	ACTIVIDAD	CLASE
411	<p>Construcción de edificaciones; excepto obra pública.</p> <p>Comprende a las empresas que se dedican a la construcción, reparación, reformas y reconstrucciones de edificaciones residenciales y no residenciales, excepto cuando se trate de obra pública.</p> <p>Se incluye la construcción de casas, conjuntos habitacionales, hoteles, moteles, instalaciones y edificaciones comerciales, de oficinas y servicios tales como bancos, consultorios, tiendas de autoservicio, hospitales, cuarteles, iglesias, escuelas, teatros, cines y similares.</p> <p>No se considerarán dentro de esta fracción, sino de la 412, las edificaciones realizadas por patrones personas morales, así como por patrones personas físicas, cuando éstos acrediten de manera fehaciente que se dedican normalmente a actividades de construcción.</p>	V
412	<p>Construcciones de obras de infraestructura y edificaciones en obra pública.</p> <p>Comprende a las empresas que se dedican a la construcción, reparación, reformas, reconstrucción y supervisión de obras de urbanización y saneamiento, de electrificación, de comunicaciones y transporte, hidráulicas y marítimas, de excavación, nivelación de terrenos, topografía, cimentación, perforación de pozos, alumbrado, andamiaje, demolición, montaje de estructuras prefabricadas (metálicas o de concreto) y similares.</p>	V
	<p>Se considera la construcción de instalaciones y edificaciones agropecuarias, industriales, edificaciones especiales relacionadas con el transporte (estaciones de pasajeros y otras) y edificaciones industriales especiales (centrales telefónicas, telegráficas o eléctricas, industria química y otras). Obras de colección, disposición y tratamiento de aguas negras, potabilizadoras y redes de distribución; camellones, banquetas, calles, avenidas, bulevares, viaductos, pasos a desnivel, sistemas de señalamiento, alumbrado público y otras obras de urbanización y saneamiento; líneas telegráficas, telefónicas, incluso cables submarinos, télex, red de microondas, torres transmisoras de radio y televisión, tendido de líneas para transmisión por cable y otros similares, incluso radares y microondas; caminos, brechas, carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos, sistemas ferroviarios y transporte urbano eléctrico, estructura de vías para transporte ferroviario, urbano, suburbano e interurbano, estaciones subterráneas y vías férreas (metro); oleoductos, gasoductos y conductos similares y otras obras de comunicación y transportes; presas, estaciones de bombeo, acueductos y redes de distribución de agua, canales y obras de riego, obras para control de inundaciones (malecones, diques pluviales y otras), dragado y eliminación de rocas submarinas, puertos, muelles, desembarcaderos, diques rompeolas y similares; canales de navegación y otras obras marítimas; estadios, campos y canchas deportivas; perforación de pozos de agua, petroleros o de gas; lagos y estanques artificiales; instalación y</p>	

	remodelación de esculturas, monumentos y otras obras de ingeniería civil no especificadas.	
	Se incluyen las edificaciones a que se refiere la fracción 411, cuando se trate de obra pública, cuando sean realizadas por personas morales o cuando, tratándose de personas físicas, éstas acrediten de manera fehaciente que se dedican normalmente a actividades de construcción.	
GRUPO 42	TRABAJOS REALIZADOS POR CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS	
FRACCIÓN	ACTIVIDAD	CLASE
421	<p>Instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y de aire acondicionado.</p> <p>Comprende a las empresas que se dedican a la instalación de sistemas sanitarios, de plomería y fontanería, de sistema eléctrico, intercomunicación y de alarma, de sistemas de aire acondicionado, de redes de distribución de gas combustible e instalaciones similares.</p> <p>Incluye la modificación, ampliación o mantenimiento y reparación de las instalaciones mencionadas, así como la limpieza del alcantarillado, caños y tuberías.</p>	IV
422	<p>Instalación y reparación de ascensores, escaleras electromecánicas y otros equipos para transportación.</p> <p>Comprende a las empresas que se dedican a la instalación de ascensores, escaleras electromecánicas y otros equipos o sistemas para elevación o transportación. Incluye la modificación, ampliación, mantenimiento y reparación de los equipos mencionados.</p>	IV
423	<p>Instalación de ventanería, herrería, cancelería, vidrios y cristales.</p> <p>Comprende a las empresas que se dedican a la instalación de ventanería, herrería, cancelería (metálica, de madera u otros materiales), vitrales, vidrios, cristales y otros trabajos similares. Incluye la modificación, ampliación, mantenimiento y reparación de las instalaciones mencionadas y a las empresas que en forma simultánea fabrican e instalan los productos mencionados.</p>	V
424	<p>Otros servicios de instalación vinculados al acabado o remodelación de obras de construcción.</p> <p>Comprende a las empresas que se dedican a la instalación de revestimientos de interiores o exteriores de obras de construcción en general con mezclas de cemento, yeso o cal, materiales pétreos o vidriados, pinturas, madera, impermeabilizantes, materiales térmicos o acústicos, elementos ornamentales y otros materiales o partes no especificados, vinculados al acabado o remodelación de obras de construcción. Incluye a los rotulistas que realicen trabajos en interiores y exteriores de inmuebles sobre muros, paredes, paneles y similares y/o empresas que instalen los anuncios publicitarios, así como sus elementos de suspensión o sustentación.</p>	V

- Enfermedades y maternidad

Artículo 25. (Segundo párrafo).- Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.

Artículo 105.- Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en dinero, las prestaciones en especie y los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones y los trabajadores o demás sujetos y de la contribución que corresponda al Estado.

Artículo 106.- Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se financiarán en la forma siguiente:

- I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal;*
- II. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal; se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado, y*
- III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general para el Distrito Federal, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, la cantidad inicial que resulte se actualizará trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.*

Con relación al artículo anterior, el DECIMO NOVENO transitorio de la ley de 1995 establece que:

La tasa sobre el salario mínimo general diario del Distrito Federal a que se refiere la fracción I del artículo 106, se incrementará el primero de julio de cada año en sesenta y cinco centésimas de punto porcentual. Estas modificaciones comenzarán en el año de 1998 y terminarán en el año 2007.

Las tasas a que se refiere la fracción II del artículo 106, se reducirán el primero de julio de cada año en cuarenta y nueve centésimas de punto porcentual la que corresponde a los patrones y en dieciséis centésimas de punto porcentual la que corresponde pagar a los trabajadores. Estas modificaciones comenzarán en el año de 1998 y terminarán en el año 2007.

Artículo 107.- Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma siguiente:

- I. A los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de dicha cuota;*
- II. A los trabajadores les corresponderá pagar el veinticinco por ciento de la misma, y*
- III. Al Gobierno Federal le corresponderá pagar el cinco por ciento restante.*

- Invalidez y vida

Artículo 112.- Los riesgos protegidos en este capítulo son la invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, en los términos y con las modalidades previstos en esta Ley.

Artículo 146.- Los recursos necesarios para financiar las prestaciones y los gastos administrativos del seguro de invalidez y vida, así como la constitución de las reservas técnicas, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones, los trabajadores y demás sujetos obligados, así como de la contribución que corresponda al Estado.

Artículo 147.- A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto seiscientos veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.

- Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Artículo 152.- Los riesgos protegidos por este capítulo son el retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensionados por este seguro, en los términos y con las modalidades previstas en esta Ley.

Artículo 154.- Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.

Artículo 168.- Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:

I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador.

II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente...

- Guarderías y prestaciones sociales

Artículo 201.- El ramo de guarderías cubre los cuidados, durante la jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la primera infancia, de las personas trabajadoras, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 211.- El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por ciento de dicho monto.

Artículo 212.- Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

La Tabla 3.3 muestra un resumen de los seguros y cuotas obrero-patronales establecidos por el IMSS. Como se puede observar en esta tabla, los porcentajes considerados para cada uno de los seguros son de tres tipos:

1. El que se aplica sobre el salario mínimo general en el Distrito Federal, este último sustituido a la fecha por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. El valor de la UMA para el año 2020 es de \$86.88.
2. El que se aplica sobre la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo general en el D.F., el cual, como ya se mencionó, sustituido actualmente por la UMA.
3. Los que se aplican al salario base de cotización.

Tabla 3.3 Porcentaje de aportaciones obrero-patronales y del estado de acuerdo con la ley del IMSS 1997.

SEGUROS DE:	LÍMITE (4)	PRESTACIONES EN:	PATRON	TRABAJADOR	ESTADO	
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	25 SMGDF	ESPECIE (ART 25)	POR EL PERIODO DE PENSIONES DE R.T., I.V.R.C y V. LA BASE SERA EL SALARIO BASE DE COTIZACION (S.B.C)			
			1.05%	0.375%	0.075%	
		ESPECIE (ART 106)	INGRESOS HASTA DE 3 S.M.G.D.F. (FRACC I)			SOBRE LA BASE DE UN S.M.G.D.F. (FRACCION II)
			INGRESOS DE MAS DE 3 S.M.G.D.F. (FRACCION II)			13.9% (1) DE UN S.M.G.D.F.
		6% (2) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL S.B.C. Y EL LIMITE DE 3 S.M.G.D.F.	2% (3) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL S.B.C. Y EL LIMITE DE 3 S.M.G.D.F.	13.90%		
		DINERO (ART 107)	0.70% DEL S.B.C.	0.25% DEL S.B.C.	0.05% DEL S.B.C.	
RIESGOS DE TRABAJO	25 SMGDF	ESPECIE (*) Y DINERO (ART. 71)	% DEL RIESGO CALIFICADO POR EL S.B.C.			
INVALIDEZ Y VIDA	15 SMGDF	DINERO (ART 147)	LA BASE SERÁ EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN			
			1.75%	0.625%	0.125%	
RETRO	25 SMGDF	DINERO (ART 168 FRACC I)	2% DEL S.B.C.			
CESANTIA Y VEJEZ	15 SMGDF	DINERO (ART. 168 FRACC II)	LA BASE SERÁ EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN			
			3.150%	1.125%	(ART 168 FRACC II) E 225% MAS 5.5% DE UN S.M.G.D.F. COMO CUOTA SOCIAL (ART. 168 FRACC IV)	
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	25 SMGDF	ESPECIE (ART 211)	1% DEL S.B.C.			

(1) ESTE PORCENTAJE SE INCREMENTARA CADA AÑO EN 0.65% A PARTIR DE 1999 AL 2008
(2) ESTE PORCENTAJE SE DISMINUIRA CADA AÑO EN 0.49% A PARTIR DE 1999 HASTA EL 2008
(3) ESTE PORCENTAJE SE DISMINUIRA CADA AÑO EN 0.16% A PARTIR DE 1999 HASTA EL 2008
4) ESTOS LIMITES ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE 1997, AUMENTANDO UN SALARIO MINIMO CADA AÑO HASTA EL 2007 EN EL CASO DE I y V, C y V.

3.4.3.3.2 INFONAVIT

Con el fin de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas, higiénicas y a un precio accesible; el 1º. de mayo de 1972, se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Dicho fondo está formado conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo como sigue:

Artículo 136.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.

Al registrar las empresas a sus trabajadores ante el IMSS, simultáneamente éstos se convierten en derechohabientes del Infonavit. Deben asimismo manifestar el salario diario integrado (salario base de cotización) que les paga en ese momento y aportar bimestralmente al Infonavit el 5% de esa cantidad por cada uno de sus trabajadores.

Conocido el importe de las cuotas del IMSS y del INFONAVIT, se puede calcular el factor ps como la suma de estas cuotas entre el salario base de cotización, esto es:

$$ps = \frac{\text{Suma cuotas IMSS e INFONAVIT}}{\text{Salario base de cotización}}$$

Al analizar con detalle las cuotas descritas, vemos que se pueden distinguir tres casos para el cálculo de dicho factor: Para trabajadores que perciben el salario mínimo, para quienes perciben un salario superior al mínimo pero menor que tres salarios mínimos generales en el D.F. y para trabajadores con salario superior a tres salarios mínimos generales en el D.F. Se desarrollan a continuación las expresiones algebraicas para cada uno de los casos mencionados.

- Para trabajadores con salario mínimo
(El Artículo 36 de la Ley del IMSS señala que: *Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo*).

$$ps = (\text{Suma cuotas IMSS} + \text{INFONAVIT})/\text{SBC} = [20.40\% \text{ UMA} + (0.7 + 1.05 + 1.75 + 3.15 + 2.0 + 7.58875 + 1.0 + 5.0)\% \text{ SBC} + (0.25 + 0.375 + 0.625 + 1.125)\% \text{ SBC}]/\text{SBC}$$

$$ps = (20.40\% \text{ UMA} + 22.23875\% \text{ SBC} + 2.375\% \text{ SBC})/\text{SBC}$$

$$ps = (20.40\% \text{ UMA} + 24.61375\% \text{ SBC})/\text{SBC}$$

Considerándolo en forma decimal:

$$ps = (0.2040 \text{ UMA} + 0.2461375 \text{ SBC})/\text{SBC}$$

Finalmente:

$$ps = 0.2040 \text{ UMA}/\text{SBC} + 0.2461375$$

- Para trabajadores con salario superior al mínimo pero menor que tres UMA:

$$ps = (\text{Suma cuotas IMSS} + \text{INFONAVIT})/\text{SBC} = (20.40\% \text{ UMA} + 22.23875\% \text{ SBC})/\text{SBC}$$

Considerándolo en forma decimal:

$$ps = (0.2040 \text{ UMA} + 0.2223875 \text{ SBC})/\text{SBC}$$

Finalmente:

$$ps = 0.2040 \text{ UMA}/\text{SBC} + 0.2223875$$

- Para Salarios superiores a tres SMGDF

$$ps = (\text{Suma cuotas IMSS} + \text{INFONAVIT})/\text{SBC} = [20.40\% \text{ UMA} + 22.23875\% \text{ SBC} + 0.011 (\text{SBC} - 3 \text{ UMA})]/\text{SBC}$$

Considerándolo en forma decimal:

$$ps = [0.2040 \text{ UMA} + 0.2223875 \text{ SBC} + 0.011 (\text{SBC} - 3 \text{ UMA})]/\text{SBC}$$

$$ps = 0.2040 \text{ UMA}/\text{SBC} + 0.2223875 + 0.011 - 0.033 \text{ UMA}/\text{SBC}$$

Finalmente:

$$ps = 0.171 \text{ UMA}/\text{SBC} + 0.2333875$$

En cualquiera de los tres casos, bastará con aplicar la expresión:

$$Fsr = ps \frac{T_p}{T_l} + \frac{T_p}{T_l}$$

Para conocer el factor de salario real.

Dado que en un presupuesto intervienen trabajadores con distintos salarios, es conveniente realizar los cálculos anteriormente presentados, de una manera mecanizada, por ejemplo, en una hoja de Excel tal como se muestra en la Tabla 3.4

La tabla se ha elaborado bajo los siguientes criterios:

1. Se ha partido de los salarios mínimo y profesionales propuestos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
2. Tomando como base el salario mínimo, se ha obtenido las veces salario mínimo para las demás categorías.
3. Tomando como base el salario del oficial albañil, se han obtenido los salarios para las categorías restantes, manteniendo la proporción que mantienen los salarios profesionales con respecto al mínimo.

Lo anterior no es lo más recomendable, se ha hecho así con fines académicos; lo mejor es que se lleve a cabo un mercadeo para obtener los salarios base en el lugar donde habrá de ejecutarse la obra al momento de presupuestar.

Tabla 3.4 Cálculo del factor de salario real.

No.	Categoría	Salarios resto del país	Factor veces S mín.	Salario Base	Salario base de cotización	Enfermedades y maternidad				Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Retiro	Cesantía y vejez	Guarderías	Infonavit	SUMA	ps	Tp/Ti	psTp/Ti	Fsr	Salario Real
						Especie	Dinero	Cuota fija	Cuota variable												
						1.05%	0.70%	20.40%	1.10%												
	Peón (mínimo)	\$ 141.70	1.0000	\$ 348.92	\$ 364.69	\$ 3.83	\$ 2.55	\$ 18.28	\$ 1.05	\$ 27.68	\$ 6.38	\$ 7.29	\$ 11.49	\$ 3.65	\$ 18.23	\$ 100.44	0.2754	1.3118	0.3613	1.6730	\$ 583.75
1	Albañilería, oficial de	\$ 163.46	1.1536	\$ 402.50	\$ 420.70	\$ 4.42	\$ 2.94	\$ 18.28	\$ 1.67	\$ 31.93	\$ 7.36	\$ 8.41	\$ 13.25	\$ 4.21	\$ 21.03	\$ 113.51	0.2698	1.3118	0.3539	1.6657	\$ 670.44
3	Bulldozer y/o traxcavo, operador de	\$ 171.24	1.2085	\$ 421.66	\$ 440.72	\$ 4.63	\$ 3.09	\$ 18.28	\$ 1.89	\$ 33.45	\$ 7.71	\$ 8.81	\$ 13.88	\$ 4.41	\$ 22.04	\$ 118.18	0.2682	1.3118	0.3518	1.6635	\$ 701.44
6	Carpintero de obra negra	\$ 163.46	1.1536	\$ 402.50	\$ 420.70	\$ 4.42	\$ 2.94	\$ 18.28	\$ 1.67	\$ 31.93	\$ 7.36	\$ 8.41	\$ 13.25	\$ 4.21	\$ 21.03	\$ 113.51	0.2698	1.3118	0.3539	1.6657	\$ 670.44
7	Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$ 160.77	1.1346	\$ 395.88	\$ 413.77	\$ 4.34	\$ 2.90	\$ 18.28	\$ 1.59	\$ 31.40	\$ 7.24	\$ 8.28	\$ 13.03	\$ 4.14	\$ 20.69	\$ 111.89	0.2704	1.3118	0.3547	1.6665	\$ 659.73
10	Colocador de mosaicos y azulejos, oficial	\$ 160.20	1.1306	\$ 394.47	\$ 412.30	\$ 4.33	\$ 2.89	\$ 18.28	\$ 1.58	\$ 31.29	\$ 7.22	\$ 8.25	\$ 12.99	\$ 4.12	\$ 20.62	\$ 111.55	0.2706	1.3118	0.3549	1.6667	\$ 657.46
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero en	\$ 152.56	1.0766	\$ 375.66	\$ 392.64	\$ 4.12	\$ 2.75	\$ 18.28	\$ 1.36	\$ 29.80	\$ 6.87	\$ 7.85	\$ 12.37	\$ 3.93	\$ 19.63	\$ 106.96	0.2724	1.3118	0.3573	1.6691	\$ 627.02
16	Chofer de camión de carga en general	\$ 166.82	1.1773	\$ 410.77	\$ 429.34	\$ 4.51	\$ 3.01	\$ 18.28	\$ 1.77	\$ 32.58	\$ 7.51	\$ 8.59	\$ 13.52	\$ 4.29	\$ 21.47	\$ 115.53	0.2691	1.3118	0.3530	1.6647	\$ 683.83
17	Chofer de camioneta de carga en general	\$ 162.09	1.1439	\$ 399.13	\$ 417.17	\$ 4.38	\$ 2.92	\$ 18.28	\$ 1.63	\$ 31.66	\$ 7.30	\$ 8.34	\$ 13.14	\$ 4.17	\$ 20.86	\$ 112.69	0.2701	1.3118	0.3543	1.6661	\$ 664.98
18	Chofer operador de vehículos con grúa	\$ 155.92	1.1004	\$ 383.93	\$ 401.29	\$ 4.21	\$ 2.81	\$ 18.28	\$ 1.46	\$ 30.45	\$ 7.02	\$ 8.03	\$ 12.64	\$ 4.01	\$ 20.06	\$ 108.98	0.2716	1.3118	0.3562	1.6680	\$ 640.40
19	Draga, operador de	\$ 172.82	1.2196	\$ 425.55	\$ 444.78	\$ 4.67	\$ 3.11	\$ 18.28	\$ 1.94	\$ 33.75	\$ 7.78	\$ 8.90	\$ 14.01	\$ 4.45	\$ 22.24	\$ 119.13	0.2678	1.3118	0.3513	1.6631	\$ 707.73
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$ 163.09	1.1510	\$ 401.59	\$ 419.74	\$ 4.41	\$ 2.94	\$ 18.28	\$ 1.66	\$ 31.85	\$ 7.35	\$ 8.39	\$ 13.22	\$ 4.20	\$ 20.99	\$ 113.29	0.2699	1.3118	0.3540	1.6658	\$ 668.97
21	Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial	\$ 160.20	1.1306	\$ 394.47	\$ 412.30	\$ 4.33	\$ 2.89	\$ 18.28	\$ 1.58	\$ 31.29	\$ 7.22	\$ 8.25	\$ 12.99	\$ 4.12	\$ 20.62	\$ 111.55	0.2706	1.3118	0.3549	1.6667	\$ 657.46
25	Encargado de bodega y/o almacén	\$ 149.21	1.0530	\$ 367.41	\$ 384.02	\$ 4.03	\$ 2.69	\$ 18.28	\$ 1.27	\$ 29.14	\$ 6.72	\$ 7.68	\$ 12.10	\$ 3.84	\$ 19.20	\$ 104.95	0.2733	1.3118	0.3585	1.6703	\$ 613.67
29	Herrería, oficial de	\$ 213.39	1.5059	\$ 525.45	\$ 549.20	\$ 5.77	\$ 3.84	\$ 18.28	\$ 3.08	\$ 41.68	\$ 9.61	\$ 10.98	\$ 17.30	\$ 5.49	\$ 27.46	\$ 143.50	0.2613	1.3118	0.3428	1.6545	\$ 869.36
39	Pintor de casas, edificios y construcción en general, oficial	\$ 157.06	1.1084	\$ 386.74	\$ 404.22	\$ 4.24	\$ 2.83	\$ 18.28	\$ 1.49	\$ 30.68	\$ 7.07	\$ 8.08	\$ 12.73	\$ 4.04	\$ 20.21	\$ 109.67	0.2713	1.3118	0.3559	1.6676	\$ 644.95
42	Plomero en instalaciones sanitarias, oficial	\$ 157.34	1.1104	\$ 387.43	\$ 404.94	\$ 4.25	\$ 2.83	\$ 18.28	\$ 1.50	\$ 30.73	\$ 7.09	\$ 8.10	\$ 12.76	\$ 4.05	\$ 20.25	\$ 109.83	0.2712	1.3118	0.3558	1.6676	\$ 646.06
52	Soldador con soplete o con arco eléctrico	\$ 161.75	1.1415	\$ 398.29	\$ 416.29	\$ 4.37	\$ 2.91	\$ 18.28	\$ 1.62	\$ 31.59	\$ 7.29	\$ 8.33	\$ 13.11	\$ 4.16	\$ 20.81	\$ 112.48	0.2702	1.3118	0.3544	1.6662	\$ 663.63
59	Velador	\$ 146.79	1.0359	\$ 361.45	\$ 377.79	\$ 3.97	\$ 2.64	\$ 18.28	\$ 1.20	\$ 28.67	\$ 6.61	\$ 7.56	\$ 11.90	\$ 3.78	\$ 18.89	\$ 103.50	0.2740	1.3118	0.3594	1.6711	\$ 604.03
s/n	Ayudante	\$ 149.50	1.0550	\$ 368.13	\$ 384.77	\$ 4.04	\$ 2.69	\$ 18.28	\$ 1.27	\$ 29.20	\$ 6.73	\$ 7.70	\$ 12.12	\$ 3.85	\$ 19.24	\$ 105.12	0.2732	1.3118	0.3584	1.6702	\$ 614.83
s/n	Oficial herrero	\$ 166.75	1.1768	\$ 410.60	\$ 429.16	\$ 4.51	\$ 3.00	\$ 18.28	\$ 1.76	\$ 32.57	\$ 7.51	\$ 8.58	\$ 13.52	\$ 4.29	\$ 21.46	\$ 115.49	0.2691	1.3118	0.3530	1.6648	\$ 683.55
s/n	Cabo	\$ 218.50	1.5420	\$ 538.03	\$ 562.35	\$ 5.90	\$ 3.94	\$ 18.28	\$ 3.23	\$ 42.68	\$ 9.84	\$ 11.25	\$ 17.71	\$ 5.62	\$ 28.12	\$ 146.57	0.2606	1.3118	0.3419	1.6537	\$ 889.72

LEY FEDERAL DEL TRABAJO		
DÍAS PAGADOS	DÍAS DEL AÑO	365.00
	Más:	
	AQUINALDO	5.00
	PRIMA VACACIONAL	150
	TP	38150
DÍAS TRABAJADOS	DÍAS DEL AÑO	365.00
	Menos:	
	7o. DIA	52.00
	VACACIONES	6.00
	POR LEY	7.9
	POR ENFERMEDAD	3.00
	POR COSTUMBRE	4.00
	OTROS	2.00
	TI	290.83
	TP/TI=	1.3118

3.4.4 Cálculo del salario real y tabulador de salarios

Habiendo calculado los factores de salario real, bastará con multiplicarlos por los salarios base para obtener los salarios reales y con ello elaborar el tabulador de mano de obra que habrá de utilizarse para la integración de los costos directos por concepto de mano de obra. La Tabla 3.5 muestra el tabulador correspondiente.

Es importante hacer notar, que el analista de precios unitarios tiene que verificar continuamente, si existen cambios en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en la Ley del INFONAVIT y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que incidan en el cálculo del factor de salario real.

Tabla 3.5 Tabulador de salarios.

No.	Categoría	Salario Base	Factor de salario real	Salario Real
	Peón	\$ 348.92	1.673035	\$ 583.75
1	Albañilería, oficial de	\$ 402.50	1.665697	\$ 670.44
3	Bulldozer y/o traxcavo, operador de	\$ 421.66	1.663526	\$ 701.44
6	Carpintero de obra negra	\$ 402.50	1.665697	\$ 670.44
7	Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$ 395.88	1.666496	\$ 659.73
10	Colocador de mosaicos y azulejos, oficial	\$ 394.47	1.666669	\$ 657.46
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero en	\$ 375.66	1.669111	\$ 627.02
16	Chofer de camión de carga en general	\$ 410.77	1.664734	\$ 683.83
17	Chofer de camioneta de carga en general	\$ 399.13	1.666101	\$ 664.98
18	Chofer operador de vehículos con grúa	\$ 383.93	1.668007	\$ 640.40
19	Draga, operador de	\$ 425.55	1.663109	\$ 707.73
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$ 401.59	1.665805	\$ 668.97
21	Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial	\$ 394.47	1.666669	\$ 657.46
25	Encargado de bodega y/o almacén	\$ 367.41	1.670260	\$ 613.67
30	Herrería, oficial de	\$ 525.45	1.654516	\$ 869.36
39	Pintor de casas, edificios y construcción en general, oficial	\$ 386.74	1.667644	\$ 644.95
51	Plomero en instalaciones sanitarias, oficial	\$ 387.43	1.667555	\$ 646.06
64	Soldador con soplete o con arco eléctrico	\$ 398.29	1.666202	\$ 663.63
71	Velador	\$ 361.45	1.671123	\$ 604.03
s/n	Ayudante	\$ 368.13	1.670159	\$ 614.83
s/n	Oficial fierro	\$ 410.60	1.664754	\$ 683.55
s/n	Cabo	\$ 538.03	1.653660	\$ 889.72

3.4.5 Jornada de trabajo

La LFT establece:

Artículo 58.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo.

Artículo 60.- Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.

Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna.

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

El factor de salario real calculado aplica para cualquiera de los tres tipos de jornada, la duración de esta se verá reflejado en los rendimientos correspondientes.

La LFT contempla el caso de las horas extras:

Artículo 65.- En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males.

Artículo 66.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

Artículo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada.

Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley.

3.4.5.1 Cálculo del factor considerando horas extras:

En caso de considerar horas extras en algún trabajo, es necesario atender a lo que señala la ley y modificar el cálculo del factor de salario real como sigue:

Recordemos que la ley del IMSS señala: *Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:*

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.

Por tanto, la fórmula para calcular el factor de salario real se modifica como sigue:

$$Fsr = ps \frac{Tp}{Tl} + \frac{Tp + Te}{Tl}$$

Donde Te es igual a las horas extras anuales expresadas en jornadas de trabajo.

Si consideramos las 3 horas diarias 3 veces a la semana que permite la LFT, esto equivale a:

$$3 \frac{h}{jor} * 3 \frac{jor}{semana} = 9 \frac{h}{semana} * 2(\text{se pagan al doble}) * 52 \frac{semana}{año} = 936 \frac{h}{año}$$

Esto equivale a: $\frac{936 \frac{jor}{año}}{8 \frac{h}{jor}} = 117 \text{ jornadas}$

Por lo cual $T_p = 365 + 15 + 1.5 + 117 = 498.5$ jornadas

Y para el ejemplo presentado anteriormente, el fasar resulta:

$$Fsr = ps \frac{381.5}{290.83} + \frac{498.5}{290.83}$$

La tabla 3.6 muestra el cálculo del fasar considerando horas extras.

Tabla 3.6 Cálculo del factor de salario real considerando horas extras.

No.	Categoría	Salarios resto del país	Factor veces S min.	Salario Base	Salario base de cotización	Enfermedades y maternidad				Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Retiro	Cesantía y vejez	Guarderías	Infonavit	SUMA	ps	Tp/TI	psTp/TI	Fsr	Salario Real
						Especie	Dinero	Cuota fija	Cuota variable												
						1.05%	0.70%	20.40%	1.10%												
	Peón (mínimo)	\$ 141.70	1.0000	\$ 348.92	\$ 364.69	\$ 3.83	\$ 2.55	\$ 18.28	\$ 1.05	\$ 27.68	\$ 6.38	\$ 7.29	\$ 11.49	\$ 3.65	\$ 18.23	\$ 100.44	0.2754	1.7141	0.3613	2.0753	\$ 724.12
1	Albañilería, oficial de	\$ 163.46	1.1536	\$ 402.50	\$ 420.70	\$ 4.42	\$ 2.94	\$ 18.28	\$ 1.67	\$ 31.93	\$ 7.36	\$ 8.41	\$ 13.25	\$ 4.21	\$ 21.03	\$ 113.51	0.2698	1.7141	0.3539	2.0680	\$ 832.37
3	Bulldozer y/o traxcavo, operador de	\$ 171.24	1.2085	\$ 421.66	\$ 440.72	\$ 4.63	\$ 3.09	\$ 18.28	\$ 1.89	\$ 33.45	\$ 7.71	\$ 8.81	\$ 13.88	\$ 4.41	\$ 22.04	\$ 118.18	0.2682	1.7141	0.3518	2.0658	\$ 871.07
6	Carpintero de obra negra	\$ 163.46	1.1536	\$ 402.50	\$ 420.70	\$ 4.42	\$ 2.94	\$ 18.28	\$ 1.67	\$ 31.93	\$ 7.36	\$ 8.41	\$ 13.25	\$ 4.21	\$ 21.03	\$ 113.51	0.2698	1.7141	0.3539	2.0680	\$ 832.37
7	Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$ 160.77	1.1346	\$ 395.88	\$ 413.77	\$ 4.34	\$ 2.90	\$ 18.28	\$ 1.59	\$ 31.40	\$ 7.24	\$ 8.28	\$ 13.03	\$ 4.14	\$ 20.69	\$ 111.89	0.2704	1.7141	0.3547	2.0688	\$ 818.99
10	Colocador de mosaicos y azulejos, oficial	\$ 160.20	1.1306	\$ 394.47	\$ 412.30	\$ 4.33	\$ 2.89	\$ 18.28	\$ 1.58	\$ 31.29	\$ 7.22	\$ 8.25	\$ 12.99	\$ 4.12	\$ 20.62	\$ 111.55	0.2706	1.7141	0.3549	2.0690	\$ 816.15
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero en	\$ 152.56	1.0766	\$ 375.66	\$ 392.64	\$ 4.12	\$ 2.75	\$ 18.28	\$ 1.36	\$ 29.80	\$ 6.87	\$ 7.85	\$ 12.37	\$ 3.93	\$ 19.63	\$ 106.96	0.2724	1.7141	0.3573	2.0714	\$ 778.15
16	Chofer de camión de carga en general	\$ 166.82	1.1773	\$ 410.77	\$ 429.34	\$ 4.51	\$ 3.01	\$ 18.28	\$ 1.77	\$ 32.58	\$ 7.51	\$ 8.59	\$ 13.52	\$ 4.29	\$ 21.47	\$ 115.53	0.2691	1.7141	0.3530	2.0670	\$ 849.08
17	Chofer de camioneta de carga en general	\$ 162.09	1.1439	\$ 399.13	\$ 417.17	\$ 4.38	\$ 2.92	\$ 18.28	\$ 1.63	\$ 31.66	\$ 7.30	\$ 8.34	\$ 13.14	\$ 4.17	\$ 20.86	\$ 112.69	0.2701	1.7141	0.3543	2.0684	\$ 825.55
18	Chofer operador de vehículos con grúa	\$ 155.92	1.1004	\$ 383.93	\$ 401.29	\$ 4.21	\$ 2.81	\$ 18.28	\$ 1.46	\$ 30.45	\$ 7.02	\$ 8.03	\$ 12.64	\$ 4.01	\$ 20.06	\$ 108.98	0.2716	1.7141	0.3562	2.0703	\$ 794.86
19	Draga, operador de	\$ 172.82	1.2196	\$ 425.55	\$ 444.78	\$ 4.67	\$ 3.11	\$ 18.28	\$ 1.94	\$ 33.75	\$ 7.78	\$ 8.90	\$ 14.01	\$ 4.45	\$ 22.24	\$ 119.13	0.2678	1.7141	0.3513	2.0654	\$ 878.93
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$ 163.09	1.1510	\$ 401.59	\$ 419.74	\$ 4.41	\$ 2.94	\$ 18.28	\$ 1.66	\$ 31.85	\$ 7.35	\$ 8.39	\$ 13.22	\$ 4.20	\$ 20.99	\$ 113.29	0.2699	1.7141	0.3540	2.0681	\$ 830.53
21	Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial	\$ 160.20	1.1306	\$ 394.47	\$ 412.30	\$ 4.33	\$ 2.89	\$ 18.28	\$ 1.58	\$ 31.29	\$ 7.22	\$ 8.25	\$ 12.99	\$ 4.12	\$ 20.62	\$ 111.55	0.2706	1.7141	0.3549	2.0690	\$ 816.15
25	Encargado de bodega y/o almacén	\$ 149.21	1.0530	\$ 367.41	\$ 384.02	\$ 4.03	\$ 2.69	\$ 18.28	\$ 1.27	\$ 29.14	\$ 6.72	\$ 7.68	\$ 12.10	\$ 3.84	\$ 19.20	\$ 104.95	0.2733	1.7141	0.3585	2.0726	\$ 761.48
29	Herrería, oficial de	\$ 213.39	1.5059	\$ 525.45	\$ 549.20	\$ 5.77	\$ 3.84	\$ 18.28	\$ 3.08	\$ 41.68	\$ 9.61	\$ 10.98	\$ 17.30	\$ 5.49	\$ 27.46	\$ 143.50	0.2613	1.7141	0.3428	2.0568	\$ 1,080.74
39	Pintor de casas, edificios y construcción en general, oficial	\$ 157.06	1.1084	\$ 386.74	\$ 404.22	\$ 4.24	\$ 2.83	\$ 18.28	\$ 1.49	\$ 30.68	\$ 7.07	\$ 8.08	\$ 12.73	\$ 4.04	\$ 20.21	\$ 109.67	0.2713	1.7141	0.3559	2.0699	\$ 800.53
42	Plomero en instalaciones sanitarias, oficial	\$ 157.34	1.1104	\$ 387.43	\$ 404.94	\$ 4.25	\$ 2.83	\$ 18.28	\$ 1.50	\$ 30.73	\$ 7.09	\$ 8.10	\$ 12.76	\$ 4.05	\$ 20.25	\$ 109.83	0.2712	1.7141	0.3558	2.0699	\$ 801.92
52	Soldador con soplete o con arco eléctrico	\$ 161.75	1.1415	\$ 398.29	\$ 416.29	\$ 4.37	\$ 2.91	\$ 18.28	\$ 1.62	\$ 31.59	\$ 7.29	\$ 8.33	\$ 13.11	\$ 4.16	\$ 20.81	\$ 112.48	0.2702	1.7141	0.3544	2.0685	\$ 823.86
59	Velador	\$ 146.79	1.0359	\$ 361.45	\$ 377.79	\$ 3.97	\$ 2.64	\$ 18.28	\$ 1.20	\$ 28.67	\$ 6.61	\$ 7.56	\$ 11.90	\$ 3.78	\$ 18.89	\$ 103.50	0.2740	1.7141	0.3594	2.0734	\$ 749.44
s/n	Ayudante	\$ 149.50	1.0550	\$ 368.13	\$ 384.77	\$ 4.04	\$ 2.69	\$ 18.28	\$ 1.27	\$ 29.20	\$ 6.73	\$ 7.70	\$ 12.12	\$ 3.85	\$ 19.24	\$ 105.12	0.2732	1.7141	0.3584	2.0725	\$ 762.92
s/n	Oficial herrero	\$ 166.75	1.1768	\$ 410.60	\$ 429.16	\$ 4.51	\$ 3.00	\$ 18.28	\$ 1.76	\$ 32.57	\$ 7.51	\$ 8.58	\$ 13.52	\$ 4.29	\$ 21.46	\$ 115.49	0.2691	1.7141	0.3530	2.0671	\$ 848.73
s/n	Cabo	\$ 218.50	1.5420	\$ 538.03	\$ 562.35	\$ 5.90	\$ 3.94	\$ 18.28	\$ 3.23	\$ 42.68	\$ 9.84	\$ 11.25	\$ 17.71	\$ 5.62	\$ 28.12	\$ 146.57	0.2606	1.7141	0.3419	2.0560	\$ 1,106.16
		DÍAS DEL AÑO		365.0	DÍAS DEL AÑO		365.00	Horas extras a la semana=		3x3=		9									
		AGUINALDO		15.0	7o. DÍA		52	Horas equivalentes al año=		9x52=		468									
		PRIMA VACACIONAL		1.5	VACACIONES		6	Jornadas equivalentes al año=		468/8=		58.5									
		Tp=		381.5	POR LEY		7.17	Jornadas pagadas al doble=		117											
		Cálculo para jornadas extraordinarias:				COSTUMBRE		3													
		Te=		117.0	ENFERMEDAD		3														
		Tp+Te=		498.5	MAL TIEMPO		3														
		(Tp+Te)/TI=		1.7141	OTROS		0	74.17													
		Tp/tl=		1.3118	TI=		290.83														

3.4.6 Rendimiento de la mano de obra

Se entiende por rendimiento de mano de obra, la producción o cantidad de obra ejecutada por una persona o grupo de personas (cuadrilla) por unidad de tiempo. Generalmente la unidad de tiempo seleccionada es la jornada de trabajo, aunque pueden darse casos en que dicha unidad sea medida por hora.

Para el cálculo de los rendimientos se puede recurrir a:

- Observación directa, registrando las cantidades de obra ejecutadas y el tiempo en que se llevaron a cabo. Es conveniente hacer varias observaciones que sean representativas y evitar que los trabajadores se den cuenta de que están siendo observados ya esto distorsiona el estudio.
- Publicaciones especializadas que de manera estadística han registrado rendimientos promedio de los trabajos más frecuentes. Hay que tomar con reservas esta información ya que, como se mencionó, es para condiciones promedio.
- Un análisis teórico con el apoyo de quienes ejecutarán el trabajo. En ocasiones no hay información de ciertos conceptos de obra poco frecuentes y es necesario hacer una serie de suposiciones para calcular el rendimiento probable en campo.

Por otra parte, conviene mencionar los principales factores que afectan los rendimientos de la mano de obra:

a) Clima,

En condiciones extremas de frío, calor, humedad y otros, el rendimiento estará muy por debajo de los promedios.

b) Capacitación de los trabajadores

La falta de oficio dará como resultado bajos rendimientos. Hay que estar atento a este punto, ya que pudiera atribuirse un bajo rendimiento a un grado de dificultad alto cuando en realidad es debido a la falta de capacitación.

c) Herramienta

La herramienta adecuada en buen estado originará mejores rendimientos.

d) Seguridad

Las condiciones de seguridad que se tengan en la obra influirán en el rendimiento de los trabajadores; una persona que se siente segura se desempeña con mayor eficiencia.

d) Motivación

El reconocimiento a la labor desempeñada sobre todo en el aspecto económico será un aliciente para incrementar el rendimiento.

La Tabla 3.7 muestra algunos rendimientos de mano de obra en trabajos diversos de construcción. Estos rendimientos deben ser analizados para cada caso específico ya que las condiciones en cuanto a grado de dificultad y administración de la obra pueden variar considerablemente.

Tabla 3.7 Ejemplo de rendimientos de mano de obra.

CONCEPTO	CUADRILLA	RENDIMIENTO
Excavación a mano para desplante de estructuras en material "A", en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad medido en banco.	0.10 cabo +1 Peón	3.00 m ³ /jor
Excavación a mano para desplante de estructuras en material "B" en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad medido en banco.	0.10 cabo +1 Peón	1.50 m ³ /jor
Plantilla de concreto simple fabricado en obra de 5 cm de espesor, incluye preparación de la superficie, vaciado del concreto, vibrado, curado y terminado.	1 Oficial Albañil + 1 Ayudante	15 m ³ /jor
Cimbra y descimbra en zapatas de cimentación acabado común.	1 Oficial Carpintero + 1 Ayudante	8 m ³ /jor
Acero de refuerzo, incluye corte, habilitado, armado, ganchos y traslapes (3/8").	1 Oficial Fierro + 1 Ayudante	0.15 ton/jor
Colocación de malla electrosoldada 6-6-10/10	1 Oficial Fierro + 1 Ayudante	50 m ² /jor
Vaciado de concreto en cimentación, incluye vibrado y curado.	1 Oficial Albañil + 1 Ayudante	3 m ³ /jor
Muro de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor juntado con mortero cemento-arena acabado común, hasta 3.00 m de altura.	1 Oficial Albañil + 1 Ayudante	8 m ² /jor
Mampostería de piedra braza de 0.60 m de espesor, juntada con mortero cemento arena.	1 Oficial Albañil + 1 Ayudante	2 m ³ /jor
Aplanado pulido de mezcla en muros.	1 Oficial Albañil + 1 Ayudante	10 m ² /jor
Tirol planchado en muros	1 Oficial Yesero + 1 Ayudante	14 m ² /jor
Colocación de loseta vinílica 2 mm de espesor.	1 Oficial Colocador + 1 Ayudante	20 m ² /jor
Impermeabilización en losas planas a base de primario tapa poro, 2 capas de asfalto, 2 de fibra y acabado de pintura.	1 Oficial Impermeabilizador +1 Ayudante	17 m ² /jor
Demolición a mano de elementos de concreto reforzado en cimentación.	0.10 Cabo + 1 Peón	0.66 m ³ /jor
Instalación y prueba de tubo de cobre tipo M de 19 mm	1 Oficial Plomero + 1 Ayudante	36 m/jor
Instalación y prueba de tubo de cobre tipo M de 25 mm	1 Oficial Plomero + 1 Ayudante	26 m/jor
Instalación y prueba de tubo de cobre tipo M de 32 mm	1 Oficial Plomero + 1 Ayudante	17 m/jor
Instalación y prueba de tubo de cobre tipo M de 38 mm	1 Oficial Plomero + 1 Ayudante	13 m/jor
Instalación y prueba de tubo de cobre tipo M de 51 mm	1 Oficial Plomero + 1 Ayudante	8 m/jor

3.4.7 El IVA en los costos de mano de obra

La remuneración de la mano de obra no incluye traslación del IVA por los trabajadores al empleador; los pagos que éste hace por tal concepto no incluyen, pues, el porcentaje del IVA y en consecuencia éste no debe aparecer en los análisis, ni formar parte de los precios unitarios.

Excepción de lo anterior, es el caso de un subcontrato por servicio de mano de obra, proporcionado por una persona moral como es el ejemplo de un destajista formalmente constituido en Sociedad Anónima o que presta sus servicios con fines empresariales, que factura cumpliendo con todos los requisitos fiscales y debe trasladar el IVA a la empresa a quien prestó el servicio; sin embargo de igual manera que lo mencionado para materiales, este IVA pagado por la empresa no debe incorporarse a los análisis de precios sino que se manejará contablemente en cuentas especiales.

3.5 Ejemplos

3.5.1 Concepto: *Excavación a mano en zanja, material tipo A (suave), a cielo abierto, en seco, medido en banco, incluye afine, traspaleos y extracción a borde de zanja.*

Unidad: m³

Cuadrilla por utilizar:

Cuadrilla de peones: 0.10 Cabo + 1 peón

Costo de la cuadrilla:

Categoría	Unidad	Cantidad	Salario Real	Importe
Peón	Jor	1.00	\$ 583.72	\$ 583.72
Cabo	Jor	0.10	\$ 889.72	\$ 88.97
Total por jornada				\$ 672.69



Rendimiento:

Como se verá más adelante, el rendimiento puede ser obtenido de la experiencia, tablas, gráficas y manuales, así como del análisis del ciclo de trabajo, éste último se utiliza en el ejemplo.

Capacidad de una pala: 3.0 a 3.5 litros, dependiendo del ángulo de reposo del material (usaremos 3.00 litros = 0.003 m³). Ciclo por palada= 6 seg.

Número de horas efectivas por día: 8 h x 3,600 seg / h = 28,800 seg.

Eficiencia: 50%

Coefficiente de abundamiento del material: 1.20

$$\frac{\text{Rend efectivo}}{\text{jornada}} = \frac{28,800}{6} \times \frac{0.50}{1.20} \times 0.003 = 6 \frac{\text{m}^3}{\text{dia}}$$

(En la práctica este volumen oscila entre 3.00 y 6.00 m³).

Aplicando el rendimiento anterior al salario diario de la cuadrilla se obtiene:

$$\frac{\text{Mano de obra excavación}}{\text{m}^3} = \frac{\$672.69}{6.00} = \$112.12$$

Nota:

El coeficiente de abundamiento del material es utilizado para transformar la unidad de material medido en banco (m³_{banco}) a material medido suelto (m³_{suelto}).

3.5.2 Concepto: *Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, incluye alambre recocido para amarres, traslapes, ganchos, bayonetas, columpios, desperdicios, retiro del material sobrante, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.*

Unidad: ton

Cuadrilla por utilizar:

Cuadrilla de fierros: 1 oficial fierro+1 ayudante+0.20 cabo

Costo de la cuadrilla:

Categoría	Unidad	Cantidad	Salario Real	Importe
Oficial fierro	Jor	1.00	\$ 682.55	\$ 682.55
Ayudante fierro	Jor	1.00	\$ 614.83	\$ 614.83
Cabo	Jor	0.20	\$ 889.72	\$ 177.94
Total por jornada				\$ 1,475.32



Rendimiento:

Se determina por experiencias anteriores, depende de los diámetros de varilla que se habiliten y del sitio y facilidades de trabajo.

El personal supuesto habilita y coloca entre 0.150 y 0.200 toneladas de acero por turno de trabajo. Consideraremos para el presente análisis un rendimiento de 0.200 toneladas por jornada.

Aplicando el rendimiento anterior al salario diario de la cuadrilla se obtiene:

$$\frac{\text{Mano de obra habilitado de acero}}{\text{ton}} = \frac{\$1,475.32}{0.2} = \$7,376.60$$

3.5.3 Concepto: *Cimbra y descimbra en losas, acabado aparente, incluye obra falsa, y contraventeos, clavos, alambre recocido, desmoldante, chaflanes, goteros y todo lo necesario para su correcta ejecución.*

Unidad: m²

Cuadrilla por utilizar:

Cuadrilla de carpinteros: 1 oficial carpintero+1 ayudante+0.20 cabo

Costo de la cuadrilla:

Categoría	Unidad	Cantidad	Salario Real	Importe
Oficial carpintero	Jor	1.00	\$ 670.44	\$ 670.44
Ayudante carpintero	Jor	1.00	\$ 614.83	\$ 614.83
Cabo	Jor	0.20	\$ 889.72	\$ 177.94
Total por jornada				\$ 1,463.21



Rendimiento:

En este concepto, los factores que inciden principalmente en el costo son el tipo de acabado, la altura de colocación de la cimbra y la altura de entrepiso.

Rendimiento en cimbrado:

Este personal tiene un rendimiento promedio de 8.0 m² / día, (oscila entre 6.0 m² y 10.0 m² por turno de trabajo).

$$\text{Cimbrado por m}^2 \text{ de contacto} = \frac{\$1,463.21}{8} = \$182.90$$

Rendimiento en descimbrado:

Varía entre 40.0 y 60.0 m² / día, usaremos 50 m².

$$\text{Descimbrado por m}^2 \text{ de contacto} = \frac{\$1,463.21}{50} = \$29.26$$

Sumando:

Costo de Mano de Obra por concepto de cimbra y descimbra en losas por metro cuadrado acabado común = \$ 182.90 + \$29.26= **\$212.16**

NOTA

Algunas de las operaciones aritméticas se han efectuado en Excel por lo que, a lo largo de los ejemplos, puede haber pequeños errores en la aproximación.

Capítulo 4

Maquinaria

4.1 Generalidades

La maquinaria es un insumo de considerable valor en la ejecución de trabajos de construcción. Mediante su utilización se minimiza el esfuerzo físico de los trabajadores, se logra mayor producción y mejor calidad en los trabajos ejecutados.

Los avances tecnológicos están presentes en los modernos equipos de construcción, algunos de los cuales pueden ser equipados con sistemas GPS y aditamentos que permiten mayor precisión a la vez que permiten monitorear los volúmenes de obra trabajados. Hoy en día es posible operar algunos equipos a control remoto, lo que resulta particularmente útil en trabajos con condiciones peligrosas.

La tendencia en los últimos años es el diseño de máquinas con capacidades cada vez más grandes, multifuncionales y con componentes que faciliten su mantenimiento o su fácil reposición de ser necesario.

Otro aspecto relevante, es la utilización de medios inmersivos para capacitar a los operadores de las máquinas: ya no se manejan mediante pedales, volantes y palancas, sino con mecanismos digitales asociados a computadoras.

Desde la etapa de planeación, el ingeniero deberá tomar en cuenta el equipo más adecuado para la realización de los trabajos, para así poder ejecutar la obra de la manera más conveniente. Deberá realizar un estudio cuidadoso, a fin de determinar cuál es el equipo o maquinaria (de la gran variedad existente en el mercado nacional e internacional: diferentes marcas, modelos, capacidades y especificaciones) que ofrece los mejores resultados.

Son muchos los aspectos a considerar sobre la maquinaria, en este capítulo se abordarán los temas relacionados con sus costos y sus rendimientos.

4.2 Clasificación de la maquinaria

Para poder tener un control adecuado de la maquinaria y equipo de construcción dado que es un activo muy importante para cualquier empresa o dependencia gubernamental es conveniente clasificarlo, sobre todo cuando se cuenta con una buena cantidad de máquinas: asignarle un número económico y los datos que sean necesarios para tenerlas perfectamente identificadas.

En estos apuntes se usarán indistintamente las palabras maquinaria o equipo para referirse a este importante insumo de la construcción.

Existen varias formas de clasificar el equipo de construcción, siendo algunas de ellas las siguientes:

- Por su uso o función específica

Equipo para movimiento de tierras: Tractores, motoescrepas, cargadores frontales, camiones volteo, fuera de carretera y articulados, vagonetas, retroexcavadoras.

Equipo para pavimentación: Petrolizadoras, colocadoras de pavimento (finisher), compactadores vibratorios, de neumáticos, de reja y de rodillos, fresadoras, etc.

Equipo para producción de agregados: Equipos de perforación, trituradoras de quijadas, de rodillos, de conos, de martillos, cribas, bandas transportadoras, alimentadores, lavadoras de material, molinos.

- Por la especialidad de construcción

Equipo para:
Edificación
Construcción pesada
Obras hidráulicas
Dragados
Construcción de túneles
Cimentaciones profundas

- Por su estatus dentro de la empresa o entidad

Maquinas:
Propias
Rentadas
Rentadas con opción a compra
En arrendamiento financiero

- Por su tamaño

Equipo:
Ligero
Pesado

Considerando que la clasificación en equipo ligero y equipo pesado es la más práctica por razones de tipo didáctico, a continuación, se enlistan algunos de los equipos más comunes:

EQUIPO LIGERO

Bombas para concreto	Dobladoras de varilla	Soldadoras
Compactadores manuales	Malacates	Vibradores para concreto
Cortadoras	Revolvedoras	

EQUIPO PESADO

Tractores, equipados con: hoja recta (bulldozer), semiuniversal, universal, angulable (angledozer), amortiguada (tractor empujador), desgarrador, Ripper o arado, pluma lateral (tiendetubos).

Cargadores: descarga frontal, lateral o trasera.

Excavadoras: palas mecánicas, palas hidráulicas, dragas, retroexcavadora, “scooper”

Motoescrepas: estándar, autocargables, doble motor, con aditamento para tiro y empuje.

Compactadores: De tres rodillos, en tándem, rodillo liso vibratorio, rodillo pata de cabra, rodillo de reja, de neumáticos, duopactor.

Trituradoras: de quijadas, conos, impacto, rodillos, molinos.

Equipo complementario: alimentadores, cribas, tolvas, bandas transportadoras.

Equipo para excavación de túneles: Escudos, topes, jumbos de barrenación, contrapoceras.

Plantas: de concreto hidráulico, de concreto asfáltico

Finishers o terminadoras	Motoconformadoras	Petrolizadoras
Camiones tanque o pipas	Camiones volteo	Vagonetas
Camiones fuera de carretera	Dumptors	Zanjadoras
Afinadoras	Barredoras	Track drills
Wagon drills	Compresores de aire	

4.3 Costo horario

La práctica de muchos años ha enseñado la conveniencia de estructurar todos los costos sobre la base del costo por hora efectiva de las máquinas y demás elementos que concurren a la ejecución de un trabajo y, a su vez, expresar los rendimientos siempre en función de cada hora de trabajo.

Conforme al artículo 194 del RLOPSRM, el costo horario por equipo es el que *se deriva del uso correcto de las máquinas adecuadas y necesarias para la ejecución de los conceptos de trabajo, conforme a lo estipulado en las especificaciones y en el contrato.*

El costo horario se integra mediante los cargos que se muestran en la figura 4.1.

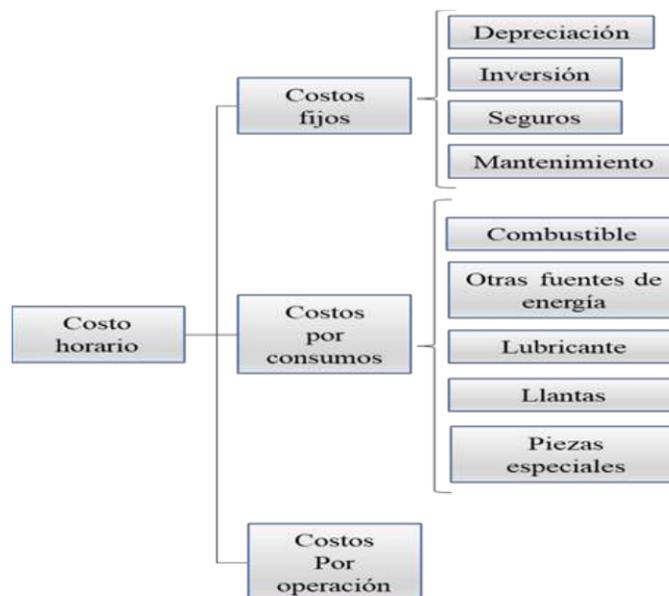


Figura 4.1 Elementos que integran el costo horario del equipo de construcción.

4.3.1 Costos fijos

4.3.1.1 Depreciación

Artículo 196.- El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará que la depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión:

$$D = \frac{Vm - Vr}{Ve}$$

Donde:

“D” Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.

“Vm” Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.

“Vr” Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al término de su vida económica.

“Ve” Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Se hacen a continuación algunas consideraciones sobre los aspectos de vida económica, vida útil y valor de rescate.


Cabe hacer notar que el artículo 35, fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el diario oficial de la federación el 11 de diciembre de 2013, última reforma publicada en el DOF 09-12-2019, señala que para la deducción de inversión en maquinaria y equipo se aplicará como máximo el 25% en la industria de la construcción.

- Valor inicial de la máquina

Este valor se obtiene de cotizaciones con los distribuidores de maquinaria y equipo.

En ocasiones, no se tiene la facilidad de cotizar de inmediato el precio de una máquina nueva para conocer el valor de Vm, una alternativa es inferirlo a partir de la siguiente consideración:

Sea la gráfica:

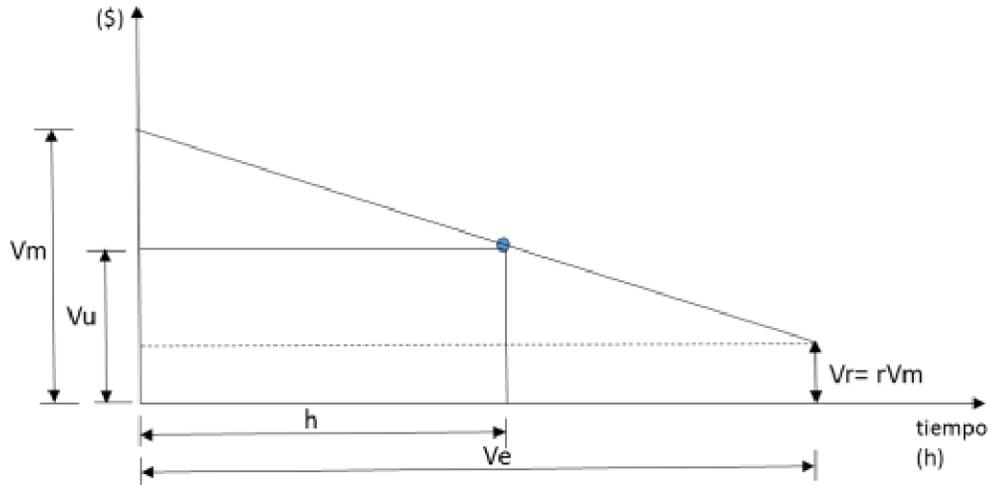

En la cual:

V_m , es el valor de la máquina nueva que se desea obtener;

V_u , es el valor de la máquina usada investigado en el mercado;

h , es el número de horas de uso de la máquina usada;

V_e , es la vida económica en horas, estimada para la máquina en análisis;

V_r , es el valor de rescate esperado para la máquina nueva;

r , es el porcentaje, expresado en forma decimal, que se aplicará a V_m , para obtener el valor de rescate esperado por la máquina nueva.

Entonces, por triángulos semejantes:

$$\frac{V_m - rV_m}{V_e} = \frac{V_u - rV_m}{V_e - h}$$

Desarrollando, se obtiene:

$$V_m = \frac{V_e V_u}{V_e - h + rh}$$

Como se puede apreciar, el valor de V_m , conocidos los valores de V_u y de h , investigados en el mercado, dependerá de la V_e y del valor de rescate que se supongan.

Ejemplo:

Sea una máquina con 6000 horas de uso, cuyo valor en el mercado se ha investigado en \$2'000,000.

Supongamos que se considera que la máquina en cuestión tendrá una vida económica de 10,000 horas y un 10% de su valor como máquina nueva, como valor de rescate.

Esto es:

$h = 6,000$ horas

$V_u = \$2'000,000$
 $V_e = 10,000$ horas
 $V_r = 0.20V_m$

Sustituyendo estos valores en la fórmula encontrada se tiene:

$$V_m = \frac{10,000 \times 2'000,000}{10,000 - 6,000 + 1200} = \$3'846,154$$

Si, por ejemplo, el valor de rescate considerado fuera del 10% de V_m , entonces:

$$V_m = \frac{10,000 \times 2'000,000}{10,000 - 6,000 + 600} = \$4'347,826$$

Lo cual es lógico, porque a la máquina nueva se le está considerando un ritmo lineal de depreciación mayor para que a las 6,000 horas que tiene de uso, llegue al valor de los 2 millones de pesos que tiene en el mercado.

Para aplicar el criterio descrito, el valor de la máquina usada, asociado a un número de horas de uso, puede hallarse como un promedio, después de llevar a cabo un estudio de mercado.

- **Vida económica**

Se entiende por vida económica de una máquina (V_e), el período durante el cual tenerla en posesión resulta rentable, esto es, se puede operar en forma eficiente, realizando un trabajo económico, satisfactorio y oportuno.

Toda máquina, a partir del momento en que empieza a ser utilizada, va sufriendo un deterioro constante, por lo que, para conservarla en condiciones de funcionamiento satisfactorio, requiere de erogaciones destinadas a darle mantenimiento.

A medida que aumentan las horas de uso de la máquina, su productividad tiende a disminuir y los costos de operación van en constante aumento como consecuencia de los gastos cada vez mayores de conservación y mantenimiento, así como por las averías cada vez más frecuentes que sufre, lo que acrecienta sus tiempos muertos o improductivos, reduciendo su disponibilidad.

Esta situación llega incluso a afectar la productividad de otras máquinas que se encuentran abasteciendo a la primera o trabajando juntamente con ella en la ejecución de un trabajo.

Como se observa en la figura 4.2, un adecuado mantenimiento alarga la vida económica de las máquinas

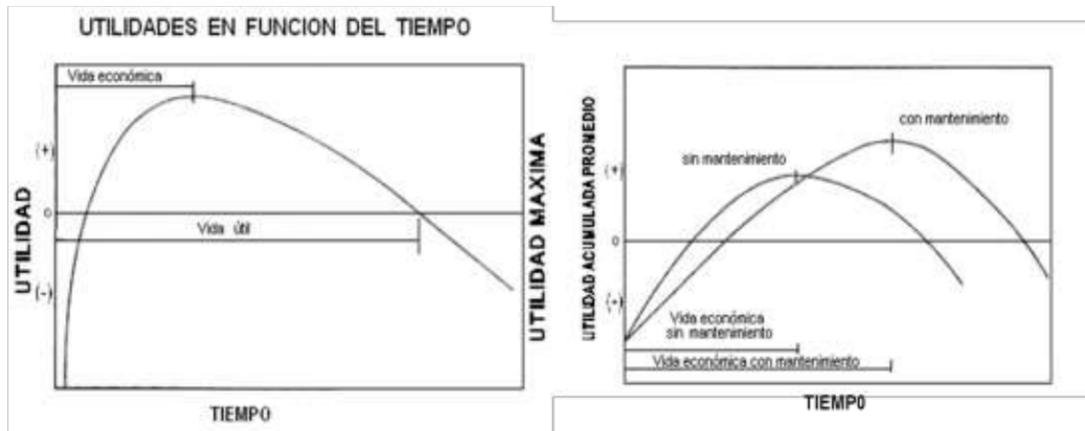


Figura 4.2 Influencia del mantenimiento en la vida económica y útil del equipo de construcción.

De la observación de registros cuidadosos y detallados de los costos de operación y mantenimiento de una máquina, se determina que, después de cierto período, cuando los costos por hora de operación son cada vez mayores que el promedio de costos obtenidos durante sus años anteriores de operación, la máquina habrá llegado al fin de su vida económica. A partir de ahí, aunque la máquina todavía es útil, su operación resultará antieconómica.

Al finalizar el período de vida económica de una máquina se pueden presentar tres alternativas:

- 1.- Que por su patente estado de deterioro, la máquina sin duda deba ser desechada, debiéndose vender para obtener algún valor por ella, ya que, sea cual fuere su estado de deterioro, siempre tendrá un valor de rescate, por ínfimo que este pueda ser.
- 2.- Que, por el esmero puesto en su cuidado y operación, la máquina se encuentre en condiciones aceptables y capaz de continuar trabajando, aunque sujeta a ciertas limitaciones, especialmente en lo que respecta a su eficiencia, productividad y operación económica. Indudablemente, se encontrará en condiciones desventajosas con respecto al equipo de los competidores en el área. Además, con su empleo, se correrán riesgos derivados e imprevisibles: súbitas averías que eventualmente podrían ocurrir y forzar su inhabilitación temporal. Podría darse el caso de que la forzada inactividad de la máquina afectara la productividad de todo un conjunto donde se encontrara trabajando en la ejecución de un trabajo.
- 3.- Que, por razones de orden presupuestal o financiero, el poseedor de la máquina, independientemente del estado de esta, se encuentre en imposibilidad de sustituirla por lo que, aún a costa de sus utilidades, se vea en la necesidad de continuar empleando la máquina obsoleta. De proceder así, se estará alargando la vida de la máquina más allá del término de su vida económica.

En síntesis, la llamada vida económica de las máquinas es un periodo durante el cual se deben obtener los máximos beneficios en su operación. El equipo puede continuar trabajando por más tiempo, aunque las utilidades tenderán a disminuir, siguiendo, sin embargo, dentro de su vida útil. De esta manera la fecha de terminación de la vida económica es elástica en función de la política del nivel de utilidades que se fije el dueño.

Se entiende que una máquina ya es económicamente obsoleta cuando ha alcanzado el término de su vida económica, quedando además totalmente amortizada la inversión del capital empleado en su adquisición.

Sin embargo, el concepto de obsolescencia es relativo, ya que puede suceder que mientras para un constructor cierto equipo resulta obsoleto, para otro, en distintas condiciones financieras y de trabajo, no lo es.

Criterios para la determinación de la vida económica.

Existen varios criterios fundados en especulaciones más o menos sólidas, destinados a la determinación de la vida económica de una máquina.

El criterio de determinación más empleado es el estadístico, siendo en nuestro medio las estadísticas norteamericanas las más comúnmente aceptadas, debido fundamentalmente a que los manuales que contienen recomendaciones en este tema provienen primordialmente de nuestro vecino del norte.

Sin embargo, no debemos olvidar que en nuestro país se presentan factores de orden económico, social y cultural, que influyen profundamente en la eficiencia, número y economía de los trabajos de construcción en general, y que difieren en mucho a los factores determinantes de las vidas económicas de los equipos en el medio norteamericano; tales factores han hecho que los constructores mexicanos sigan prácticas tendientes a crear estadísticas más fieles de nuestra realidad.

Los estudios sobre la determinación de la vida económica señalan que, en épocas inflacionarias, la vida económica de las máquinas tiende a alargarse, a través desde luego, de un mantenimiento adecuado y un control riguroso de su operación.

La tabla 4.1 muestra la vida económica en horas de algunos de los equipos usuales de construcción de la marca Caterpillar.

Tabla 4.1.- Vida económica de algunos equipos de construcción marca Caterpillar.

MÁQUINA	USO MODERADO	USO MEDIO	USO SEVERO
TRACTORES SOBRE ORUGAS			
70 a 230 HP	12000	10000	8000
285 a 770 HP	22000	18000	15000
MOTOCONFORMADORAS	20000	15000	12000
EXCAVADORAS			
	15000	12000	
	20000	18000	10000
	N/A	18000	15000
MOTOESCREPAS	22000	17000	12000
CAMIONES ARTICULADOS	15000	10000	8000
CARGADORES FRONTALES SOBRE RUEDAS			
910-966	12000	10000	8000
960-970	12000	10000	
980-992	15000	12000	10000
994	60000	50000	40000
CARGADORES FRONTALES SOBRE ORUGAS			
933-939	8000	6000	
953	10000	8000	6000
963-973	12000	10000	8000

Fuente: Manual de rendimientos Caterpillar, Ed. 39.

- **Vida útil**

En toda maquinaria, tanto durante los tiempos de utilización, como durante los periodos en que se encuentra ociosa, sus diversas partes y mecanismos van sufriendo desgastes y deméritos, por lo que, con

cierta frecuencia, más o menos determinada y predecible, dichas partes deben ser reparadas o sustituidas para que la máquina esté constantemente habilitada para trabajar y producir con eficiencia y economía.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, irremediamente toda máquina llega a encontrarse en un estado tal de desgaste y deterioro, que su posesión y trabajo en vez de constituir un bien de producción, significan un gravamen para el propietario, lo cual ocurre cuando los gastos que se requieren para que la máquina produzca, exceden a los rendimientos económicos obtenidos. En otras palabras, la posesión y operación de tal máquina reportan pérdidas económicas y/o riesgos irracionales.

Bajo esta perspectiva, entendemos por vida útil de una máquina, el lapso durante el cual está aún en condiciones de realizar trabajo, pero los gastos de su posesión exceden el rendimiento económico obtenido.

Ya se mencionó como razón de seguir operando una máquina en este rango, que el propietario no tenga los recursos económicos para reemplazarla o que no tenga garantizada la continuidad en el trabajo.

- **Valor de rescate**

Se entiende por valor de rescate de una máquina (V_r), el valor comercial que tiene al final de su vida económica. Toda máquina usada, aún en el caso de que sólo amerite considerársele como chatarra, tiene siempre un cierto valor de rescate. Se acostumbra considerar el valor de rescate como un porcentaje que puede variar entre 5% y 20% sobre el valor de adquisición de la máquina nueva en el mercado. El valor del porcentaje dependerá de las condiciones físicas en que se encuentre la máquina al ser vendida y de las condiciones de mercado, ya que hay máquinas más comerciales que otras. En cualquier caso, el valor de rescate es algo relacionado con el futuro y tiene por tanto cierto grado de incertidumbre.

Existe también el criterio de considerar que, al finalizar el período de su vida económica, el equipo estará totalmente depreciado por lo que se le puede considerar entonces nulo su valor de rescate. Este criterio ocasionará un costo mayor de depreciación del equipo

4.3.1.2 Inversión

Cualquier organización, para comprar una máquina, adquiere los fondos necesarios en los bancos o mercados de capitales, pagando por ellos los intereses correspondientes, o bien, si el empresario dispone de fondos suficientes de capital propio, hace la inversión directamente, esperando que la máquina le reditue en proporción con la inversión no amortizada en cada momento. En síntesis, se puede decir, que el cargo por inversión es el cargo equivalente a los intereses correspondientes al capital invertido en maquinaria.

El RLOPSRM señala:

Artículo 197.- El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica y se obtiene con la siguiente expresión:

$$I = \frac{(V_m + V_r)i}{2Hea}$$

Donde:

“Im” Representa el costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción considerado como nuevo.

“Vm” y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.

“Hea” Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

“i” Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés “i”, debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

El considerar que el capital que se recupera vía depreciación, sumado a la reserva por concepto de mantenimiento puede producir intereses al invertirse en una entidad bancaria o dentro de la propia empresa propietaria del equipo, hace que la tasa de interés a considerar en el cargo por inversión pueda tener valores menores a la tasa anual vigente para el otorgamiento de préstamos de capital.

Por otra parte, el considerar que el incremento de precios es mayor a los intereses que pudiera producir el capital recuperado que se invierte, lleva a proponer una tasa de interés con valores altos.

Por tal motivo, el RLOPSR establece que, para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés “i”, debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga.

NOTA: Lo relativo al indicador económico que se señala en el artículo 197 del RLOPSRM, se estudia en el tema referente al costo de financiamiento.

4.3.1.3 Seguros

Con relación a este costo, el RLOPSRM señala:

Artículo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresión:

$$S = \frac{(Vm + Vr)s}{2Hea}$$

Donde:

“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.

“Vm” y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.

“s” Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo y expresada en fracción decimal.

“Hea” Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

Para el análisis del costo horario por seguros, los contratistas considerarán la prima anual promedio de seguros.

De acuerdo con la cobertura que se contrate, la prima anual puede considerarse entre un 2 y un 5 % del valor de adquisición de la máquina.

4.3.1.4 Mantenimiento

Se entiende por mantenimiento, todas aquellas acciones tendientes a lograr que las máquinas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, para ello se requieren materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipo.

Con relación a este costo, el RLOPSRM señala:

Artículo 199.- El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.

Para los efectos de este artículo se entenderá por:

- I. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y*
- II. Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.*

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresión:

$$Mn = Ko * D$$

Donde:

“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.

“Ko” Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo y se fija con base en la experiencia estadística que se tenga en la industria de la construcción.

“D” Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 196 de este Reglamento.

4.3.2 Costos por consumos

Las máquinas empleadas en la construcción de las obras generalmente son accionadas por motores de combustión interna, bien sean a gasolina o diesel. Para que las máquinas puedan operar, se requiere del constante abastecimiento de los combustibles y lubricantes consumidos por las mismas.

Sabido es que el consumo de combustible de una máquina de combustión interna es proporcional a la potencia empleada, misma que a su vez es función del tipo y condiciones del trabajo que desarrolla. Generalmente, el equipo opera utilizando sólo una fracción de su potencia nominal total. Por ejemplo, un camión cargado requiere más potencia que el mismo camión transitando en las mismas condiciones, pero vacío.

De igual manera, toda máquina al operar en condiciones normales solamente necesita un porcentaje de su potencia nominal, máxima o intermitente.

La altura con respecto al nivel del mar y la temperatura son dos condiciones que afectan el consumo de combustible en las máquinas de combustión interna, ya que influyen en la potencia útil del motor.

El artículo 200 del RLOPSRM indica que: *“Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas”.*

4.3.2.1 Combustible

Con relación al combustible que utilizan las máquinas, el RLOPSRM establece:

Artículo 201.- El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Co = Gh * Pc$$

Donde:

“Co” Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.

“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia que se tenga en la industria de la construcción, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.

“Pc” Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.

En la expresión $Co = Gh * Pc$, se indica que Gh se obtiene en función de:

- Potencia nominal del motor: Esta potencia es una característica del motor con que vienen equipadas las máquinas, se denomina expresamente como tal. El fabricante puede referirse

adicionalmente otras potencias como potencia bruta, potencia en el volante, potencia en la barra de tiro, etc. Se expresa en kilovatios o caballos de fuerza, Kw o HP. Por ejemplo, en las especificaciones del Tractor D8 de Caterpillar se especifica que la potencia es de 231Kw/310HP. (1Kw=1.341HP), 1HP = 33,000 lb-ft/min.

- Factor de operación de la máquina: Se refiere a que los motores operan con un parte de su potencia, lo cual depende del trabajo que estén ejecutando. Un tractor que excava y empuja material suave en un terreno plano, ocupa menos potencia que cuando desgarrar roca con la utilización del ripper.

El manual de rendimientos Caterpillar, proporciona una guía para obtener el consumo horario de combustible para diferentes condiciones de trabajo y el factor de operación al que denominan factor de carga. Ver tabla 4.2

Tabla 4.2 Consumo de combustible y factores de carga para diferentes condiciones de trabajo.

FUEL CONSUMPTION TABLES & LOAD FACTOR GUIDES						
TRACK-TYPE TRACTORS						
Model	Low		Medium		High	
	liter	U.S. gal	liter	U.S. gal	liter	U.S. gal
D3G	9.0-11.0	2.5-3.0	11.0-13.0	3.0-3.5	13.0-15.0	3.5-4.0
D4G	9.0-11.0	2.5-3.0	11.0-13.0	3.0-3.5	13.0-15.0	3.5-4.0
D5G	11.0-13.0	3.0-3.5	13.0-15.0	3.5-4.0	15.0-17.0	4.0-4.5
D5N	6.5-11.5	1.5-3.5	11.5-16.0	3.5-4.5	13.75-18.5	3.75-5.0
D6N	12.0-16.5	3.0-4.5	13.75-21.5	4.0-5.5	18.5-26.5	5.0-7.0
D6G	12.0-17.0	3.5-4.5	17.0-22.0	4.5-6.0	22.0-27.5	6.0-7.5
D6R Series III (136 kW/185 hp)	13.6-19.7	3.6-5.2	19.7-25.7	5.2-6.8	25.7-31.4	6.8-8.3
D6R Series III (149 kW/200 hp)	15.5-22.3	4.1-5.9	22.3-29.1	5.9-7.7	29.1-35.6	7.7-9.4
D7G	16.0-22.5	4.5-6.0	22.5-29.0	6.0-8.0	29.0-35.5	8.0-9.5
D7R Series II	17.0-24.6	4.5-6.5	24.6-32.2	6.5-8.5	32.2-39.7	8.5-10.5
D8R/D8R Series II	22.5-32.0	6.0-8.5	32.0-41.5	8.5-11.0	41.5-51.0	11.0-13.5
D8T	23.5-33.7	6.2-8.9	33.7-43.5	8.9-11.5	43.9-53.7	11.6-14.2
D9T	30.3-43.1	8.0-11.4	43.1-56.4	11.4-14.9	56.4-69.3	14.9-18.3
D10T	42.8-60.1	11.3-16.1	60.1-79.5	16.1-21.0	79.5-97.7	21.0-25.8
D11R	61.0-87.0	16.5-23.0	87.0-113.0	23.0-30.0	113.0-139.5	30.0-37.0

*D7G fuel consumption data is based on a precombustion chamber equipped engine. Fuel consumption for a direct injection equipped D7G should be approximately 10% less.

Typical Application Description
(relative to work application)
Low Pulling scrapers, most agricultural drawbar, stockpile, coal pile applications. No impact. Intermittent full throttle operation.
Medium Production dozing in clays, sands, gravels. Push loading scrapers, borrow pit ripping, most land clearing applications. Medium impact conditions. Production landfill work.
High Heavy rock ripping. Push loading and dozing in hard rock. Working on rock surfaces. Continuous high impact conditions.

Load Factor Guide
(average engine load factor based on application description for each range)
Low 35%-50%
Medium 50%-65%
High 65%-80%

- Coefficiente determinado por la experiencia: Para maquinaria de construcción dotada de motores de combustión interna, por procedimientos esencialmente estadísticos, se han determinado promedios de consumo de combustible, por cada hora de operación y referidos al nivel del mar.

Consumo horario en motores a diesel = 0.13-0.20 litros por H.P. op / hora

Consumo horario en motores a gasolina = 0.18-0.24 litros por H.P. op / hora

Si se aplica el coeficiente de 0.20 a la potencia nominal de 310 HP del tractor D8T con los factores de operación recomendados por Caterpillar, se obtiene la tabla 4.3 cuyos consumos en litros/hora se aproximan razonablemente a los que aparecen en la tabla 4.2.

Tabla 4.3 Consumo horario de diesel para un tractor con 310 HP de potencia.

POTENCIA	TIPO DE TRABAJO					
	BAJO		MEDIO		ALTO	
310						
Factor de operación en forma decimal	0.35	0.5	0.5	0.65	0.65	0.8
Coefficiente						
0.2	21.7	31	31	40.3	40.3	49.6

4.3.2.2 Costo por consumo de otras fuentes de energía

Es el derivado de las erogaciones originadas por los consumos de energía eléctrica o de energéticos diferentes de los consumibles señalados en el punto anterior; representa el costo que tenga la energía consumida en la unidad de tiempo considerada.

El consumo de energía de un motor eléctrico depende fundamentalmente de su eficiencia para convertir la energía eléctrica que recibe, en energía mecánica que proporciona para ser utilizada. La ecuación fundamental que ayuda a determinar el costo de estos consumos es:

$$Ec = N * Em * Pe$$

Donde:

Ec , Costo de la energía consumida

N , Eficiencia del motor eléctrico

Em , Energía mecánica utilizable

Pe , Precio de la unidad de energía eléctrica suministrada

Los factores que determinan la eficiencia de un motor eléctrico son muy variados y un estudio de la influencia de cada uno de ellos sería demasiado extenso y conduciría a resultados imprácticos.

En la práctica los fabricantes de motores eléctricos proporcionan la potencia nominal en caballos de potencia (H.P.), pero la compañía suministradora de energía eléctrica la vende en kilowatt-hora (KWH). Para obtener el consumo horario de energía de un motor eléctrico en una hora de operación, se utilizará la fórmula siguiente:

$$Ec = 0.653HP * Pe$$

Donde:

Ec , Costo horario por consumo de energía eléctrica

$H.P$, Potencia nominal del motor

Pe, Precio del kilowatt-hora puesto en la máquina

4.3.2.3 Costo por lubricante

Las máquinas requieren lubricantes en múltiples piezas móviles, sin embargo, en este inciso se considera solamente el aceite que lleva el cárter del motor, ya que grasas y aceite para otros fines está incluido en el costo de mantenimiento.

El RLOPSRM señala:

Artículo 203.- El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Lb = (Ah + Ga)Pa$$

Donde:

“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

“Ah” Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.

“Ga” Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos y se determina por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

“Pa” Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.

Los consumos de aceite se pueden determinar a partir de las siguientes fórmulas obtenidas por medio de observaciones estadísticas.

$$\begin{cases} Ah = 0.0030 \times \text{H.P. op} & \text{Para máquinas con potencia nominal igual o menor de 100 H.P.} \\ Ah = 0.0035 \times \text{H.P. op} & \text{Para máquinas con potencia nominal mayor de 100 H.P.} \end{cases}$$

En la cual, H.P. op es la potencia nominal del motor, por el factor de operación.

Por otra parte, la cantidad de aceite necesaria por hora efectiva de trabajo, en litros (Ga), se determina como sigue:

$$Ga = \frac{v}{t}$$

Donde:

v, Es la capacidad del cárter en litros (especificada en las características del motor).

t, Es el número de horas transcurridas entre dos cambios de aceite (con aceites de buena calidad y filtros adecuados *t* es del orden de 200 horas, aunque en condiciones severas de trabajo con mucho polvo puede reducirse sustancialmente).

4.3.2.4 Costo por consumo de llantas

Las llantas del equipo de construcción, al igual que el propio equipo, sufren desgaste derivado de su uso por lo que es necesario, además de repararlas y renovarlas periódicamente, reemplazarlas cuando han llegado al fin de su vida económica.

La vida económica de las llantas varía en función de las condiciones de uso a que sean sometidas, del cuidado y mantenimiento que se les brinde, de las cargas que operen y de las condiciones de las superficies de rodamiento de los caminos en que trabajen.

El costo considerado en este rubro comprende solamente lo relativo a la amortización de las llantas para poder reemplazarlas, ya que el costo de reparaciones está comprendido en el mantenimiento.

El RLOPSRM señala:

Artículo 204.- El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$N = \frac{Pn}{Vn}$$

Donde:

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo como consecuencia de su uso.

“Pn” Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.

“Vn” Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado; velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen, y mantenimiento.

Estudios estadísticos sobre la observación del equipo de construcción pesada en presas, carreteras, y minas, han establecido que la vida económica aproximada de una llanta es del orden de 80,000 kilómetros o 5,000 horas de operación normal. Pero, por otra parte, solamente en condiciones de obra excepcionales se presentan los factores más favorables a la vida óptima de las llantas, razón por la que, para determinar la vida económica real, es necesario introducir los factores indicados en la Tabla 4.4, los que están en función de las condiciones que priven en el campo.

Se consideran condiciones adversas cuando por ejemplo en ciertos tramos de los caminos tengan superficie de rodamiento irregulares con materiales abrasivos, tengan curvas pronunciadas, pendientes fuertes que ocasionen patinazos sobre todo en tiempo de lluvias, etc.

Para cada caso específico se deberán estudiar cuidadosamente las condiciones de la obra, para poder aplicar en forma justa y racional los factores consignados en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4 Factores para determinar la vida económica de las llantas.

CONDICIONES	FACTOR
MANTENIMIENTO	
Excelentes	1.00
Medias	0.90
Deficientes	0.70
VELOCIDAD DE TRÁNSITO	
16 km por hora	1.00
32 km por hora	0.80
48 km por hora	0.60
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	
Tierra suave sin roca	1.00
Tierra suave incluyendo roca	0.90
Caminos bien conservados con superficie de grava compactada	0.70
Caminos mal conservados con superficie de grava compactada	0.60
POSICIÓN DE LAS LLANTAS	
En los ejes traseros	1.00
En los ejes delanteros	0.90
En el eje de tracción	
Vehículos de descarga trasera	0.80
Vehículos de descarga de fondo	0.70
Motoescrepas y similares	0.60
CARGAS DE OPERACIÓN	
Dentro del límite especificado por los fabricantes	1.00
Con 20% de sobrecarga	0.80
Con 40% de sobrecarga	0.50
DENSIDAD Y GRADO DE CURVAS EN EL CAMINO	
No existen	1.00
Condiciones medias	0.90
Condiciones severas	0.80
PENDIENTES DE LOS CAMINOS (Aplicables a las llantas del eje tractor)	
A nivel	1.00
5 % como máximo	0.90
10% como máximo	0.80
15% como máximo	0.70
OTRAS CONDICIONES DIVERSAS	
Inexistentes	1.00
Medias	0.90
Adversas	0.80

Fuente: Manual de rendimientos Caterpillar.

Con base en lo anteriormente expuesto, se adjunta la Tabla 4.5 en la que se consignan de manera tabular los valores de los diversos factores indicados en la Tabla 4.4, aplicados para cada tipo de maquinaria de construcción, así como la vida económica calculada para las llantas.

Tabla 4.5 Factores de afectación de las llantas del equipo de construcción y vida económica de las mismas.

CONDICIÓN	1	2	3	4	5	6 - 7	8	FACTOR TOTAL	VIDA ECONÓMICA
Camiones fuera de carretera	1.00	0.90	0.90	0.95	1.00	0.90	1.00	0.6926	3463
	0.90	0.90	0.80	0.95	1.00	0.70	0.90	0.3878	1940
Camiones pesados de terracerías	1.00	0.90	0.80	0.95	1.00	0.85	1.00	0.5814	2900
	0.90	0.90	0.70	0.95	1.00	0.70	0.90	0.3394	1697
Escrepas y motoescrepas	1.00	1.00	0.80	0.75	1.00	0.85	1.00	0.5100	2550
	0.90	1.00	0.70	0.75	1.00	0.70	1.00	0.3307	1650
Motoconformadoras	1.00	1.00	0.80	0.90	1.00	0.85	1.00	0.6120	3060
	0.90	1.00	0.80	0.90	1.00	0.70	1.00	0.4536	2270
Palas cargadoras	1.00	1.00	0.80	0.90	1.00	0.85	1.00	0.6120	3060

	0.90	1.00	0.80	0.90	1.00	0.85	0.90	0.4957	2480
Tractores	1.00	1.00	0.80	0.80	1.00	0.85	1.00	0.5440	2720
	0.90	1.00	0.80	0.80	1.00	0.70	0.90	0.3629	1815
Compactadores	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00	0.85	1.00	0.6800	3400
	0.9	1.00	0.8	1.00	1.00	0.85	1.00	0.6120	3060

Fuente: Manual de rendimientos Caterpillar.

En el renglón superior correspondiente al tipo de maquinaria, se consignan los valores relativos a condiciones normales medias, en tanto que, en el renglón inferior, se consignan los valores para condiciones adversas.

Las vidas económicas se obtuvieron multiplicando la vida óptima de las llantas, considerada en 5000 horas, por el factor total resultante de multiplicar entre sí, todos y cada uno de los factores individuales correspondientes a cada una de las condiciones concurrentes.

Así, por ejemplo: las horas de vida económicas de las llantas de un camión pesado de acarreo de terracerías, para las condiciones normales, es el producto de:

$$V_n = 1.0 \times 0.90 \times 0.80 \times 0.95 \times 1.0 \times 0.85 \times 1.0 = 0.5814 \times 5,000 \text{ h}$$

$$V_n = 2,900 \text{ horas, valor que está consignado en la Tabla 4.5.}$$

4.3.2.5 Costo por piezas especiales

Este consumo, es el correspondiente al desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. La vida económica es menor al resto del equipo.

El RLOPSRM indica:

Artículo 205.- El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Ae = \frac{Pa}{Va}$$

Donde:

“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.

“Pa” Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas.

“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Para tener en cuenta este cargo se debe considerar que no haya sido incluido en los cargos fijos, y que las piezas especiales están sujetas a condiciones severas de trabajo que produzcan un deterioro superior al normal, como pueden ser cuchillas y gavilanes de la hoja de un tractor trabajando en roca abrasiva, o casquillos de un desgarrador en condiciones semejantes, mangueras, brocas, acero de barrenación para equipos de perforación, bandas de hule, etc., siempre que estos elementos no hayan sido considerados en el precio unitario como consumo de materiales, o mantenimiento propio del equipo.

4.3.3 Costos por operación

La responsabilidad de una correcta operación de las máquinas recae en los operadores cuya capacitación es sumamente importante. En relación con este costo, el RLOPSRM señala:

Artículo 206.- El costo horario por salarios de operación es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo y se obtendrá mediante la siguiente expresión:

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Donde:

“Po” Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción.

“Sr” Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.

“Ht” Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

En la ejecución de cualquier trabajo, es prácticamente imposible que el operador o los operadores de una máquina laboren en forma continua e ininterrumpida durante toda la jornada de trabajo, hora tras hora y minuto tras minuto.

Es lógico que existan interrupciones: unas veces debidas a factores humanos, como, por ejemplo, la necesidad de que los trabajadores tomen pausas de descanso y refrigerios, con la finalidad de recobrase y serenarse; y otras, debido a pequeñas reparaciones, ajustes y lubricaciones de las máquinas, que no pueden ni deben estar funcionando ininterrumpidamente durante un número indefinido de horas al día. Frecuentemente es necesario pararlas para proporcionarles diversos servicios auxiliares de conservación.

Debe tenerse en cuenta, asimismo, especialmente en obras que presentan condiciones adversas, que las pérdidas de tiempo e interrupciones en las actividades propias la maquinaria, se incrementan en forma notable, bien sea por condiciones topográficas desfavorables, por fenómenos meteorológicos adversos, o bien, porque la maquinaria de que disponen los contratistas no sea precisamente la más adecuada para las condiciones imperantes en la obra.

Así pues, por cada hora cronológica, solo se trabaja efectivamente un porcentaje de esta, el que está influido por dos aspectos: las condiciones de la obra y la calidad de la administración o gestión de la empresa constructora.

En un curso de administración de la construcción tomado en los años ochenta por el autor, se propuso la tabla 4.6 para determinar los factores de eficiencia. Aunque se desconoce la fuente de esta tabla, por considerar que es razonable, se propone como mera sugerencia.

Tabla 4.6 Factores de rendimiento de trabajo en función de las condiciones de obra y de la calidad de administración.

CONDICIONES DE LA OBRA	CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN O GESTION			
	EXCELENTE	BUENA	REGULAR	MALA
EXCELENTES	0.84	0.81	0.76	0.70
BUENAS	0.78	0.75	0.71	0.65
REGULARES	0.72	0.69	0.65	0.60
MALAS	0.63	0.61	0.57	0.52

4.3.4 Cargo por transporte

En términos generales, el transporte de la maquinaria se considera como cargo indirecto, pero cuando sea necesario, podrá tomarse en cuenta, previo convenio entre contratante y contratista, como cargo directo o como un concepto de trabajo específico.

Hay maquinaria que puede trasladarse de un lugar a otro por sí misma, otras, requieren de plataformas o camas bajas para hacerlo. El transporte de maquinaria debe cumplir con las regulaciones del caso y contar con los seguros pertinentes.

También hay que considerar el costo que implica que algunas máquinas o instalaciones fijas deban desarmarse para su transporte.

Para facilitar el cálculo de los costos horarios, se sugiere utilizar formatos como el que se muestra en la figura 4.3.

Se incluyen asimismo ejemplos del cálculo de costo horario de algunos equipos empleados en la construcción.

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA											
DESCRIPCIÓN:										Fecha	
DATOS GENERALES											
PRECIO DE ADQUISICIÓN									VIDA ECONÓMICA (Ve)		años
COSTO DE LLANTAS (Pn)									POTENCIA NOMINAL MOTOR		HP
VALOR INICIAL (Vm)									FACTOR DE OPERACIÓN		
VALOR DE RESCATE (Vr)		%							POTENCIA DE OPERACIÓN		HP
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn)		h							CAPACIDAD DEL CÁRTER		l
COSTO COMBUSTIBLE (Pc)									TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE		h
COSTO LUBRICANTE (Pa)									TASA ANUAL DE INTERÉS (i)		%
SALARIO REAL DEL OPERADOR									HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea)		h
SALARIO REAL AYUDANTES									PRIMA DE SEGURO (s)		%
									FACTOR MANTENIMIENTO (Ko)		
I COSTOS FIJOS:											
DEPRECIACIÓN:									$D = (V_m - V_r) / V_e = \text{-----} =$		
INVERSIÓN:									$I_m = (V_m + V_r) i / (2 H_{ea}) = \text{-----} =$		
SEGURO:									$S_m = (V_m + V_r) s / (2 H_{ea}) = \text{-----} =$		
MANTENIMIENTO:									$M_n = K_o * D =$		
											SUMA COSTOS FIJOS
II. COSTOS POR CONSUMO											
COMBUSTIBLE:									$C_o = G_h * P_c =$	x	=
	Gh								GASOLINA = 0.24xHPxop		
									DIESEL = 0.20xHPxop		
LUBRICANTES:									Lb =		
Potencia nominal hasta 100 HP									Ah = 0.003xHPxop		
Potencia nominal mayor de 100 HP									Ah = 0.0035xHPxop		
									Ga = c/t =		
LLANTAS									N = Pn / Vn =		
PIEZAS ESPECIALES:									Ae = Pa / Va =	/	=
											SUMA COSTOS POR CONSUMO
III. COSTOS POR OPERACIÓN											
OPERACIÓN									Po = Sr / Ht =		
fr = factor de rendimiento =											
Ht = 8 horas x factor de rendimiento =											SUMA COSTOS POR OPERACIÓN
											COSTO HORA MÁQUINA

Figura 4.3 Formato para el cálculo de costos horarios.

D8T



Cotización

Vm= \$854,000 USD

Considerando el tipo de cambio al 10 de noviembre del 2020 a \$21.00 pesos por dólar

Vm= \$17'934,000



Fuente: <https://espanol.rockanddirt.com/search/equipment/D8T-CATERPILLAR?make=CATERPILLAR&query=D8T>

Cálculo del costo horario en página siguiente.

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA														
DESCRIPCIÓN: TRACTOR D8T					Fecha: enero 2021									
DATOS GENERALES														
PRECIO DE ADQUISICIÓN			\$	17,934,000	VIDA ECONOMICA (Ve)			12000	h					
COSTO DE LLANTAS (Pn)					POTENCIA NOMINAL MOTOR	diesel		310	HP					
VALOR INICIAL (Vm)			\$	17,934,000	FACTOR DE OPERACIÓN			0.8						
VALOR DE RESCATE (Vr)	20	%			POTENCIA DE OPERACIÓN			248	HP					
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn)		h		-	CAPACIDAD DEL CÁRTER			38	l					
COSTO COMBUSTIBLE (Pc) diesel			\$	18.85	TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE			200	h					
COSTO LUBRICANTE (Pa)			\$	70.00	TASA ANUAL DE INTERÉS (i)			12	%					
SALARIO REAL DEL OPERADOR			\$	701.44	HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea)			2000	h					
SALARIO REAL AYUDANTES					PRIMA DE SEGURO (s)			5	%					
					FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko)			0.9						
I. COSTOS FIJOS:														
			\$	17,934,000	-			3586800						
DEPRECIACIÓN:	D=(Vm- Vr) / Ve = ----- =								\$	1,195.60				
								12000						
			(\$	17,934,000	+	3586800)	0.12					
INVERSIÓN:	Im = (Vm+Vr)i / (2Hea) = ----- =								\$	645.62				
					2 X			2000						
			(\$	17,934,000	+	3586800)	0.05					
SEGURO:	Sm = (Vm+Vr)s / (2Hea) = ----- =													
					2 X			2000						
MANTENIMIENTO	Mn = Ko*D =		0.90	x	\$	1,195.60	=		\$	1,076.04				
SUMA CARGOS FIJOS									\$	3,186.27				
II. COSTOS POR CONSUMO														
COMBUSTIBLE:	Co = Gh * Pc =		32.24	x	\$	18.85	=		\$	607.72				
Gh	GASOLINA =	0.18	x	HP	x	op	=	0.18	x	310	x	0.80	=	0.00
	DIESEL =	0.13	x	HP	x	op	=	0.13	x	310	x	0.80	=	32.24
LUBRICANTES:	Lb = (Ah + Ga) Pa =		(0.868	+	0.19)	70.00	=		\$	74.06		
Potencia nominal hasta 100 HP	Ah = 0.0030*HP*op =		0.0030	x	310	x	0.80	=	0.000					
Potencia nominal mayor de 100 HP	Ah = 0.0035*HP*op =		0.0035	x	310	x	0.80	=	0.868					
	Ga = c/t =	38	/	200	=	0.19								
LLANTAS	N = Pn / Vn =	\$	-	/	-	=			\$	-				
PIEZAS ESPECIALES:	Ae = Pa / Va =	/		=										
OTRAS FUENTES DE ENERGIA														
SUMA CARGOS POR CONSUMO									\$	681.78				
III. COSTOS POR OPERACIÓN														
OPERACIÓN	Po = Sr / Ht =	\$	701.44	/	6	=			\$	116.91				
fr = factor de rendimiento =	0.75													
Ht = 8 horas x factor de rendimiento =	6													
SUMA CARGOS POR OPERACIÓN									\$	116.91				
COSTO HORA MÁQUINA									\$	3,984.96				

Camión volteo International 4300, 210 HP, 7 m³



Cotización en mercado libre = \$1'200,000.00 (incluye I.V.A.)

Costo sin incluir I.V.A.= \$1'034,482.76

Modelo 2018

7,900 km de uso (Si v_{prom}= 30 km/h, entonces ha trabajado aproximadamente 263 horas)

Suponiendo que el camión tendrá una vida económica de 10,000 horas y un valor de rescate del 20%, al aplicar la expresión vista en el tema de depreciación y sustituyendo valores se tiene:

$$Vm = \frac{Ve * Vu}{Ve - h + rh} = \frac{10,000 * \$1'034,482.76}{10,000 - 263 + 0.20 * 263} = \$1'056,716.07$$



Cotización llantas: \$4,143.10 sin I.V.A.

<https://credivehiculos.com/international-durastar-4300/>

Cálculo del costo horario en página siguiente.

Revolvedora Marca CIPSA, modelo ULTRA
Olla de acero/polietileno
Motor MPower de 9 HP
Capacidad: 1 saco



Cotización: Mercado libre= \$28,990 inc. I.V.A.

Costo sin incluir I.V.A. \$24,991.40

Nota:

El costo de las llantas no se descontó del valor inicial ni se tomó como consumo, esto por considerar que no es un equipo que se traslade con frecuencia por si mismo en la obra y que las llantas tendrán la misma vida económica que el propio equipo.

Vibrador para concreto, marca Hyundai, modelo HYVCH67
Potencia 6.7 HP
Incluye chicote para vibrador con longitud de 6 m. y diámetro de 38 mm.



Cotización: Mercado libre \$9,847.00 inc. I.V.A.

Costo sin incluir I.V.A. \$8488.80

Cálculo de los costos horarios de ambos equipos en páginas siguientes.

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA				Fecha: enero 2021	
DESCRIPCIÓN: REVOLVEDORA DE 1 SACO					
Motor a gasolina de 9 HP, olla de acero/polietileno					
DATOS GENERALES					
PRECIO DE ADQUISICIÓN		\$	24,991.40	VIDA ECONÓMICA (Ve)	6000 h
COSTO DE LLANTAS (Pn)		\$	-	POTENCIA NOMINAL MOTOR	9 HP
VALOR INICIAL (Vm)		\$	24,991	gasolina	
VALOR DE RESCATE (Vr)	10 %			FACTOR DE OPERACIÓN	0.7
VIDA ECONÓMICA DE LLANTAS (Vn)	h			POTENCIA DE OPERACIÓN	6.3 HP
COSTO COMBUSTIBLE (Pc) gasolina		\$	17.92	CAPACIDAD DEL CÁRTER	2.5 l
COSTO LUBRICANTE (Pa)		\$	70.00	TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE	200 h
SALARIO REAL DEL OPERADOR		\$	614.83	TASA ANUAL DE INTERÉS (i)	12 %
SALARIO REAL AYUDANTES				HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea)	2000 h
				PRIMA DE SEGURO (s)	5 %
				FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko)	0.8
I. CARGOS FIJOS:		\$	24,991.40 - 2499.14		
DEPRECIACIÓN:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$				\$ 3.75
			6000		
		(\$	24,991.40 + 2499.14)	0.12	
INVERSIÓN:	$Im = (Vm + Vr) / (2Hea) =$				\$ 0.82
			2 X 2000		
		(\$	24,991.40 + 2499.14)	0.05	\$ 0.34
SEGURO:	$Sm = (Vm + Vr) / (2Hea) =$				
			2 X 2000		
MANTENIMIENTO	$Mn = Ko * D =$	0.80	x	\$ 3.75	= \$ 3.00
				SUMA CARGOS FIJOS	\$ 7.92
II. CARGOS POR CONSUMO					
COMBUSTIBLE:	$Co = Gh * Pc =$	1.13	x	\$ 17.92	= \$ 20.32
Gh	GASOLINA =	0.18	x	HP x op =	0.18 x 9 x 0.70 = 1.13
	DIESEL =	0.13	x	HP x op =	0.13 x 9 x 0.70 = 0.00
LUBRICANTES:	$Lb = (Ah + Ga) Pa =$	(0.019 + 0.0125)		70.00	= \$ 2.20
Potencia nominal hasta 100 HP	$Ah = 0.0030 * HP * op =$	0.0030	x	9 x 0.70	= 0.019
Potencia nominal mayor de 100 HP	$Ah = 0.0035 * HP * op =$	0.0035	x	9 x 0.70	= 0.000
	$Ga = c/t =$	2.5 / 200	=	0.0125	
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	\$ - / -	=		\$ -
PIEZAS ESPECIALES:	$Ae = Pa / Va =$	/	=		
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA					
				SUMA CARGOS POR CONSUMO	\$ 22.52
III. CARGOS POR OPERACIÓN					
OPERACIÓN	$Po = Sr / Ht =$	\$ 614.83 / 6	=		\$ 102.47
fr = factor de rendimiento =	0.75				
Ht = 8 horas x factor de rendimiento =	6			SUMA CARGOS POR OPERACIÓN	\$ 102.47
				COSTO HORA MÁQUINA	\$ 132.91

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA										3
DESCRIPCIÓN: VIBRADOR DE CONCRETO								Fecha: enero 2021		
Motor a gasolina de 6.7 HP, Diámetro del cabezal 38 mm, longitud 600 mm.										
DATOS GENERALES										
PRECIO DE ADQUISICIÓN		\$	8,488.80		VIDA ECONÓMICA (Ve)	6000	h			
COSTO DE LLANTAS (Pn)		\$	-		POTENCIA NOMINAL MOTOR	6.7	HP	gasolina		
VALOR INICIAL (Vm)		\$	8,489		FACTOR DE OPERACIÓN	0.7				
VALOR DE RESCATE (Vr)	10	%			POTENCIA DE OPERACIÓN	4.69	HP			
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn)		h			CAPACIDAD DEL CÁRTER	2	l			
COSTO COMBUSTIBLE (Pc) gasolina		\$	17.92		TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE	200	h			
COSTO LUBRICANTE (Pa)		\$	70.00		TASA ANUAL DE INTERÉS (i)	12	%			
SALARIO REAL DEL OPERADOR		\$	614.83		HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea)	2000	h			
SALARIO REAL AYUDANTES					PRIMA DE SEGURO (s)	5	%			
					FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko)	0.8				
I. CARGOS FIJOS:										
DEPRECIACIÓN:	D=(Vm-Vr)/Ve =		8,488.80 - 848.88		=				\$ 1.27	
			6000							
			(\$ 8,488.80 + 848.88)		0.12					
INVERSIÓN:	Im = (Vm+Vr)i/(2Hea) =		2 X 2000		=				\$ 0.28	
			(\$ 8,488.80 + 848.88)		0.05				\$ 0.12	
SEGURO:	Sm = (Vm+Vr)s/(2Hea) =		2 X 2000		=					
MANTENIMIENTO	Mn = Ko*D =		0.80	x	\$ 1.27	=			\$ 1.02	
SUMA CARGOS FIJOS									\$ 2.69	
II. CARGOS POR CONSUMO										
COMBUSTIBLE:	Co = Gh * Pc =		0.84	x	\$ 17.92	=			\$ 15.13	
Gh	GASOLINA = 0.18 x HP x op =		0.18	x	6.7	x	0.70	=	0.84	
	DIESEL = 0.13 x HP x op =		0.13	x	6.7	x	0.70	=	0.00	
LUBRICANTES:	Lb = (Ah + Ga) Pa =		(0.014 + 0.01)		70.00	=			\$ 1.68	
Potencia nominal hasta 100 HP	Ah = 0.0030*HP*op =		0.0030	x	6.7	x	0.70	=	0.014	
Potencia nominal mayor de 100 HP	Ah = 0.0035*HP*op =		0.0035	x	6.7	x	0.70	=	0.000	
	Ga = c/t =		2	/	200	=	0.01			
LLANTAS	N = Pn / Vn =		\$ -	/	-	=			\$ -	
PIEZAS ESPECIALES:	Ae = Pa / Va =		/			=				
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA										
SUMA CARGOS POR CONSUMO									\$ 16.81	
III. CARGOS POR OPERACIÓN										
OPERACIÓN	Po = Sr / Ht =		\$ 614.83	/	6	=			\$ 102.47	
fr = factor de rendimiento =	0.75									
Ht = 8 horas x factor de rendimiento =	6									
SUMA CARGOS POR OPERACIÓN									\$ 102.47	
COSTO HORA MAQUINA									\$ 121.97	

Excavadora Cat 312



Cotización: Mercado libre= \$1'600,000 + I.V.A., con 5465 horas de uso.

Se considera vida económica= 12,000 y valor de rescate del 20%

$$\text{Aplicando: } \frac{VeVu}{Ve-h+rh} = \frac{12,000 * \$1'600,000}{12,000 - 5465 + 0.20 * 5465} = \$2'517,042.50$$

Cálculo del costo horario en página siguiente.

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA						6		
DESCRIPCIÓN: EXCAVADORA CATERPILLAR SOBRE ORUGAS CAT 312D				Fecha: enero 2021				
DATOS GENERALES								
PRECIO DE ADQUISICIÓN	\$	2,517,043	VIDA ECONÓMICA (Ve)	12000	h			
COSTO DE LLANTAS (Pn)			POTENCIA NOMINAL MOTOR	90	HP			
VALOR INICIAL (Vm)	\$	2,517,043	FACTOR DE OPERACIÓN	0.8				
VALOR DE RESCATE (Vr)	20 %		POTENCIA DE OPERACIÓN	72	HP			
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn)	h	-	CAPACIDAD DEL CÁRTER	19.5	l			
COSTO COMBUSTIBLE (Pc) diesel	\$	18.87	TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE	200	h			
COSTO LUBRICANTE (Pa)	\$	70.00	TASA ANUAL DE INTERÉS (i)	12	%			
SALARIO REAL DEL OPERADOR	\$	701.44	HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea)	2000	h			
SALARIO REAL AYUDANTES			PRIMA DE SEGURO (s)	5	%			
			FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko)	0.8				
I. CARGOS FIJOS:								
		\$	2,517,043 -	503408.5				
DEPRECIACIÓN:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$					\$	167.80	
		12000						
		$(\$ 2,517,043 + 503408.5) \cdot 0.12$						
INVERSIÓN:	$Im = (Vm + Vr) / (2Hea) =$					\$	90.61	
		2 X 2000						
		$(\$ 2,517,043 + 503408.5) \cdot 0.05$				\$	37.76	
SEGURO:	$Sm = (Vm + Vr) / (2Hea) =$							
		2 X 2000						
MANTENIMIENTO	$Mn = Ko \cdot D =$	0.80	x	\$	167.80	=	\$	134.24
SUMA CARGOS FIJOS							\$	430.41
II. CARGOS POR CONSUMO								
COMBUSTIBLE:	$Co = Gh \cdot Pc =$	9.36	x	\$	18.87	=	\$	176.62
Gh	GASOLINA =	0.18	x	HP	x	op	=	0.18 x 90 x 0.80 = 0.00
	DIESEL =	0.13	x	HP	x	op	=	0.13 x 90 x 0.80 = 9.36
LUBRICANTES:	$Lb = (Ah + Ga) Pa =$	$(0.216 + 0.0975) \cdot 70.00 =$				\$	21.95	
Potencia nominal hasta 100 HP	$Ah = 0.0030 \cdot HP \cdot op =$	0.0030	x	90	x	0.80	=	0.216
Potencia nominal mayor de 100 HP	$Ah = 0.0035 \cdot HP \cdot op =$	0.0035	x	90	x	0.80	=	0.000
	$Ga = c/t =$	20	/	200	=	0.0975		
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	\$	-	/	-	=	\$	-
PIEZAS ESPECIALES:	$Ae = Pa / Va =$					=		
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA								
SUMA CARGOS POR CONSUMO							\$	198.57
III. CARGOS POR OPERACIÓN								
OPERACIÓN	$Po = Sr / Ht =$	\$	701.44	/	6	=	\$	116.91
fr = factor de rendimiento =	0.75							
Ht = 8 horas x factor de rendimiento =	6							
SUMA CARGOS POR OPERACIÓN							\$	116.91
COSTO HORA MAQUINA							\$	745.89

Motoconformadora Caterpillar 120H de 140 HP



Cotización: Mercado libre= \$2'490,000, modelo 2011, no indica horas de uso
Se suponen 8,000 horas de uso con una vida económica de 14,000 horas y valor del rescate del 10%.

$$\text{Aplicando } Vm = \frac{VeVu}{Ve-h+rh} = \frac{14,000 * \$2'490,000}{14,000 - 8,000 + 0.10 * 8000} = \$5'126,470.60$$

Llantas de 13.00-24

Cotización: Mercado libre= \$15,030.00 inc. I.V.A. = \$12,956.90 cada una sin I.V.A.

Costo de las 6 llantas= \$77,741.40

Cálculo del costo horario en la siguiente página.

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA										5				
DESCRIPCION: MOTOCONFORMADORA CAT 120H								Fecha: enero 2021						
DATOS GENERALES														
PRECIO DE ADQUISICIÓN		\$	5,126,470.60		VIDA ECONOMICA (Ve)	14000	h							
COSTO DE LLANTAS (Pn)	(Estandar 13.00-24)	\$	77,741		POTENCIA NOMINAL MOTOR	140	HP	diesel						
VALOR INICIAL (Vm)		\$	5,048,729.20		FACTOR DE OPERACIÓN	0.8								
VALOR DE RESCATE (Vr)	10 %				POTENCIA DE OPERACIÓN	112	HP							
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn)	h		3,000		CAPACIDAD DEL CÁRTER	29.5	l							
COSTO COMBUSTIBLE (Pc) diesel		\$	18.87		TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE	200	h							
COSTO LUBRICANTE (Pa)		\$	70.00		TASA ANUAL DE INTERÉS (i)	12	%							
SALARIO REAL DEL OPERADOR		\$	701.44		HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea)	2000	h							
SALARIO REAL AYUDANTES					PRIMA DE SEGURO (s)	5	%							
					FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko)	0.8								
I. CARGOS FIJOS:		\$	5,048,729.20	-	504872.92									
DEPRECIACIÓN:	$D = (Vm - Vr) / Ve$									\$ 324.56				
			14000											
		(\$	5,048,729.20	+	504872.92)	0.12							
INVERSIÓN:	$Im = (Vm + Vr) / (2Hea)$									\$ 166.61				
			2 X		2000									
		(\$	5,048,729.20	+	504872.92)	0.05			\$ 69.42				
SEGURO:	$Sm = (Vm + Vr) / (2Hea)$													
			2 X		2000									
MANTENIMIENTO	$Mn = Ko * D$		0.80	x	\$ 324.56	=				\$ 259.65				
SUMA CARGOS FIJOS										\$ 820.24				
II. CARGOS POR CONSUMO														
COMBUSTIBLE:	$Co = Gh * Pc$		14.56	x	\$ 18.87	=				\$ 274.75				
Gh	GASOLINA =	0.18	x	HP	x	op	=	0.18	x	140	x	0.80	=	0.00
	DIESEL =	0.13	x	HP	x	op	=	0.13	x	140	x	0.80	=	14.56
LUBRICANTES:	$Lb = (Ah + Ga) Pa$		(0.392	+	0.1475)	70.00	=					\$ 37.77
Potencia nominal hasta 100 HP	$Ah = 0.0030 * HP * op$		0.0030	x	140	x	0.80	=	0.000					
Potencia nominal mayor de 100 HP	$Ah = 0.0035 * HP * op$		0.0035	x	140	x	0.80	=	0.392					
	$Ga = c / t$		30	/	200	=		0.1475						
LLANTAS	$N = Pn / Vn$	\$	77,741	/	3,000	=								\$ 25.91
PIEZAS ESPECIALES:	$Ae = Pa / Va$			/		=								
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA														
SUMA CARGOS POR CONSUMO										\$ 338.43				
III. CARGOS POR OPERACIÓN														
OPERACIÓN	$Po = Sr / Ht$	\$	701.44	/	6	=				\$ 116.91				
fr = factor de rendimiento =	0.75													
Ht = 8 horas x factor de rendimiento =	6													
SUMA CARGOS POR OPERACIÓN										\$ 116.91				
COSTO HORA MAQUINA										\$ 1,275.57				

Camión pipa de 10,000 litros de capacidad.



Cotización: Mercado libre= \$1'619,000+tanque (\$62,000), inc. I.V.A.= \$1'681,000

Costo sin I.V.A = \$1'449,137.95

Llantas

Cotización: Mercado libre= \$ 24,858.6

Cálculo del costo horario en página siguiente.

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA									
DESCRIPCIÓN: CAMION PIPA					Fecha: enero 2021				
DATOS GENERALES									
PRECIO DE ADQUISICIÓN		\$	1,449,137.95		VIDA ECONOMICA (Ve)		10000		h
COSTO DE LLANTAS (Pn)		\$	24,859		POTENCIA NOMINAL MOTOR	diesel	170		HP
VALOR INICIAL (Vm)		\$	1,424,279		FACTOR DE OPERACIÓN		0.7		
VALOR DE RESCATE (Vr)	10	%			POTENCIA DE OPERACIÓN		119		HP
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn)		h	3,000		CAPACIDAD DEL CÁRTER		12		l
COSTO COMBUSTIBLE (Pc) diesel		\$	18.87		TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE		200		h
COSTO LUBRICANTE (Pa)		\$	70.00		TASA ANUAL DE INTERÉS (i)		12		%
SALARIO REAL DEL OPERADOR		\$	683.83		HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea)		2000		h
SALARIO REAL AYUDANTES					PRIMA DE SEGURO (s)		5		%
					FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko)		0.8		
I. CARGOS FIJOS:		\$	1,424,279.35	-	142427.935				
DEPRECIACIÓN:	D = (Vm - Vr) / Ve =		-----		=			\$	128.19
			10000						
		(\$	1,424,279.35	+	142427.935)	0.12	
INVERSIÓN:	Im = (Vm + Vr) / (2Hea) =		-----		=			\$	47.00
			2	X	2000				
		(\$	1,424,279.35	+	142427.935)	0.05	\$
SEGURO:	Sm = (Vm + Vr) / (2Hea) =		-----		=				
			2	X	2000				
MANTENIMIENTO	Mn = Ko * D =		0.80	x	\$	128.19	=	\$	102.55
								SUMA CARGOS FIJOS	\$ 297.32
II. CARGOS POR CONSUMO									
COMBUSTIBLE:	Co = Gh * Pc =		15.47	x	\$	18.87	=	\$	291.92
Gh	GASOLINA =		0.18	x	HP	x	op	=	0.18 x 170 x 0.70 = 0.00
	DIESEL =		0.13	x	HP	x	op	=	0.13 x 170 x 0.70 = 15.47
LUBRICANTES:	Lb = (Ah + Ga) Pa =		(0.417	+	0.06)	70.00	=
Potencia nominal hasta 100 HP	Ah = 0.0030 * HP * op =		0.0030	x	170	x	0.70	=	0.000
Potencia nominal mayor de 100 HP	Ah = 0.0035 * HP * op =		0.0035	x	170	x	0.70	=	0.417
	Ga = c/t =		12	/	200	=	0.06		
LLANTAS	N = Pn / Vn =		\$	24,859	/	3,000	=	\$	8.29
PIEZAS ESPECIALES:	Ae = Pa / Va =		/				=		
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA									
								SUMA CARGOS POR CONSUMO	\$ 333.56
III. CARGOS POR OPERACIÓN									
OPERACIÓN	Po = Sr / Ht =		\$	683.83	/	6	=	\$	113.97
fr = factor de rendimiento =	0.75								
Ht = 8 horas x factor de rendimiento =	6								
								SUMA CARGOS POR OPERACIÓN	\$ 113.97
								COSTO HORA MAQUINA	\$ 744.85

Rodillo liso vibratorio



Cotización: Mercado libre= \$1'400,000 I.V.A. incluido = \$1'206,896.55 sin I.V.A.

Modelo 2011 Horómetro= 2000 h (poco creíble por ser modelo 2011), se supondrán 6,000 horas de uso.

$$\text{Aplicando } Vm = \frac{VeVu}{Ve-h+rh} = \$ \frac{12,000 * \$1'206,896.55}{12,000 - 6,000 + 0.20 * 6000} = \$2'011,494.25$$

Llantas 8 lonas para flotación de 23,1 x 26

Cotización: Mercado libre= \$21,279 inc. I.V.A

Costo llantas= \$18,343.95 x 2= \$36,687.90

Cálculo del costo horario en página siguiente.

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA										7					
DESCRIPCIÓN: RODILLO LISO VIBRATORIO CAT CS 533E					Fecha: enero 2021										
DATOS GENERALES															
PRECIO DE ADQUISICIÓN				\$	2,011,494.25	VIDA ECONÓMICA (Ve)	12000	h							
COSTO DE LLANTAS (Pn)				\$	36,687.90	POTENCIA NOMINAL MOTOR	130	HP	diesel						
VALOR INICIAL (Vm)				\$	1,974,806.35	FACTOR DE OPERACIÓN	0.8								
VALOR DE RESCATE (Vr)	20	%				POTENCIA DE OPERACIÓN	104	HP							
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn)		h			2,600	CAPACIDAD DEL CÁRTER	9	l							
COSTO COMBUSTIBLE (Pc)diesel				\$	18.87	TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE	200	h							
COSTO LUBRICANTE (Pa)				\$	70.00	TASA ANUAL DE INTERÉS (i)	12	%							
SALARIO REAL DEL OPERADOR				\$	701.44	HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea)	2000	h							
SALARIO REAL AYUDANTES						PRIMA DE SEGURO (s)	5	%							
						FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko)	0.85								
I. CARGOS FIJOS:				\$	1,974,806.35	-	394961.27								
DEPRECIACIÓN:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$								\$	131.65					
					12000										
				(\$	1,974,806.35	+	394961.27)	0.12					
INVERSIÓN:	$Im = (Vm + Vr) / (2Hea) =$								\$	71.09					
					2 X	2000									
				(\$	1,974,806.35	+	394961.27)	0.05					
SEGURO:	$Sm = (Vm + Vr) / (2Hea) =$														
					2 X	2000									
MANTENIMIENTO	$Mn = Ko * D =$		0.85	x	\$	131.65	=		\$	111.91					
SUMA CARGOS FIJOS										\$ 344.27					
II. CARGOS POR CONSUMO															
COMBUSTIBLE:	$Co = Gh * Pc =$				13.52	x	\$ 18.87	=		\$ 255.12					
Gh	GASOLINA	=	0.18	x	HP	x	op	=	0.18	x	130	x	0.80	=	0.00
	DIESEL	=	0.13	x	HP	x	op	=	0.13	x	130	x	0.80	=	13.52
LUBRICANTES:	$Lb = (Ah + Ga) Pa =$				(0.364	+	0.045)	70.00	=		\$	28.63	
Potencia nominal hasta 100 HP	$Ah = 0.0030 * HP * op =$				0.0030	x	130	x	0.80	=	0.000				
Potencia nominal mayor de 100 HP	$Ah = 0.0035 * HP * op =$				0.0035	x	130	x	0.80	=	0.364				
	$Ga = c/t =$				9	/	200	=	0.045						
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$				\$	36,688	/	2,600	=		\$	14.11			
PIEZAS ESPECIALES:	$Ae = Pa / Va =$				/		=								
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA															
SUMA CARGOS POR CONSUMO										\$ 297.86					
III. CARGOS POR OPERACIÓN															
OPERACIÓN	$Po = Sr / Ht =$				\$	701.44	/	6	=		\$	116.91			
fr = factor de rendimiento =	0.75														
Ht = 8 horas x factor de rendimiento =	6														
SUMA CARGOS POR OPERACIÓN										\$ 116.91					
COSTO HORA MAQUINA										\$ 759.04					

La Tabla 4.7, muestra un resumen de los costos horarios calculados.

Tabla 4.7 Resumen de costos horarios calculados.

No.	Descripción	Costo horario
1	TRACTOR D8T	\$ 3,984.96
2	CAMION VOLTEO INTERNATIONAL 4300 DE 7 m3	\$ 738.48
3	REVOLVEDORA DE 1 SACO	\$ 132.91
4	VIBRADOR DE CONCRETO	\$ 121.97
5	EXCAVADORA CATERPILLAR SOBRE ORUGAS CAT 312D	\$ 745.89
6	MOTOCONFORMADORA CAT 120H	\$ 1,275.57
7	CAMION PIPA	\$ 744.85
8	RODILLO LISO VIBRATORIO CAT CS 533E	\$ 759.04

4.3.5 El I.V.A. en los costos de la maquinaria

El cargo por IVA no deberá incluirse en la estructuración de los costos horarios.

En el momento que el constructor adquiere un equipo, ya sea en el mercado nacional o de importación, debe pagar el IVA correspondiente al proveedor; por lo que, en toda obra gravada, deberá manejarse el pago de IVA a los proveedores de equipo, su traslado a clientes por obra ejecutada y su acreditación ante la SHyCP, en forma contable, sin repercutirlo dentro de los costos o en el precio de venta.

4.4 El costo directo por maquinaria

Con relación a este tema, el RLOPSRM señala:

Artículo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad con la siguiente expresión:

$$ME = \frac{Phm}{Rhm}$$

Donde:

“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.

Nota del autor: La palabra horario figura incorrectamente al inicio del primer párrafo y, en la definición de ME, debe decir simplemente costo directo.

“Phm” Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.

“Rhm” Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de medida, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como las características ambientales de la zona donde se realizan los trabajos. Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles ni operación.

La normatividad señala que el cálculo de los costos horarios debe hacerse considerando equipo nuevo para hacerlo consistente con los rendimientos de equipo nuevo. Evidentemente, las empresas cuentan con maquinaria y equipo de diversas edades y, en ocasiones tienen que rentarlo. En este caso el analista tendrá que corroborar el importe de las rentas contra los cálculos que resulten en el costo horario y hacer las modificaciones que procedan.

Como ejemplo se muestra la tabla 4.8, con tarifas de renta mensual de equipo pesado de construcción a noviembre del 2020. Estos precios se aplican a periodos de renta de 30 días ó 200 horas de trabajo, con supervisión periódica, no incluyen operación, mantenimiento, fletes ni seguros.

Tabla 4.8 Renta mensual de equipo pesado de construcción.

MÁQUINA	MODELOS COMERCIALES	RANGO		RENTA MENSUAL	
		H.P.	CAPACIDAD	NIUEVOS	SEMINUEVOS
TRACTORES	CAT D4H CASE 850G DEERE 650H KOMATSU D41E	90			105,200
	CAT D4G	80		94,100	
	CAT D5H CASE 1150G DEERE 700H FIAT F09 KOMATSU D53A	120			111,400
	CAT D5G	90			117,600
	CASE 1150H J DEERE 7000	110			
	CAT D5N	115		134,900	
	CAT D4D DEERE 850K KOMATSU D4SE FIAT A. F09B	140	-		107,000
	CAT D6H DEERE 850B	165			143,000
	CAT D6N	140		148,300	
	CAT D6RH DEERE 850C KOMATSU D6SE CASE 1850K	165		180,700	
	CAT D7G KOMATSU D65A - 21 CASE 1850K	180/200	-		120,100
	CAT D7H FIAT ALLIS F030	215	-		157,800
	CAT D7R FIAT ALLIS F030 KOMATSU D6SE	230			253,700
	CAT D7N SERIE 8	240		330,500	
	CAT D8K KOMATSU D155 - A1	300/320	-		153,500
	CAT D9L FIAT A. FD - 30C	335	-		185,000
	CAT D9N KOMATSU D155 - A2 FIAT F030	290		338,200	273,400
	CAT D9H DEERE 1050C KOMATSU D275 A	209		370,000	
	CAT D8T	310			423,800
	CAT D9N KOMATSU D355 A	400			
CAT D9T	410		554,600		
CARGADORES SOBRE CARRILES	CAT 943 DEERE 655C	80	1.5 yd ³		48,200
	CAT 929C	90	1.5 yd ³	85,400	
	CAT 933C DEERE 655C KOMATSU D57R	125	2.25 yd ³		146,100
	CAT 933C	127		177,700	
	DEERE 755B KOMATSU D57J	130/140	2.00 yd ³		150,400
	CAT 963B DEERE 755C KOMATSU D155	160	3.00 yd ³		156,600
	CAT 963C	158	2.8 yd ³	206,200	
	CAT 977L DEERE 855 INTERNATIONAL 250C	190	2.75 yd ³		177,700
CAT 973C	230	3.66 yd ³	322,100		
CARGADORES SOBRE NEUMÁTICOS	CAT 920 DEERE 444G KOMATSU WA 120 VOLVO L50B CLARK45B	80/100	1.75 yd ³		82,900
	CAT 924G	121	2.3 yd ³	94,800	
	CAT 926F DEERE 444H KOMATSU WA 180 CASE 721D	110	2.00 yd ³		64,900
	CAT 928G DEERE 544G KOMATSU WA 250 CASE 827B JCB 435	120	2.8 yd ³		100,900
	CAT 928G CASE 621C JCB 426B	131	2.6 yd ³	113,000	
	CAT 938G DEERE 544H CASE 721B VOLVO L90C KOMATSU WA 320 JCB 436	140	3 yd ³		128,400
	CAT 938B 8 DEERE 924	160	3.65 yd ³	141,700	
	CAT 950G DEERE 644H VOLVO L120C CASE 821 KOMATSU WA 380 JCB 456	170	3.50 yd ³		150,400
	CAT 955G 8	183	4.00 yd ³	169,800	
	DEERE 744E CASE 921B KOMATSU WA 430 VOLVO - 150-C	170	4.00 yd ³		126,200
	CAT 966F VOLVO L 150 CASE 921B KOMATSU WA 420	210	4.5/5 yd ³		209,200
	CAT 966G 8 CASE 921C VOLVO L120 DEERE 744H	246	5.25 yd ³	251,300	
	CAT 988G TEREX 90C KOMATSU WA 600 VOLVO L320	370/415	7.00 yd ³		254,000
	CAT 988F DEERE 744H VOLVO L330C KOMATSU WA 600	430	8.00 yd ³		379,600
	CAT 988G	475	8.20 yd ³	434,400	
CAT 988H	475	8.20 yd ³	518,500		
EXCAVADORAS	CAT 930 DEERE 160 YUMBO 2964 POCLAIN LC80	100/120	0.75 yd ³		54,300
	CAT 225 DEERE 690 AMERICAN 25-A POCLAIN90 KOMATSU PC25	135/150	1.62 yd ³		84,200
	CAT 235 DEERE 892 AMERICAN 35-A POCLAIN 160 KOMATSU PC400	195/250	2.60 yd ³		113,000
	CAT 320B	128	1.34 yd ³		113,000
	CAT 320C DEERE 2050 LC CASE 903D/CX310 KOMATSU PC200 JCB 200	138	1.24 yd ³	153,700	
	CAT 325B DEERE 2700 LC CASE 904G/CX240 KOMATSU PC250 JCB 260	168	2.5 yd ³		161,200
	CAT 325CL GAEWO 290 JCB 260 DEERE 270C	188	2.25 yd ³	180,500	
	CAT 245 DEERE 540C LC	360	3.5 yd ³		250,000
	CAT EL 300 DEERE 890	187/200	1.5 yd ³		115,700
	CAT 330B DEERE 230C LC KOMATSU PC300 JCB 330LC	222	2.7 yd ³		209,200
CAT 330C	247	1.7 yd ³	240,600		
CAT 343B 8	320		322,200		
RETROEXCAVADORAS	CAT 416B DEERE 310D CASE 580K FORD 555 MF 50 MF 86 JCB 214E	65/70	1.00 yd ³		42,100
	CAT 416C DEERE 310E/G CASE 580L/SLM JCB 21 KOMATSU WB93R	70/75	1.00 yd ³		48,300
	CAT 416D CASE 580M JCB 214E DEERE 310G N HOLLAND NH88S	77	1.00 yd ³	60,200	
	CAT 426 DEERE 410E CASE 593T/5803M JCB 214		1.25 yd ³		51,200
	CAT 426B DEERE 710D CASE 590SL JCB 214T JCB 214S/215S	80/90	1.5 yd ³		55,500
	CASE 580LSM	98		67,500	

Fuente: <https://informaquina.mx/revista.php#revistapdf/28>.

4.5 Rendimientos de los equipos de construcción

Se define como rendimiento, la cantidad de unidades de obra que una máquina puede ejecutar en la unidad de tiempo, que en el caso de la maquinaria es la hora.

Con base en lo anterior, las unidades del rendimiento se expresan en m/h, m²/h, m³/h, etc.

Los equipos ligeros o pequeños generalmente vienen acompañados de una hoja técnica en la cual se estipula el rendimiento o producción que son capaces de ofrecer. Por otra parte, su costo es bajo y su producción va asociada a la habilidad de la mano de obra para operarlos, tal es el caso de una “bailarina” o un vibrador para concreto.

Sin embargo, los equipos pesados, cuyo costo de adquisición es muy alto, requieren que los cálculos para determinar sus costos y rendimientos sean lo más exactos posible, ya que de ello depende el éxito económico de una obra.

Los rendimientos en todo caso pueden obtenerse de tres maneras:

- Por observación directa
- A partir de tablas o gráficas
- Por procedimientos analíticos

La determinación del rendimiento por observación directa se puede llevar a cabo cuando el equipo ya se encuentra trabajando en la obra o bien en campos o tramos de experimentación: basta observar y documentar de manera sistemática los volúmenes que las máquinas ejecutan en un periodo determinado para calcular el rendimiento horario promedio.

Algunos fabricantes o distribuidores de equipo proporcionan tablas o gráficas en las cuales se pueden consultar los rendimientos esperados. En este caso, es muy importante verificar las condiciones bajo las cuales se determinaron estos rendimientos y hacer los ajustes necesarios para el caso particular que se esté analizando.

Finalmente, la determinación de los rendimientos por procedimientos analíticos se hace a partir del estudio detallado del ciclo de trabajo de las máquinas.

Las expresiones algebraicas para calcular el rendimiento de algunos equipos mediante este procedimiento se muestran en la tabla 4.9.

Tabla 4.9 Fórmulas para obtener el rendimiento teórico de algunos equipos de construcción.

EQUIPO	RENDIMIENTO TEÓRICO
Cargadores	$R = \frac{C * K * 60 * \eta}{Ca * t}$
Compactadores	$R = \frac{10 * A * V * E * F * \eta}{N}$
Draga, palas, retroexcavadoras	$R = \frac{C * K * 60 * \eta}{Ca * t}$
Escarificador	$R = \frac{V * As * p * \eta}{N}$
Motoconformadora	$T = \sum \frac{Ni * D}{Vi * \eta_i}$
Motoescropa	$R = \frac{C * 60 * \eta}{Ca * t}$
Tractor	$R = \frac{C * 60 * \eta}{Ca * t}$ $C = \frac{L * H^2}{2 \tan \phi}$

- 10, Factor para homogenizar unidades.
- A, Ancho de compactación.
- A_s, Ancho del surco labrado por el diente del arado, cuando el equipo escarificador esté formado por varios dientes, el valor de "a" será el ancho efectivo de la faja roturada por el arado.
- C, Capacidad del útil de trabajo (hoja, bote, caja).
- Ca, Coeficiente de abundamiento del material.
- D, Distancia recorrida en cada pasada, expresada en kilómetros. Debe determinarse de acuerdo con la naturaleza del trabajo.
- E, Espesor de capa por compactar en centímetros.
- F, Factor de traslape.
- H, Altura de la hoja del tractor.
- K, Factor de carga.
- L, Longitud de la hoja del tractor.
- N, Número de pasadas necesarias en cada capa, ya sea para compactar, para extender o para aflojar material, se determina por especificaciones, por experiencia o mediante terraplenes de prueba.

- p, Profundidad efectiva de penetración de los dientes del arado.
- T, Tiempo total empleado en realizar un trabajo, determinado compuesto por varias operaciones, cada una de ellas llevada a cabo con diferente velocidad, diferente número de pasadas y en su caso diferente eficiencia.
- t, Tiempo del ciclo en minutos.
- V, Velocidad de la máquina al realizar el trabajo en kilómetros por hora.
- η , Factor de eficiencia.
- ϕ , Ángulo del reposo del material empujado por la hoja del tractor.

Capítulo 5

Costos indirectos

5.1 Generalidades

Los costos indirectos son todos aquellos gastos generales no considerados en el costo directo que, por su naturaleza intrínseca, se requieren para que la empresa constructora pueda llevar a cabo el adecuado avance de las obras a su cargo y las actividades propias de su naturaleza.

Los costos indirectos son perfectamente previsibles y se pueden analizar y calcular previamente por lo menos dentro del mismo orden de aproximación de los costos directos. Se pueden, por otra parte, controlar durante la ejecución de la obra, para mantenerlos dentro de los límites prefijados.

El RLOPSRM establece la siguiente definición:

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Con base en lo anterior, se pueden agrupar los costos indirectos en dos categorías:

- Administración central
- Administración y gastos generales de obra

5.2 Administración central

Toda empresa constructora racionalmente organizada, debe estar dotada de personal encargado de planear, organizar, dirigir y controlar todas las operaciones de la propia empresa, así como de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las funciones sustantivas de esta.

El artículo 213 del RLOPSRM establece los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso.

Son los siguientes:

1. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

- a) Personal directivo;*
- b) Personal técnico;*

- c) Personal administrativo;*
- d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;*
- e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;*
- f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y*
- g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;*

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

- a) Edificios y locales;*
- b) Locales de mantenimiento y guarda;*
- c) Bodegas;*
- d) Instalaciones generales;*
- e) Equipos, muebles y enseres;*
- f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y*
- g) Campamentos;*

III. Servicios de los siguientes conceptos:

- a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y*
- b) Estudios e investigaciones;*

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

- a) Campamentos;*
- b) Equipo de construcción;*
- c) Plantas y elementos para instalaciones, y*
- d) Mobiliario;*

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

- a) Papelería y útiles de escritorio;*
- b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;*
- c) Equipo de computación;*
- d) Situación de fondos;*
- e) Copias y duplicados;*
- f) Luz, gas y otros consumos, y*
- g) Gastos de la licitación pública;*

VI. Capacitación y adiestramiento;

VII. Seguridad e higiene;

VIII. Seguros y fianzas, y

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

- a) Construcción y conservación de caminos de acceso;*
- b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y*
- c) Construcción de las siguientes instalaciones generales:*

1. Campamentos;
2. Equipo de construcción, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.

Por otra parte, el RLOPSRM establece que:

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate.

Conforme lo que señala el artículo anterior, aplicado a la administración central, una manera de hacerlo es calcular el importe de los gastos generales de la empresa para un periodo anual y dividir este importe entre el costo directo anual de la obra que se espera ejecutar en el mismo periodo. El resultado, expresado en porcentaje, se aplicará como lo indica el artículo al costo directo de cada uno de los conceptos de obra.

Se ilustra lo anterior esquemáticamente en la figura 5.1.

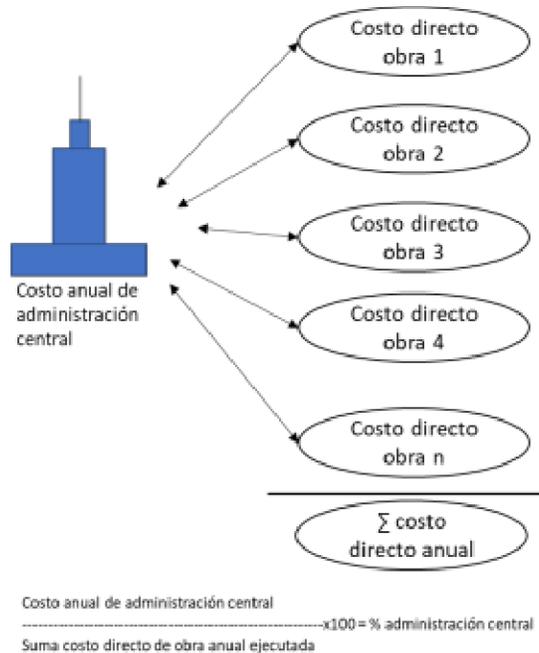


Figura 5.1 Manera de calcular el porcentaje de administración central.

Ejemplo

Supongamos que se ha calculado el costo anual por administración central en una constructora mismo que importa \$10'000,000. Ver tabla 5.1.

Por otra parte, se estima que el volumen de obra que espera ejecutar a costo directo es de \$125'000,000, entonces el porcentaje que tendrá que cargar a cada una de las obras a través de cada uno de los conceptos que ejecute en el año es igual a:

$$\% \text{ administración central} = \frac{\$10'000,000}{\$125'000,000} \times 100 = 8\%$$

Tabla 5.1 Cálculo del costo anual por administración central y porcentaje sobre el costo directo anual de obra ejecutada.

RUBRO	IMPORTE ANUAL	%
(1)	(2)	(3)
I Honorarios	\$8,000,000	80.00%
II Depreciación	\$550,000	5.50%
III Servicios	\$350,000	3.50%
IV Fletes	\$0	0.00%
V Gastos ofna.	\$680,000	6.80%
VI Capacitación	\$250,000	2.50%
VII Seguridad	\$120,000	1.20%
VIII Seguros	\$50,000	0.50%
IX Trabajos	\$0	0.00%
TOTAL	\$10,000,000	100.00%
SUMA CD	\$125,000,000	
% ADMON. CENTRAL	8.00%	

Teóricamente, el 8% calculado debería aplicarse a todas las obras que ejecute la empresa en el año, sin embargo, es obvio pensar que, de acuerdo con el panorama que se vaya presentando, los directivos tomarán medidas conducentes a incrementar o disminuir este porcentaje o bien harán ajustes en la organización para mantenerlo.

El RLOPSR hace la siguiente puntualización:

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate.

Una vez calculado el porcentaje de administración central, la disposición anterior se puede cumplir fácilmente si se hace una regla de tres para cada una de las obras que se están presupuestando. La Tabla 5.2 ilustra la manera de hacerlo.

Las columnas 1, 2 y 3 corresponden al cálculo del importe anual de administración central y el porcentaje de cada uno de los nueve rubros considerados con relación al total de \$10'000,000. La columna 4 contiene el porcentaje que representa cada uno de los nueve rubros sobre la suma a costo directo de la obra que se estima ejecutar en un año (\$125'000,000). Estos porcentajes se aplican al costo directo de cada una de las cinco obras consideradas, lo que da como resultado el cargo que se hará por administración central para cada uno de los rubros considerados. La suma de estos cargos representa, por decirlo de alguna manera, la aportación de cada una de las obras para soportar el costo de la administración central.

En la tabla se ha considerado para cada uno de los nueve rubros únicamente la suma de su importe. En un caso real, es necesario desglosar cada uno de estos rubros en los conceptos que los integran.

Tabla 5.2 Cálculo del porcentaje e importe que se aplicará a las obras por administración central.

RUBRO	IMPORTE ANUAL	%	%/SUMA CD	CD OBRA 1 \$50,000,000	CD OBRA 2 \$30,000,000	CD OBRA 3 \$15,000,000	CD OBRA 4 \$20,000,000	CD OBRA 5 \$10,000,000	SUMA \$125,000,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I Honorarios	\$8,000,000	80.00%	6.40%	\$3,200,000	\$1,920,000	\$960,000	\$1,280,000	\$640,000	
II Depreciación	\$550,000	5.50%	0.44%	\$220,000	\$132,000	\$66,000	\$88,000	\$44,000	
III Servicios	\$350,000	3.50%	0.28%	\$140,000	\$84,000	\$42,000	\$56,000	\$28,000	
IV Fletes	\$0	0.00%	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
V Gastos ofna.	\$680,000	6.80%	0.54%	\$272,000	\$163,200	\$81,600	\$108,800	\$54,400	
VI Capacitación	\$250,000	2.50%	0.20%	\$100,000	\$60,000	\$30,000	\$40,000	\$20,000	
VII Seguridad	\$120,000	1.20%	0.10%	\$48,000	\$28,800	\$14,400	\$19,200	\$9,600	
VIII Seguros	\$50,000	0.50%	0.04%	\$20,000	\$12,000	\$6,000	\$8,000	\$4,000	
IX Trabajos	\$0	0.00%	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$10,000,000	100.00%	8.00%	\$4,000,000	\$2,400,000	\$1,200,000	\$1,600,000	\$800,000	\$10,000,000
SUMA CD	\$125,000,000								
% ADMON. CENTRAL	8.00%								

5.3 Administración de obra

El costo del personal dedicado a planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los trabajos en obra, de la infraestructura requerida (campamento, oficinas, bodegas, talleres, etc.) y en general de los nueve rubros considerados, representa el costo de administración de obra.

Este costo está asociado a una duración determinada definida por el programa de obra y al costo directo de la obra misma. Conocidos estos dos aspectos, el porcentaje que habrá de aplicarse a todos los conceptos se calcula con la siguiente expresión.

$$\% \text{Administración de obra} = \frac{\text{Costo de administración de obra}}{\text{Costo directo de la obra}} \times 100$$

La tabla 5.3 muestra un ejemplo simplificado del cálculo de administración de obra.

Tabla 5.3 Ejemplo del cálculo del porcentaje de administración de obra.

RUBRO	IMPORTE	%/TOTAL	%/CD de la obra
(1)	(2)	(3)	(4)
I Honorarios	\$3,000,000.00	61%	6.00%
II Depreciación	\$450,000.00	9%	0.90%
III Servicios	\$500,000.00	10%	1.00%
IV Fletes	\$200,000.00	4%	0.40%
V Gastos ofna.	\$300,000.00	6%	0.60%
VI Capacitación	\$100,000.00	2%	0.20%
VII Seguridad	\$100,000.00	2%	0.20%
VIII Seguros	\$50,000.00	1%	0.10%
IX Trabajos	\$200,000.00	4%	0.40%
TOTAL	\$4,900,000.00	100%	9.80%
Costo directo de la obra			\$50,000,000.00

La tabla 5.4 muestra el ejemplo del cálculo de los porcentajes de administración central y de obra para una licitación de obra pública.

Tabla 5.4 Porcentajes de administración central y de obra para una licitación.

Licitación número: 123-ABC/2020		FECHA:			
Descripción de la obra: Construcción de...					
Fecha de inicio		01/06/2020			
Fecha de terminación		31/12/2020		meses	
Duración total de la obra:		213	días	7.10	
			COSTO DIRECTO		\$20,000,000.00
No.	CONCEPTO	ADMN. CENTRAL		ADMN. DE OBRA	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
I	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES	\$918,160.00	4.59%	\$831,600.00	4.16%
I.1	PERSONAL DIRECTIVO	\$ 120,000.00	0.60%	\$210,000.00	1.05%
I.2	PERSONAL TECNICO	\$ 260,000.00	1.30%	\$280,000.00	1.40%
I.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 308,000.00	1.54%	\$140,000.00	0.70%
I.4	PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL Y LFT (32%)	\$ 220,160.00	1.10%	\$201,600.00	1.01%
I.5	PASAJES Y VIÁTICOS	\$ 10,000.00	0.05%	\$0.00	0.00%
I.6	LOS QUE DERIVEN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
II	DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS	\$ 66,000.00	0.33%	\$210,000.00	1.05%
II.1	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 40,000.00	0.20%	\$0.00	0.00%
II.2	LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
II.3	BODEGAS	\$ -	0.00%	\$42,000.00	0.21%
II.4	INSTALACIONES GENERALES	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
II.5	MUEBLES Y ENSERES	\$ 9,333.33	0.05%	\$28,000.00	0.14%
II.6	DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS	\$ 16,666.67	0.08%	\$140,000.00	0.70%
II.7	CAMPAMENTOS	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
III	ASESORÍAS Y SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 33,333.33	0.17%	\$140,000.00	0.70%
III.1	CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS	\$ 33,333.33	0.17%	\$140,000.00	0.70%
III.2	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
IV	FLETES Y ACARREOS	\$ 8,333.33	0.04%	\$120,000.00	0.60%
IV.1	DE CAMPAMENTOS	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
IV.2	DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ -	0.00%	\$100,000.00	0.50%
IV.3	DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
IV.4	DE MOBILIARIO	\$ 8,333.33	0.04%	\$20,000.00	0.10%
V	GASTOS DE OFICINA	\$ 38,000.00	0.19%	\$145,500.00	0.73%
V.1	PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 10,000.00	0.05%	\$35,000.00	0.18%
V.2	CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO	\$ 8,000.00	0.04%	\$14,000.00	0.07%
V.3	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,000.00	0.03%	\$28,000.00	0.14%
V.4	SITUACIÓN DE FONDOS	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
V.5	COPIAS Y DUPLICADOS	\$ 4,000.00	0.02%	\$21,000.00	0.11%
V.6	LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS	\$ 4,000.00	0.02%	\$17,500.00	0.09%
V.7	GASTOS DE LICITACIÓN	\$ 6,000.00	0.03%	\$30,000.00	0.15%
VI	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$ 10,000.00	0.05%	\$100,000.00	0.50%
VI.1	CAPACITACIÓN	\$ 10,000.00	0.05%	\$100,000.00	0.50%
		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
VII	SEGURIDAD E HIGIENE	\$ 5,833.33	0.03%	\$60,000.00	0.30%
VII.1	SEGURIDAD E HIGIENE	\$ 5,833.33	0.03%	\$60,000.00	0.30%
		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
VIII	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 40,833.33	0.20%	\$250,000.00	1.25%
VIII.1	SEGUROS	\$ 40,833.33	0.20%	\$50,000.00	0.25%
VIII.2	FIANZAS	\$ -	0.00%	\$200,000.00	1.00%
IX	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES	\$ -	0.00%	\$20,000.00	0.10%
IX.1	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
IX.2	MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
IX.3	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
IX.3.1	DE CAMPAMENTOS	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
IX.3.2	DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
IX.3.3	DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES	\$ -	0.00%	\$0.00	0.00%
IX.3.4	LETRERO NOMINATIVO DE LA OBRA	\$ -	0.00%	\$20,000.00	0.10%
COSTO INDIRECTO		\$ 1,120,493.33	5.60%	\$ 1,877,100.00	9.39%

5.4 Costo de financiamiento

Los recursos económicos para la ejecución de una obra provienen del cliente quien de acuerdo con lo que se haya pactado en el contrato respectivo otorgará al constructor anticipos y pagos a cuenta con cierta periodicidad.

En la obra pública, se establece que las estimaciones de obra deberán formularse en un periodo máximo de un mes, que el contratista deberá presentarlas dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, que la residencia de obra tendrá un plazo no mayor a quince días naturales para revisarlas y que la dependencia deberá pagarlas en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. (Ver artículo 54 de la LOPSRM).

Lo anterior trae consigo un desfase entre que el constructor realiza erogaciones para la ejecución de la obra y recibe los ingresos correspondientes. En determinadas etapas de la obra esto puede ocasionar que el constructor no tenga los recursos económicos para continuar con el programa en cuyo caso:

- Puede parar temporalmente los trabajos, lo cual no es recomendable porque se haría acreedor a una posible rescisión de contrato, amén del deterioro que pudiera sufrir la obra, a tener que darle nuevamente inercia a los trabajos cuando se reanuden, a recontractar personal, etc.
- Puede disminuir sustancialmente el ritmo de ejecución en tanto cobra los pagos pendientes.
- Puede “inyectar” recursos propios o contratados con alguna institución financiera, lo que le origina un costo de financiamiento.

Al respecto, el RLOPSRM define el costo de financiamiento y la manera como habrá de calcularse.

Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.

Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista;
- II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
- III. Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y
 - b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y
- IV. Que se integre por los siguientes egresos:

- a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
- b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y
- c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

El procedimiento señalado implica la elaboración de un flujo de caja en donde se registren los ingresos y egresos para identificar la necesidad de financiamiento. La figura 5.2, ilustra esquemáticamente el flujo de caja para el cálculo del costo de financiamiento.

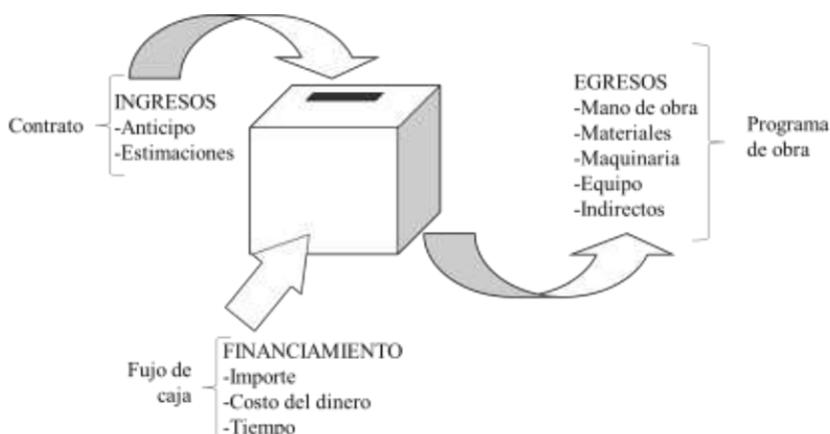


Figura 5.2 Representación gráfica del flujo de caja.

El RLOPSRM señala en su artículo 217 que para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado, este deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito.

Algunos de los indicadores económicos que regularmente se publican en la red son: los certificados de la tesorería (cetes), el costo porcentual promedio (cpp) la tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie).

5.4.1 Cálculo del costo de financiamiento

En virtud de que los ingresos que se van a considerar en el flujo de caja corresponden a los importes calculados con base en los precios unitarios y estos comprenden el costo de financiamiento mismo que está por calcularse, se cae en un círculo vicioso. Por tal motivo, es necesario hacer varias iteraciones: se parte de suponer un costo o porcentaje de financiamiento, hacer un primer cálculo y a continuación sustituir el valor supuesto por el valor calculado hasta que, después de varias iteraciones ambos valores coincidan.

Las tablas 5.5, 5.6 y 5.7 muestran el proceso descrito.

En el ejemplo, se tomó como indicador económico la tiie al 4 de noviembre de 2020 cuyo valor es de 4.51%, equivalente a 0.3758% mensual, a la cual se le sumó 0.6241% para dar 1% mensual como costo del dinero.

No se consideró el producto financiero que pueden generar las cantidades positivas acumuladas en el flujo de caja, de hacerlo el costo de financiamiento disminuye, pero este criterio de considerar un rendimiento sobre los saldos en la caja es discutible.

En el ejemplo fue necesario hacer tres iteraciones. El software disponible por Neodata para el cálculo de precios unitarios tiene la opción de indicar cuántas iteraciones desea el usuario efectuar para tener la confiabilidad de que el porcentaje que se aplicará a la suma del costo directo más indirecto para obtener el costo de financiamiento no tendrá variaciones.

Algunas dependencias solicitan que como ingresos se consideren únicamente el costo directo más el indirecto. Esta disposición, aunque evita el tener que hacer iteraciones, es errónea y contraria a lo que señala el RLOPSRM.

Tabla 5.5 Cálculo del costo de financiamiento, primera iteración.

PRESUPUESTO		PROGRAMA DE OBRA			
			MES	%	% ACUMUL
COSTO DIRECTO		\$ 10,000,000.00			
COSTO INDIRECTO	15.00%	\$ 1,500,000.00	1	2%	2%
CD + CI		\$ 11,500,000.00	2	6%	8%
COSTO POR FINANCIAMIENTO	1.0000%	\$ 115,000.00	3	12%	20%
CD+ CI+ CF		\$ 11,615,000.00	4	18%	38%
UTILIDAD	10.00%	\$ 1,161,500.00	5	24%	62%
PRECIO DE VENTA		\$ 12,776,500.00	6	19%	81%
			7	12%	93%
FACTOR DE SOBRECOSTO		1.2777	8	5%	98%
			9	2%	100%



CONCEPTO		Meses											SUMA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	11	
EGRESOS													
COSTO DIRECTO		\$200,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	\$1,800,000.00	\$2,400,000.00	\$1,900,000.00	\$1,200,000.00	\$500,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
COSTO INDIRECTO		\$30,000.00	\$90,000.00	\$180,000.00	\$270,000.00	\$360,000.00	\$285,000.00	\$180,000.00	\$75,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
SUMA DE EGRESOS		\$230,000.00	\$690,000.00	\$1,380,000.00	\$2,070,000.00	\$2,760,000.00	\$2,185,000.00	\$1,380,000.00	\$575,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00
INGRESOS													
ANTICIPO	30%	\$3,832,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,832,950.00
ESTIMACIONES		\$0.00	\$0.00	\$255,530.00	\$766,590.00	\$1,533,180.00	\$2,299,770.00	\$3,066,360.00	\$2,427,535.00	\$1,533,180.00	\$638,825.00	\$255,530.00	\$12,776,500.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0.00	\$0.00	-\$76,659.00	-\$229,977.00	-\$459,954.00	-\$689,931.00	-\$919,908.00	-\$728,260.50	-\$459,954.00	-\$191,647.50	-\$76,659.00	-\$3,832,950.00
SUMA INGRESOS		\$3,832,950.00	\$0.00	\$178,871.00	\$536,613.00	\$1,073,226.00	\$1,609,839.00	\$2,146,452.00	\$1,699,274.50	\$1,073,226.00	\$447,177.50	\$178,871.00	\$12,776,500.00
INGRESOS - EGRESOS		\$3,602,950.00	-\$690,000.00	-\$1,201,129.00	-\$1,533,387.00	-\$1,686,774.00	-\$575,161.00	\$766,452.00	\$1,124,274.50	\$843,226.00	\$447,177.50	\$178,871.00	\$1,276,500.00
(ingresos-egresos) acumulados		\$3,602,950.00	\$2,912,950.00	\$1,711,821.00	\$178,434.00	-\$1,508,340.00	-\$2,083,501.00	-\$1,317,049.00	-\$192,774.50	\$650,451.50	\$1,097,629.00	\$1,276,500.00	
Tasa de interes	1.00%												
Costo financiero		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,083.40	-\$20,835.01	-\$13,170.49	-\$1,927.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,016.65
% de financiamiento													0.44%

Tabla 5.6 Cálculo del costo de financiamiento, segunda iteración.

PRESUPUESTO		PROGRAMA DE OBRA			
COSTO DIRECTO		\$ 10,000,000.00	MES	%	% ACUMUL
COSTO INDIRECTO	15.00%	\$ 1,500,000.00	1	2%	2%
CD + CI		\$ 11,500,000.00	2	6%	8%
COSTO POR FINANCIAMIENTO	0.4400%	\$ 50,600.00	3	12%	20%
CD+ CI+ CF		\$ 11,550,600.00	4	18%	38%
UTILIDAD	10.00%	\$ 1,155,060.00	5	24%	62%
PRECIO DE VENTA		\$ 12,705,660.00	6	19%	81%
			7	12%	93%
FACTOR DE SOBRECOSTO		1.2706	8	5%	98%
			9	2%	100%



CONCEPTO		Meses											SUMA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EGRESOS													
COSTO DIRECTO		\$200,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	\$1,800,000.00	\$2,400,000.00	\$1,900,000.00	\$1,200,000.00	\$500,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
COSTO INDIRECTO		\$30,000.00	\$90,000.00	\$180,000.00	\$270,000.00	\$360,000.00	\$285,000.00	\$180,000.00	\$75,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
SUMA DE EGRESOS		\$230,000.00	\$690,000.00	\$1,380,000.00	\$2,070,000.00	\$2,760,000.00	\$2,185,000.00	\$1,380,000.00	\$575,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00
INGRESOS													
ANTICIPO	30%	\$3,811,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,698.00
ESTIMACIONES		\$0.00	\$0.00	\$254,113.20	\$762,339.60	\$1,524,679.20	\$2,287,018.80	\$3,049,358.40	\$2,414,075.40	\$1,524,679.20	\$635,283.00	\$254,113.20	\$12,705,660.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0.00	\$0.00	-\$76,233.96	-\$228,701.88	-\$457,403.76	-\$686,105.64	-\$914,807.52	-\$724,222.62	-\$457,403.76	-\$190,584.90	-\$76,233.96	-\$3,811,698.00
SUMA INGRESOS		\$3,811,698.00	\$0.00	\$177,879.24	\$533,637.72	\$1,067,275.44	\$1,600,913.16	\$2,134,550.88	\$1,689,852.78	\$1,067,275.44	\$444,698.10	\$177,879.24	\$12,705,660.00
INGRESOS - EGRESOS		\$3,581,698.00	-\$690,000.00	-\$1,202,120.76	-\$1,536,362.28	-\$1,692,724.56	-\$584,086.84	\$754,550.88	\$1,114,852.78	\$837,275.44	\$444,698.10	\$177,879.24	\$1,205,660.00
(Ingresos-egresos) acumulados		\$3,581,698.00	\$2,891,698.00	\$1,689,577.24	\$153,214.96	-\$1,539,509.60	-\$2,123,596.44	-\$1,369,045.56	-\$254,192.78	\$583,082.66	\$1,027,780.76	\$1,205,660.00	
Tasa de interés	1.00%												
Costo financiero		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,395.10	-\$21,235.96	-\$13,690.46	-\$2,541.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,863.44
% de financiamiento													0.46%

Tabla 5.7 Cálculo del costo de financiamiento, tercera iteración (final).

PRESUPUESTO		PROGRAMA DE OBRA			
		\$	MES	%	% ACUMUL
COSTO DIRECTO		\$ 10,000,000.00			
COSTO INDIRECTO	15.00%	\$ 1,500,000.00	1	2%	2%
CD + CI		\$ 11,500,000.00	2	6%	8%
COSTO POR FINANCIAMIENTO	0.4600%	\$ 52,900.00	3	12%	20%
CD+ CI+ CF		\$ 11,552,900.00	4	18%	38%
UTILIDAD	10.00%	\$ 1,155,290.00	5	24%	62%
PRECIO DE VENTA		\$ 12,708,190.00	6	19%	81%
			7	12%	93%
FACTOR DE SOBRECOSTO		1.2708	8	5%	98%
			9	2%	100%



CONCEPTO		Meses											SUMA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
EGRESOS														
COSTO DIRECTO		\$200,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	\$1,800,000.00	\$2,400,000.00	\$1,900,000.00	\$1,200,000.00	\$500,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	
COSTO INDIRECTO		\$30,000.00	\$90,000.00	\$180,000.00	\$270,000.00	\$360,000.00	\$285,000.00	\$180,000.00	\$75,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	
SUMA DE EGRESOS		\$230,000.00	\$690,000.00	\$1,380,000.00	\$2,070,000.00	\$2,760,000.00	\$2,185,000.00	\$1,380,000.00	\$575,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00	
INGRESOS														
ANTICIPO	30%	\$3,812,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,812,457.00	
ESTIMACIONES		\$0.00	\$0.00	\$254,163.80	\$762,491.40	\$1,524,982.80	\$2,287,474.20	\$3,049,965.60	\$2,414,556.10	\$1,524,982.80	\$635,409.50	\$254,163.80	\$12,708,190.00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0.00	\$0.00	-\$76,249.14	-\$228,747.42	-\$457,494.84	-\$686,242.26	-\$914,989.68	-\$724,366.83	-\$457,494.84	-\$190,622.85	-\$76,249.14	-\$3,812,457.00	
SUMA INGRESOS		\$3,812,457.00	\$0.00	\$177,914.66	\$533,743.98	\$1,067,487.96	\$1,601,231.94	\$2,134,975.92	\$1,690,189.27	\$1,067,487.96	\$444,786.65	\$177,914.66	\$12,708,190.00	
INGRESOS - EGRESOS		\$3,582,457.00	-\$690,000.00	-\$1,202,085.34	-\$1,536,256.02	-\$1,692,512.04	-\$583,768.06	\$754,975.92	\$1,115,189.27	\$837,487.96	\$444,786.65	\$177,914.66	\$1,208,190.00	
(Ingresos-egresos) acumulados		\$3,582,457.00	\$2,892,457.00	\$1,690,371.66	\$154,115.64	-\$1,538,396.40	-\$2,122,164.46	-\$1,367,188.54	-\$251,999.27	\$585,488.69	\$1,030,275.34	\$1,208,190.00		
Tasa de interés	1.00%													
Costo financiero		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,383.96	-\$21,221.64	-\$13,671.89	-\$2,519.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,797.49	
% de financiamiento													0.46%	

5.5 Utilidad

Al tratar este tema, nos introducimos en un campo en el que cada empresa debe determinarse libremente, sin más limitaciones que las que le fijan sus obligaciones para consigo misma y para la sociedad dentro del marco legal vigente.

Concebida la empresa como una entidad mercantil, sus obligaciones en el campo de lo económico y en el campo de lo social son: continuidad, mejoramiento, y desarrollo. Las utilidades tienen entonces un mínimo obligado que es aquel que hace posible el cumplimiento de esta doble función.

Por otra parte, dentro del régimen de libre empresa y de economía privada, el capital tiene un papel generador. Al desempeñarlo asume un riesgo. Es pues de conveniencia social y de justicia evidente que el empresario tenga una remuneración equitativa.

Con respecto a la utilidad el RLOPSR señala:

Artículo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

En estas condiciones, si consideramos que la utilidad neta es la que resulta de restar los impuestos señalados a la utilidad bruta se tiene que:

$$Utilidad\ bruta - Impuestos * Utilidad\ bruta = Utilidad\ neta$$

Si consideramos el impuesto sobre la renta (ISR) y la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU):

$$Utilidad\ bruta - (ISR + PTU)Utilidad\ bruta = Utilidad\ neta$$

Finalmente, despejando:

$$Utilidad\ bruta = \frac{Utilidad\ neta}{1 - (ISR + PTU)}$$

Un factor crucial para determinar el porcentaje de utilidad es el riesgo que representa la actividad de la construcción y el grado de incertidumbre que la rodea.

Otros factores circunstanciales pueden ser la dificultad técnica de la obra, su localización, el plazo en que deba ejecutarse, su magnitud, su complejidad y los porcentajes de utilidad con que opera la competencia.

Es común en nuestro medio y dadas circunstancias normales, que el porcentaje de utilidad oscile entre un 8% y un 12%.

5.6 Cargos adicionales

Para la obra pública el RLOPSRM establece:

Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Estos cargos siempre representan un porcentaje del precio unitario, ya que en general gravitan directamente sobre el importe total de los contratos.

Entre estos cargos se pueden mencionar:

- a) El pago de los derechos de inspección de obras públicas, que ejerce la Secretaría de la Función Pública y que paga toda empresa constructora cuando contrata con organismos gubernamentales; corresponde al 0.5% del importe total contratado. El Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos señala: “*Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo*”.
- b) El pago de la capacitación de los trabajadores que mediante convenios pagan las empresas constructoras que realizan obras para el sector oficial y, que corresponde al 0.2% del importe total del contrato.
- c) Los pagos de impuestos estatales y municipales, que pagan las empresas constructoras cuando realizan obras en provincia.
- d) Inspecciones que realiza la entidad contratante y que corresponde a un porcentaje de la obra ejecutada*.
- e) Aportaciones a Colegios*.

*Por ejemplo, estos cargos se han aplicado a obras del gobierno de la Ciudad de México.

Es importante hacer notar que las deducciones anteriores se aplican sobre el precio de venta al momento de facturar, por ello, se debe recordar la estructura del precio unitario en la formulación del presupuesto final.

Considérese el siguiente ejemplo:

COSTO DIRECTO	\$1,000,000.00
COSTO INDIRECTO (15%)	\$ 150,000.00
Subtotal 1	\$1,150,000.00
COSTO DE FINANCIAMIENTO (1%)	\$ 11,500.00
Subtotal 2	\$1,161,500.00
UTILIDAD (10%)	\$ 116,150.00
Subtotal 3	\$1,277,650.00
Cargos adicionales (3.7%)	\$ 49,089.36
Precio de venta	\$1,326,739.36

Se sabe que:

$$\text{Precio de venta} - \text{Cargos adicionales sobre el precio de venta} = \text{Subtotal 3}$$

Si se utilizan abreviaturas:

$$PV - \%CA * PV = \text{Subtotal 3}$$

Despejando PV:

$$PV = \frac{\text{Subtotal 3}}{1 - \%CA}$$

Como:

$$\text{Cargos adicionales} = \text{Precio de venta} - \text{Subtotal 3}$$

Entonces:

$$\text{Cargos adicionales} = \frac{\text{Subtotal 3}}{1 - \%CA} - \text{Subtotal 3}$$

En el ejemplo, suponiendo que los cargos adicionales, C.A. = 3.7%:

$$\text{Cargos adicionales} = \frac{\$1'277,650}{1 - 0.037} - \$1'277,650 = \$49,089.36$$

Si se aplica directamente el 3.7% sobre el subtotal 3 el resultado es \$47,273.05, el cual es un resultado erróneo.

Al utilizar el criterio expuesto para el caso en que como cargo adicional solamente se tiene el 0.5%, la expresión resulta:

$$\text{Cargos adicionales} = \frac{\text{Subtotal 3}}{1 - 0.005} - \text{Subtotal 3}$$

Simplificando:

$$\text{Cargos adicionales} = 0.005025 * \text{Subtotal3}$$

Esto es, se puede aplicar en este caso directamente sobre el subtotal 3 el 0.005025% para obtener el importe de los cargos adicionales.

5.7 Sugerencia para el cálculo del costo directo

Es conveniente que durante el proceso del cálculo de costos directos se tenga en mente que, para cualquier concepto de obra, por muy simple o complejo que sea, siempre se tendrá un procedimiento constructivo con la participación de uno, dos o tres insumos: mano de obra, materiales y maquinaria y herramienta.

Eventualmente alguno de los materiales puede tener a su vez el mismo tratamiento esto es, un procedimiento constructivo con sus insumos correspondientes, tal es el caso, por ejemplo, del concepto: “Suministro y colocación de concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$, hecho en obra para dalas y castillos...”, donde uno de los insumos es precisamente el concreto que tendrá a su vez como insumos, materiales: cemento, arena, grava y agua, mano de obra: cuadrilla de personas que fabrican el concreto y maquinaria y herramienta: revolvedora para fabricar el concreto, vibrador para concreto, palas, carretillas y botes.

Como primer paso entonces, se recomienda definir el procedimiento constructivo, a continuación, los insumos necesarios de los cuales habrá que definir su cantidad y sus costos para calcular el costo directo.

Esto implica tener calculados los salarios reales, los costos horarios y la cotización de los materiales puestos en obra.

5.8 Ejemplos

5.8.1 Concepto: Losa de concreto reforzado de 10 cm de espesor, incluye concreto $f'c= 200$ kg/cm² R.R., premezclado, acero de refuerzo $f'y= 4200$ kg/cm², cimbra y descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución, acabado común.

Unidad: m²

Datos Básicos:

Volumen de concreto por m² losa = 0.10 m³

Kilos de acero por m² de losa = 7.50 kg/m² (varía entre 6 y 10)

Altura de la cimbra = 2.50 m

Acabado de losa: Común

Altura de colado = 5.00 m (segundo nivel)

Curado de concreto: Se utilizará agua de pipa.



El análisis se puede separar en tres aspectos:

- I. Concreto
- II. Acero de refuerzo
- III. Cimbra

I. Concreto

- Material (concreto premezclado).
- Colocación: mano de obra para carga a botes, acarreo, vaciado, nivelación y vibrado.
- Equipo para vibrado.
- Herramienta.

Material:

a) Concreto

Costo del concreto por m³ puesto en obra = \$2,009.39

Volumen necesario por m² de losa = 0.10 m³

Concreto por m² de losa = 0.10 x 2,009.39 = \$ 200.94

Agua para curado de concreto = 5 l/m² x \$0.25/l = \$ 1.25

Sumando se tiene el total del concreto incluyendo agua para curado = **\$ 202.19**

b) Colocación (mano de obra)

Personal necesario para un rendimiento de 30 m³ por jornada (jornada = 8 horas x 75% de eficiencia = 6 horas diarias):

2 oficiales albañiles + 2 peones (carga botes) + 15 peones (acarreo) + 3 peones (descarga y acomodo)

Costo de la cuadrilla por jornada:

Categoría	Unidad	Cantidad	Salario real	Importe
Oficial albañil	jor	2.00	\$ 670.44	\$ 1,340.88
Peones	jor	20.00	\$ 583.75	\$ 11,675.00
Cabo	jor	1.00	\$ 889.72	\$ 889.72
SUMA POR JORNADA				\$ 13,905.60

$$\text{Colocación por } m^3 = \frac{\$13,905.60}{30} = \$463.52$$

$$\text{Colocación por } m^2 \text{ de losa} = \$463.52 * 0.10 = \mathbf{\$46.35}$$

c) Vibrado

$$\text{Costo hora máquina incluyendo operación} = \$121.97$$

El rendimiento de vibrado está sujeto al rendimiento de colocación, es decir: 30 m³/jornada, entre 6 horas efectivas que se trabajan en cada jornada = 5m³/h. Por otra parte, se requieren 2 vibradores. (necesarios para poder atacar distintas zonas de colado y prevención de descomposturas).

$$\text{Vibrado por } m^2 \text{ de losa} = 2 * \frac{\$121.97}{5} = \$48.79 * 0.10 \frac{m^3}{m^2} = \mathbf{\$4.88}$$

d) Herramienta

Como ya se mencionó anteriormente, se representa como un porcentaje de la mano de obra.

Se tomará un 3%.

$$\text{Herramienta} = 0.03 * \$46.35 = \mathbf{\$1.39}$$

Resumen concreto por m² de losa:

Rubro	Importe
Concreto premezclado	\$202.19
Mano de obra colocación	\$ 46.35
Vibrado	\$ 4.88
Herramienta	\$ 1.39
SUMA	\$254.81

II. Acero de refuerzo

- Material
- Mano de obra
- Herramienta

Material:

a) Acero de Refuerzo

Costo del material puesto en obra por tonelada = \$ 14,000.00

Cantidad de acero de refuerzo necesario por m² de losa = 7.50 kg

Considerando un desperdicio del 10%, C= 7.50 x 1.10 = 8.25 kg/m²

Cantidad de alambre recocido por tonelada de acero= 30kg (inc. Desperdicio)

Cantidad de alambre recocido necesario por m² de losa = 0.225 kg (inc. desperdicio)

Material por m² de losa:

Material	Unidad	Cantidad	Costo en obra	Importe
Acero de refuerzo	kg	8.25	\$ 14.00	\$ 115.50
Alambre recocido	kg	0.225	\$ 19.80	\$ 4.46
				\$ 119.96

b) Mano de Obra (corte, habilitado y colocación):

Costo de mano de obra por tonelada (ver ejemplo en capítulo de mano de obra) = \$6,439.90

$$\text{Mano de obra por m}^2 \text{ de losa} = \frac{\$7,376.60}{1,000} * 7.50 = \mathbf{\$55.32}$$

c) Herramienta:

Se usará el 3% de la mano de obra.

Resumen acero de refuerzo por m² de losa:

Rubro	Importe
Material	\$ 119.96
Mano de obra	\$ 55.32
Herramienta (3%)	\$ 1.66
SUMA	\$176.94

III. Cimbra

- Materiales
- Mano de obra
- Herramienta

Materiales:

Daremos cantidades aproximadas de madera, clavo y aceite quemado, diesel o desmoldante industrial, necesarios por metro cuadrado de losa, sin incluir trabes.

Madera: Número de pies tablón necesarios:

Descripción	Medidas	P.T.	Usos	P.T. /usos
Duela: Tablero, superficie de contacto	3.28' x 3.28' x 1"	10.76	4	2.69
Polín 3 1/2" x 3 1/2": Largueros en ambos sentidos a cada 80 cm	3" x (4"/12) x 3.28' x 1.25 x 2	8.2	8	1.03
Polín 4" x 4": Pies derechos a cada 1.25m	(4" x 4" x 8 1/4'/12) x 0.80	8.8	8	1.10
Contraventeo de pies derechos	Consideramos 10%			0.11
Calzas, uniones, etc. (estimado)				0.50
SUMA				5.43

Por lo cual:

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Importe
Madera para cimbra	P.T.	5.43	\$ 10.40	\$ 56.47
Clavo	kg	0.20	\$ 26.00	\$ 5.20
Alambre recocido	kg	0.10	\$ 19.80	\$ 1.98
Desmoldante	l	0.50	\$ 30.00	\$ 15.00
			SUMA	\$ 78.65

Mano de obra:

El costo de la mano de obra obtenido en el capítulo correspondiente fue de **\$212.16** por lo cual, integrando estos costos se tiene:

Rubro	Importe
Material	\$ 78.65
Mano de obra	\$ 212.16
Herramienta (3%)	\$ 6.36
SUMA	\$ 297.17

Resumen final:

Costo directo por metro cuadrado de losa utilizando concreto premezclado:

Concepto	Importe	%
Concreto	\$ 254.81	34.96%
Acero de refuerzo	\$ 176.94	24.27%
Cimbra	\$ 297.17	40.77%
COSTO DIRECTO	\$ 728.92	100.00%

Obtención del precio unitario:

Si aplicamos los porcentajes de indirectos presentados en la tabla 5.4, el porcentaje de financiamiento calculado con anterioridad, una utilidad del 8% y cargos adicionales de 0.5%, obtenemos el precio unitario.

Administración central= 5.60%

Administración de obra= 9.39%

% de indirectos= 14.99%

Porcentaje de financiamiento= 0.46%

Losa de concreto reforzado de 10 cm de espesor, incluye concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ R.R., premezclado, acero de refuerzo $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, cimbra y descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución, acabado común.

Unidad: m^2

Costo directo		\$ 728.92
Costo indirecto	14.99%	\$ 109.27
Subtotal 1		\$ 838.19
Costo de financiamiento	0.46%	\$ 3.86
Subtotal 2		\$ 842.04
Utilidad	8.00%	\$ 67.36
Subtotal 3		\$ 909.40
Cargos adicionales	0.5025%	\$ 4.57
PRECIO UNITARIO		\$ 913.97

Es costumbre presentar los precios unitarios en formatos como el que se muestra en la figura 5.3. A estos formatos se les conoce como matrices, análisis o tarjetas de precios unitarios.

EMPRESA, S.A DE C.V Dependencia: Concurso: Obra:
--

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Concepto:	Unidad:
------------------	----------------

MATERIALES	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en obra	Importe	%
Subtotal materiales							

MANO DE OBRA	Clave	Categoría	Unidad	1 / Rendimiento	Salario Real	Importe	%
Subtotal mano de obra							

EQUIPO	Clave	Descripción	Unidad	1 / Rendimiento	Costo horario	Importe	%
Subtotal equipo y herramienta							

COSTOS DIRECTO					\$	-	0.00%
% INDIRECTOS				12.00%	\$	-	
SUBTOTAL					\$	-	
% FINANCIAMIENTO				0.30%	\$	-	
SUBTOTAL					\$	-	
UTILIDAD				6.00%	\$	-	
TOTAL					\$	-	
CARGOS ADICIONALES				3.027%	\$	-	
PRECIO UNITARIO					\$	-	

Figura 5.3 Formato para el cálculo de precio unitario.

Como variante del ejemplo anterior, se obtendrá el costo con la utilización de concreto hecho en obra, de manera que el concepto queda de la siguiente manera:

5.8.2 Concepto: Losa de concreto reforzado de 10 cm de espesor, incluye concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ R.R., hecho en obra, acero de refuerzo $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, cimbra y descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución, acabado común.

Unidad: m^2

Datos Básicos:

Equipo: Revolvedora 1S; costo horario = \$132.91

Rendimiento horario: 1.5 m^3 (varía según el personal que se emplee, la resistencia del concreto y las condiciones de trabajo).

Se empleará una cuadrilla compuesta por 7 peones + 0.35 de cabo con un rendimiento en fabricación de 9 m^3 por jornada de 6 horas efectivas.

la	Categoría	Unidad	Cantidad	Salario Real	Importe	Costo de cuadrilla:
	Peón	Jor	7.00	\$ 583.75	\$ 4,086.25	
	Cabo	Jor	0.35	\$ 889.72	\$ 311.40	
	Total por jornada				\$ 4,397.65	

Se calcula a continuación el costo directo del concreto hecho en obra.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO							
Concepto:						Unidad: m3	
Concreto hecho en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$							
MATERIALES	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en obra	Importe	%
		Cemento	ton	0.3698	\$ 2,873.45	\$1,062.60	43.67%
		Arena	m3	0.5321	\$ 610.00	\$ 324.58	13.34%
		Grava	m3	0.6452	\$ 610.00	\$ 393.57	16.17%
		Agua	m3	0.2424	\$ 250.00	\$ 60.60	2.49%
Subtotal materiales						\$1,841.35	75.67%
MANO DE OBRA	Clave	Categoría	Unidad	1 / Rendimiento	Salario Real	Importe	%
		Cuadrilla (7 peones+0.35 Cabo)	jor	0.11	\$ 4,397.65	\$ 488.63	20.08%
		R= 9 m3/jor					
Subtotal mano de obra						\$ 488.63	20.08%
EQUIPO	Clave	Descripción	Unidad	1 / Rendimiento	Costo horario	Importe	%
		Revolvedora de 1 saco		0.67	\$ 132.91	\$ 88.61	3.64%
		Herramienta	%	0.03		\$ 14.66	0.60%
Subtotal equipo y herramienta						\$ 103.27	4.24%
COSTO DIRECTO						\$2,433.25	100.00%

Con los datos del ejemplo anterior integremos el nuevo resumen del costo por m² de losa con concreto hecho en obra.

Rubro	Importe
Concreto hecho en obra	\$ 243.33
Agua para curado	\$ 1.25
Mano de obra colocación	\$ 46.35
Vibrado	\$ 4.88
Herramienta (3%)	\$ 1.39
SUMA	\$ 297.20

Tomando los mismos datos que en el ejemplo anterior para los conceptos de acero de refuerzo y cimbra, el costo directo resulta:

Concepto	Importe	Porcentaje
Concreto hecho en obra	\$ 297.20	38.53%
Acero de refuerzo	\$ 176.94	22.94%
Cimbra	\$ 297.17	38.53%
SUMA	\$ 771.31	100.00%

Finalmente, obtención del precio unitario de concreto por metro cuadrado de losa, con concreto $f'c=200$ kg/cm² hecho en obra, considerando los mismos porcentajes de indirectos y utilidad, que en el ejemplo anterior.

Costo directo		\$ 771.31
Costo indirecto	14.99%	\$ 115.62
Subtotal 1		\$ 886.93
Costo de financiamiento	0.46%	\$ 4.08
Subtotal 2		\$ 891.01
Utilidad	8.00%	\$ 71.28
Subtotal 3		\$ 962.29
Cargos adicionales	0.5025%	\$ 4.84
PRECIO UNITARIO		\$ 967.13

5.8.3 *Concepto: Formación de terraplén compactado al 95% proctor estándar con material arcilloso. Incluye extracción, carga mecánica, acarreo, tendido y compactación. Volumen medido compacto.*
 Unidad: m³



Datos Básicos:

El terreno es ejidal por lo que hay que dar a los ejidatarios una iguala de \$6.00 por cada m³ medido en banco. El coeficiente de abundamiento (V_s/V_b) es igual a 1.25 y el de reducción es de 0.80 (V_c/V_b).

El material arcilloso es de buena calidad y se encuentra depositado en un banco a 8 km del lugar de su utilización, medianamente consolidado y corresponde a un material tipo II.

El concepto incluye las siguientes actividades:

- a) Extracción, carga y acarreo de material arcilloso
- b) Tendido de material en capas de 20 cm, para formar terraplén, y
- c) Incorporación de agua y compactación

- a) Extracción, carga y acarreo de material

a-1) Extracción y carga a camión con retroexcavadora

Costo horario retroexcavadora = \$ 745.89

Capacidad del cucharón = $1\frac{1}{2} \text{ yd}^3 = 1.15 \text{ m}^3$

Coeficiente de llenado = 1.10

Volumen real del cucharón lleno: $1.15 \text{ m}^3 \times 1.10 = 1.27 \text{ m}^3$

Duración del ciclo de extracción y carga:

Llenado del cucharón	12 seg
Giro con cucharón lleno	6 seg
Descarga	5 seg
Giro con cucharón vacío	5 seg
Acopio de material suelto	8 seg
Espera por acomodo de camión	10 seg
Tiempos muertos	6 seg

SUMA	52 seg

Considerando una eficiencia del 75%:

$$\text{Número de ciclos por hora} = \frac{3,600 * 0.75}{52} = 52 \text{ ciclos}$$

$$\text{Rendimiento de extracción y carga} = 52 \frac{\text{ciclos}}{h} * 1.27 \frac{m^3}{\text{ciclo}} = 66.04 \frac{m^3}{h}$$

$$\text{Rendimiento extracción y carga medido en banco} = \frac{66.04 * 0.80}{1.25} = 42.27 \frac{m^3 \text{ banco}}{h}$$

$$\text{Costo de la extracción y carga (material medido en banco)} = \frac{\$745.89}{42.27} = \$ \mathbf{17.65}$$

a-2) Acarreo del material suelto, en camión volteo, primer kilómetro

Costo horario del camión volteo = \$738.48

Capacidad de la caja de volteo = 6.00 m³

Coefficiente de llenado = 1.00

Volumen real de la caja llena = 6.00 x 1.00 = 6.00 m³ sueltos

Duración del ciclo de ida y regreso durante el primer kilómetro incluye tiempos de carga, descarga y acomodo

Ida: lleno a 20 km/h:	1 km / 20 km / h x 60 min / h	= 3.0 min
Regreso: vacío a 30 km/h:	1 km / 30 km / h x 60 min / h	= 2.0 min
Tiempo de carga:	6 m ³ / 66.04 m ³ /h x 60 min / h	= 5.5 min
Tiempo descarga:		= 1.0 min
Maniobras y acomodados:		= 2.0 min

SUMA		13.5 min

$$\text{Rendimiento en acarreo 1er km} = \frac{6m^3 * 60 \frac{\text{min}}{h} * 0.75}{13.5 \text{min}} = 20.0 \frac{m^3}{h}$$

$$\text{Rendimiento acarreo 1er km medido en banco} = 20.0 * \frac{0.80}{1.25} = 12.80 \frac{m^3 \text{ banco}}{h}$$

$$\text{Costo del acarreo 1er km} = \frac{\$738.48}{12.80} = \$ \mathbf{57.69}$$

a-3) Acarreo del material para kilómetros subsecuentes al primero:

Duración del ciclo de ida y regreso:

Ida: lleno a 30 km/h = 1 km/30 km/h x 60 min/h = 2.00 min

Regreso: vacío a 35 km/h = 1 km/35 km/h x 60 min/h = 1.71 min

SUMA -----
3.71 min

$$\text{Rendimiento del acarreo km subsecuentes} = \frac{6m^3 * 60 \frac{\text{min}}{\text{h}} * 0.75}{3.71 \text{min}} = 72.78 \frac{m^3}{h}$$

$$\text{Rendimiento acarreo km subsecuentes} = \frac{72.78 * 0.80}{1.25} = 46.58 \frac{m^3 \text{ banco}}{h}$$

$$\text{Costo del acarreo km subsecuentes} = \frac{\$738.48}{46.58} = \$ \mathbf{15.85}$$

$$\text{Costo del acarreo para la distancia de 7 km} = \$15.85 * 7 = \$ \mathbf{110.95}$$

Resumen extracción, carga y acarreo del m³ de material arcilloso:

Rubro	Importe
Iguala a ejidatarios	\$ 7.50
Extracción y carga	\$ 17.65
Acarreo 1er km.	\$ 57.69
Acarreo 7 km. Subsecuentes	\$ 110.95
SUMA	\$ 193.79

b) Tendido de material en capas de 20 cm para formar terraplenes

Costo horario motoconformadora = \$ 1,275.57

Tamaño de la cuchilla = 3.65 m

Coefficiente de inclinación a 30° = 0.87

Ancho efectivo 3.65 m x 0.87 = 3.18 m

Número de pasadas para extender una capa de 20 cm de material compactado (25 cm material suelto) = 6 pasadas

Velocidad promedio de la máquina por pasada = 5.2 km/h

Rendimiento del tendido del material (Eficiencia = 75%):

$$Rhm = \frac{5,200 \frac{m}{h} * 3.18m * 0.25m * 0.75}{6 \text{ pasadas}} = 516.75 \frac{m^3}{h}$$

$$\text{Rendimiento tendido de material medido en banco} = \frac{516.64 * 0.80}{1.25} = 330.65$$

$$\text{Costo del tendido del material} = \frac{\$1,275.57}{330.65} = \$ 3.86$$

c) Incorporación de agua y compactación

c-1) Incorporación de agua:

Costo horario de camión pipa de 8000 l = \$ 744.85
 Ancho del múltiple de descarga = 3.00 m
 Agua necesaria para compactación = 100 l/m³
 Espesor de capa suelto = 0.25m

Consumo de agua por metro lineal recorrido por la pipa:

$$100 \frac{l}{m^3} * 0.25 \frac{m^3}{m} * 3.00m \text{ de ancho} = 75 \frac{l}{m}$$

$$\text{Recorrido de la pipa para descargar} = \frac{8,000l}{75 \frac{l}{min}} = 106.67m$$

Tiempo de vaciado si el camión viaja a 1 km / h:

$$\frac{106.67m * 60 \frac{min}{h}}{1000 \frac{m}{h}} = 6.40 \text{ min}$$

Ciclo de llenado y vaciado del camión incluyendo acarreo a 1 km

$$\text{Tiempo de llenado a razón de 240} \frac{l}{min} = \frac{8,000l}{240 \frac{l}{min}} = 33.33min$$

$$\text{Tiempo de vaciado} = 6.40 \text{ min}$$

$$\text{Recorrido ida y vuelta a 1 km y acomodo (ver a-2)} = 7.00 \text{ min}$$

$$\text{SUMA} \quad \text{-----} \quad 46.73 \text{ min}$$

$$\text{Rendimiento pipa} = \frac{8m^3 * 60 * 0.75}{46.73} = 7.70 \frac{m^3}{h}$$

$$\text{Costo del agua por } m^3 = \frac{\$744.85}{7.70} = \$ 96.73$$

$$\text{Costo de incorporación de agua} = \$96.73 * 0.100 \frac{m^3 \text{ agua}}{m^3 \text{ terraplén}} = \$ 9.67$$

$$\text{Costo incorporación de agua referido a } m^3 \text{ en banco} = \frac{\$9.67 * 1.25}{0.80} = \mathbf{\$15.11}$$

Adicional a la incorporación de agua, es necesario que la motoconformadora homogenice la humectación. Se considerará un costo igual al del tendido de material, esto es:

c.2) Costo de homogenizar la humedad del material: **\$ 3.86**

c-3) Compactación del material con rodillo vibratorio

Costo horario del compactador vibratorio autopropulsado = \$ 759.04

Ancho del rodillo compactador	= 2.14 m
Velocidad de operación del rodillo vibratorio	= 2 km/h
Número de pasadas para alcanzar 95% proctor	= 8 pasadas
Factor de traslape	= 0.70
Eficiencia	= 75%

$$\text{Rendimiento del rodillo} = \frac{10 * 2.14 * 2 * 25 * 0.70 * 0.75}{8} = 70.22 \frac{m^3}{h}$$

$$\text{Rendimiento rodillo referido a banco} = \frac{70.22 * 0.80}{1.25} = 44.94 \frac{m^3 \text{ banco}}{h}$$

Costo de compactación por metro cúbico de material suelto:

$$\text{Costo de compactación} = \frac{\$759.04}{44.94} = \mathbf{\$ 16.89}$$

Sumando los tres costos se tiene:

Rubro	Importe
Incorporación de agua	\$ 15.11
Homogenizar humedad	\$ 3.86
Compactación	\$ 16.89
SUMA	\$ 35.86

Resumen: Costo de la formación del terraplén:

Concepto	Importe
a) Extracción carga y acarreo	\$ 193.79
b) Tendido del material	\$ 3.86
c) Incorporación de agua y compactación	\$ 35.86
COSTO DIRECTO m³ compacto	\$ 233.51

Obtención del precio unitario para formación de terraplén compactado al 95% Proctor estándar con material arcilloso. Incluye extracción, carga mecánica, acarreo, tendido y compactado. Volumen medido compacto, considerando los mismos porcentajes de indirectos y utilidad, que en ejemplos anteriores.

Costo directo		\$ 233.51
Costo indirecto	14.99%	\$ 35.00
Subtotal 1		\$ 268.51
Costo de financiamiento	0.46%	\$ 1.24
Subtotal 2		\$ 269.75
Utilidad	8.00%	\$ 21.58
Subtotal 3		\$ 291.33
Cargos adicionales	0.5025%	\$ 1.46
PRECIO UNITARIO		\$ 292.79

Se muestran a continuación los tres ejemplos desarrollados, en el formato que normalmente se utiliza para la presentación de los cálculos de precios unitarios.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO							
	Análisis:	1				Unidad:	m ²
Losas de concreto reforzado de 10 cm de espesor, incluye concreto f'c= 200 kg/cm ² R.R., premezclado, acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm ² , cimbra y descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución, acabado común.							
MATERIALES	Clave	Descripción	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
		Concreto f'c = 200 kg/cm ² premezclado	m ³	\$ 2,009.39	0.10000	\$ 200.94	27.57%
		Agua para curado	lto	\$ 0.25	5.00000	\$ 1.25	0.17%
		Acero de refuerzo	kg	\$ 14.00	8.25000	\$ 115.50	15.85%
		Alambre recocido	kg	\$ 19.80	0.32500	\$ 6.44	0.88%
		Madera para cimbra	pt	\$ 10.40	5.43000	\$ 56.47	7.75%
		Clavo	kg	\$ 26.00	0.20000	\$ 5.20	0.71%
		Desmoldante	lto	\$ 30.00	0.50000	\$ 15.00	2.06%
Subtotal materiales						\$ 400.80	54.98%
MANO DE OBRA	Clave	Categoría	Unidad	Costo	Rendimiento	Importe	%
		Cuadrilla (2 of. Alb.+ 20 peones+1cabo)	jor	\$ 13,905.60	0.003333	\$ 46.35	6.36%
		Cuadrilla fierros	jor	\$ 1,475.32	0.037500	\$ 55.32	7.59%
		Cuadrilla carpinteros en cimbra	jor	\$ 1,463.21	0.125000	\$ 182.90	25.09%
		Cuadrilla carpinteros en descimbra	jor	\$ 1,463.21	0.020000	\$ 29.26	4.01%
Subtotal mano de obra						\$ 313.84	43.06%
EQUIPO	Clave	Descripción	Unidad	Costo	Rendimiento	Importe	%
		Vibrador para concreto	hr	\$ 121.97	0.040000	\$ 4.88	0.67%
		Herramienta	%	\$ 313.84	0.030000	\$ 9.42	1.29%
Subtotal equipo y herramienta						\$ 14.29	1.96%
COSTOS DIRECTO						\$ 728.93	100.00%
% INDIRECTOS						\$ 109.27	
SUBTOTAL						\$ 838.20	
% FINANCIAMIENTO						\$ 3.86	
SUBTOTAL						\$ 842.1	
UTILIDAD						\$ 67.36	
TOTAL						\$ 909.42	
CARGOS ADICIONALES						\$ 4.57	
PRECIO UNITARIO						\$ 913.99	

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO							
	Análisis:	1				Unidad:	m ²
Losas de concreto reforzado de 10 cm de espesor, incluye concreto f'c= 200 kg/cm ² R.R., hecho en obra, acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm ² , cimbra y descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución,							
MATERIALES	Clave	Descripción	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
		Concreto f'c = 200 kg/cm ² hecho en obra	m ³	\$ 2,433.25	0.10000	\$ 243.33	31.55%
		Agua para curado	lto	\$ 0.25	5.00000	\$ 1.25	0.16%
		Acero de refuerzo	kg	\$ 14.00	8.25000	\$ 115.50	14.97%
		Alambre recocido	kg	\$ 19.80	0.32500	\$ 6.44	0.83%
		Madera para cimbra	pt	\$ 10.40	5.43000	\$ 56.47	7.32%
		Clavo	kg	\$ 26.00	0.20000	\$ 5.20	0.67%
		Desmoldante	lto	\$ 30.00	0.50000	\$ 15.00	1.94%
Subtotal materiales						\$ 443.18	57.46%
MANO DE OBRA	Clave	Categoría	Unidad	Costo	Rendimiento	Importe	%
		Cuadrilla (2 of. Alb.+ 20 peones+1cabo)	jor	\$ 13,905.60	0.003333	\$ 46.35	6.01%
		Cuadrilla fierros	jor	\$ 1,475.32	0.037500	\$ 55.32	7.17%
		Cuadrilla carpinteros en cimbra	jor	\$ 1,463.21	0.125000	\$ 182.90	23.71%
		Cuadrilla carpinteros en descimbra	jor	\$ 1,463.21	0.020000	\$ 29.26	3.79%
Subtotal mano de obra						\$ 313.84	40.69%
EQUIPO	Clave	Descripción	Unidad	Costo	Rendimiento	Importe	%
		Vibrador para concreto	hr	\$ 121.97	0.040000	\$ 4.88	0.63%
		Herramienta	%	\$ 313.84	0.030000	\$ 9.42	1.22%
Subtotal equipo y herramienta						\$ 14.29	1.85%
COSTOS DIRECTO						\$ 771.32	100.00%
% INDIRECTOS						\$ 115.62	
SUBTOTAL						\$ 886.94	
% FINANCIAMIENTO						\$ 4.08	
SUBTOTAL						\$ 891.0	
UTILIDAD						\$ 71.28	
TOTAL						\$ 962.30	
CARGOS ADICIONALES						\$ 4.84	
PRECIO UNITARIO						\$ 967.14	

EMPRESA, S.A DE C.V							
Dependencia:							
Concurso:							
Obra:							
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO							
Análisis:		1				Unidad:	m3
Formación de terraplén compactado al 95% proctor estándar con material arcilloso. Incluye extracción, carga mecánica, acarreo, tendido y compactación. Volumen medido compacto.							
MATERIALES	Clave	Descripción	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
		Iguala a ejidatarios	m3	7.5	1.0000	\$ 7.50	3.21%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
Subtotal materiales						\$ 7.50	3.21%
MANO DE OBRA	Clave	Categoría	Unidad	Costo	Rendimiento	Importe	%
						\$ -	0.00%
						\$ -	0.00%
						\$ -	0.00%
						\$ -	0.00%
Subtotal mano de obra						\$ -	0.00%
EQUIPO	Clave	Descripción	Unidad	Costo	Rendimiento	Importe	%
		Retroexcavadora en extracción y carga	h	\$ 745.89	0.02366	\$ 17.65	7.56%
		Camión volteo en acarreo 1er km	h	\$ 738.48	0.07813	\$ 57.69	24.70%
		Camión volteo km subsecuentes	h	\$ 738.48	0.15028	\$ 110.98	47.52%
		Motoconformadora	h	\$ 1,275.57	0.00605	\$ 7.72	3.30%
		Camión pipa 8,000 litros	h	\$ 744.85	0.02029	\$ 15.11	6.47%
		Rodillo liso vibratorio	h	\$ 759.04	0.02225	\$ 16.89	7.23%
	Herramienta	%	\$ -	0.030000			
Subtotal equipo y herramienta						\$ 226.04	96.79%
COSTOS DIRECTO						\$ 233.54	100.00%
% INDIRECTOS							14.99%
SUBTOTAL						\$ 268.55	
% FINANCIAMIENTO							0.46%
SUBTOTAL						\$ 269.8	
UTILIDAD							8.00%
TOTAL						\$ 291.36	
CARGOS ADICIONALES							0.5025%
PRECIO UNITARIO						\$ 292.83	

5.9 Elaboración de presupuestos

El análisis de precios unitarios es una etapa importante en la integración de un presupuesto de obra, pero no la única.

La elaboración de un presupuesto se inicia a partir de que se dispone de un proyecto ejecutivo plasmado en un conjunto de planos con sus respectivas especificaciones de construcción. A partir de esta información, el analista de costos define los diferentes tipos de trabajos que habrán de efectuarse, los organiza y agrupa en “paquetes” denominados partidas formadas por conceptos que tengan cierta afinidad, ya sea atendiendo a la cronología de ejecución, o a los insumos que requieren. Por ejemplo, en una obra de edificación se pueden definir las siguientes partidas:

- I. Preliminares
- II. Cimentación
- III. Estructura
- IV. Albañilería
- V. Instalación Hidráulica
- VI. Instalación Sanitaria
- VII. Instalación Eléctrica
- VIII. Cancelería
- IX. Carpintería
- X. Pastas y Pinturas
- XI. Impermeabilización
- XII. Obra Exterior

Cada una de las partidas anteriores puede detallarse en partes más pequeñas denominadas subpartidas y así sucesivamente hasta llegar al nivel que se denomina "concepto de obra", que corresponde a la descripción precisa de cada uno de los trabajos que habrán de ejecutarse en campo.

Es importante destacar que, tanto la definición de las partidas presupuestales, como de los conceptos de obra, es cien por ciento convencional, ya que por ejemplo puede definirse un concepto de obra que sea: losa de concreto reforzado incluye cimbra y descimbra, cuya unidad de medición es el metro cuadrado (como el ejemplo presentado en el capítulo anterior) o bien, definir tres conceptos para el mismo trabajo con unidades distintas para cada uno de ellos:

- a) Cimbra y descimbra en losas... Unidad: m²
- b) Acero de refuerzo en losas...Unidad: kg
- c) Concreto en losas...Unidad: m³

Las dos posibilidades son perfectamente válidas.

De acuerdo con lo anterior, tomando como ejemplo la partida II. Cimentación, los conceptos de obra pueden ser los que se indican en la tabla 5.1

Tabla 5.1 Relación de conceptos de obra en la partida de cimentación.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
II. CIMENTACIÓN		
II.1	Trazo y nivelación del terreno con aparatos, incluye fijación de puntos de referencia...	m ²
II.2	Excavación en cepa con medios manuales, en material tipo A, incluye afinación del fondo y taludes...	m ³
II.3	Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor...	m ²
II.4	Acero de refuerzo en cimentación, fy= 3,200 kg/cm2, incluye cortes, habilitado, ganchos traslapes...	ton
II.5	Cimbra en cimentación acabado común, incluye descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución...	m ²
II.6	Concreto premezclado en cimentación, f'c= 250 kg/cm2...	m ³
II.7	Relleno de cepas con material inerte, colocado en capas de 30 cm, incluye incorporación de agua, compactación...	m ³
II.8	Acarreo de material producto de excavación al tiro oficial situado a 15 km del sitio de la obra...	m ³ -km

Definidos los conceptos de obra, la siguiente etapa corresponde a la cuantificación de los volúmenes de obra de cada uno de los conceptos que conforman el catálogo, de acuerdo con la unidad de medición seleccionada, tomando como base los planos y especificaciones.

Con las cantidades de cada uno de los conceptos definidos, se integra el "Catálogo de Conceptos" del cual se calcularán los precios unitarios para integrar el presupuesto.

En los concursos de obra pública, la dependencia o entidad convocante, proporciona a los participantes el catálogo de conceptos para que sean estos quienes analicen los precios unitarios correspondientes. La tabla 5.2 muestra el catálogo de conceptos de la partida cimentación.

Tabla 5.2 Catálogo de conceptos relativo a la partida cimentación.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
II. CIMENTACIÓN			
II.1	Trazo y nivelación del terreno con aparatos, incluye fijación de puntos de referencia...	m ²	200.00
II.2	Excavación en cepa con medios manuales, en material tipo A, incluye afinación del fondo y taludes...	m ³	132.00
II.3	Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor...	m ²	110.00
II.4	Acero de refuerzo en cimentación, fy= 3,200 kg/cm2, incluye cortes, habilitado, ganchos traslapes...	ton	5.75
II.5	Cimbra en cimentación acabado común, incluye descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución...	m ²	253.00
II.6	Concreto premezclado en cimentación, f'c= 250 kg/cm2...	m ³	38.50
II.7	Relleno de cepas con material inerte, colocado en capas de 30 cm, incluye incorporación de agua, compactación...	m ³	88.00
II.8	Acarreo de material producto de excavación...	m ³ -km	158.00

Una vez analizados los precios unitarios de cada uno de los conceptos de obra, se está en posibilidad de obtener los importes de cada una de las partidas definidas con anterioridad y, al sumar los importes de todas las partidas, se tendrá el importe total de la obra, esto es, el presupuesto.

La figura 5.1, muestra la representación gráfica de los pasos descritos:

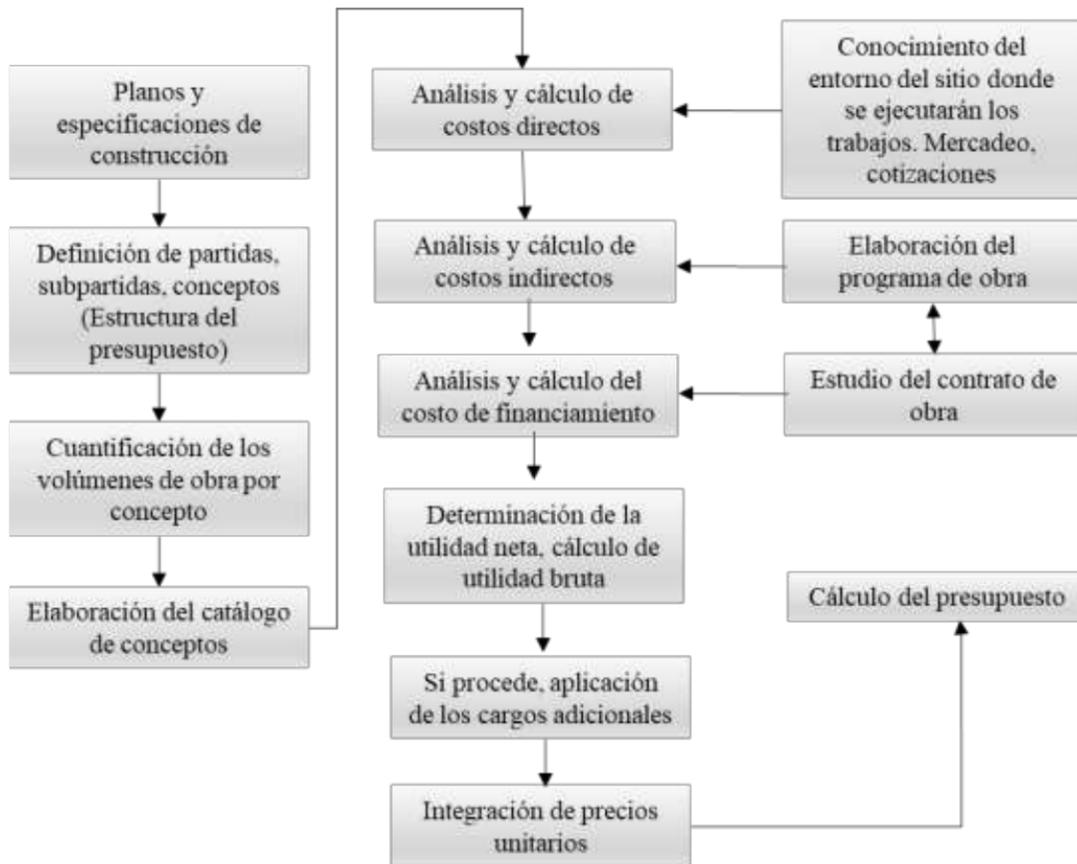


Figura 5.1 Pasos para elaborar un presupuesto.

5.10 Introducción al ajuste de costos

Es importante considerar la fecha en que el presupuesto ha sido calculado, ya que al presentarse incrementos en los costos de los insumos que intervienen en dicho presupuesto, habrá que realizar ajustes de los precios unitarios.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece a este respecto lo siguiente:

Artículo 56.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,

de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta Ley. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

La propia ley establece los procedimientos para llevar a cabo los ajustes de costos:

Artículo 57. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

- I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;*
- II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y*
- III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo.*

Complementando la disposición anterior, el RLOPSRM establece:

Artículo 183.- Tratándose del procedimiento señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley, el ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que integran los costos directos de los precios unitarios se determinará de conformidad con lo siguiente:

- I. Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de trabajos;*
- II. Se determinará el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios del tipo de trabajos analizados, dividiendo el promedio de índices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones.*

El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión:

$$I = (P_m * A_m) + (P_o * A_o) + (P_q * A_q) + \dots + (P_i * A_i)$$

$$\text{Siempre que: } P_m + P_o + P_q + \dots + P_i = 1$$

Donde:

“I” Representa el factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción decimal.

“Pm” Representa el porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

“Am” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones de los materiales que intervienen en el tipo de trabajos de que se trate.

“Po” Representa el porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

“Ao” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de la mano de obra que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

“Pq” Representa el porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

“Aq” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

“Pi” Representa el porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo directo, expresado en fracción decimal.

“Ai” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de algún otro insumo específico que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad podrá adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de trabajos de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y

- III. Las dependencias y entidades deberán oír a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomarán en cuenta los antecedentes de trabajos similares realizados por la dependencia o entidad, o bien, los que presenten los contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en la convocatoria a la licitación pública.*

5.11 Ejemplo

5.11.1 Considérese una obra con la participación de los insumos materiales, mano de obra y maquinaria que se muestran en la figura 5.2

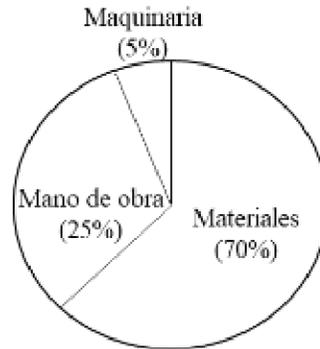


Figura 5.2 Participación de los insumos de una obra, en porcentaje.

Por tanto:

$$P_m = 0.70$$

$$P_o = 0.25$$

$$P_q = 0.05$$

Se cumple que: $P_m + P_o + P_q = 1$

Por otra parte, los índices en la fecha de presentación del presupuesto y la fecha actual se muestran en la tabla 5.3. Estos índices se pueden consultar en la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

Tabla 5.3 Índices de los insumos.

Insumo	Índice en la fecha de presentación del presupuesto	Índice en la fecha del ajuste de costos
Materiales	100	115
Mano de obra	100	100
Maquinaria	100	105

Con estos datos, se calcula el factor de incremento en el periodo en estudio:

$$I = 0.70 \frac{115}{100} + 0.25 \frac{100}{100} + 0.05 \frac{105}{100} = 0.805 + 0.25 + 0.0525 = 1.1075$$

Este factor se aplicará como ajuste a los costos directos de los conceptos de obra por ejecutar en la fecha de ajuste siempre y cuando los trabajos vayan con los avances que señala el programa de obra.

Comentario final

La finalidad del artículo 134 constitucional, es promover un marco de sana competencia entre las empresas constructoras para lograr entre otros aspectos las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad,

La competencia siempre es positiva, ya que obliga a los involucrados ser más eficientes en todos los sentidos.

La teoría de los precios unitarios es la misma para todos los competidores, sin embargo, encierra una buena cantidad de variables y es ahí donde se disparan unos presupuestos de otros.

El propósito de estos apuntes es que los alumnos de la carrera de ingeniería civil tengan los elementos necesarios para calcular presupuestos mediante el análisis cálculo e integración de precios unitarios a efecto de determinar el precio adecuado de las obras para no desvirtuar ni abaratar el mercado de la construcción.

Bibliografía

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley Federal del Trabajo.

Ley del Seguro Social.

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ley Federal de Derechos.
